



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 40/84

MUNICÍPIO: ITIQUIRA - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETA NUMA EX-

DATA DA INSPEÇÃO 20/11/84

TENSÃO DE 1.170m

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Rua Fernando Correa Costa entre Av. 13 de maio e Av. 13 de junho	m	392,0	5.664.400,	100		
02 - Rua José F. Carvalho entre Av. 13 de maio e Av. 13 de junho	m	392,0	5.664.400,	100		
03 - Rua Mato Grosso Entre Av. 13 de maio e Av. 13 de junho	m	392,0	5.664.400,	100		
04 - Rua José Costa Entre Av. 13 de maio e Av. 13 de junho	m	588,0	8.496.600,	100		
TOTAL			25.489.800,	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Obra concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 25.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 17.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 7.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 40/84


Objetivo : IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NUMA EXTENSÃO
DE 1,140m.

Aos 20 dias do mês de Novembro do ano
de 1.984 , dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HÉLIO NUNES
DE OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com
a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços
constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 40/84 , firmado entre
a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ITIQUIRA - MT.
em 01 / 06 / 84. . .

Verificados os serviços em função do teor do Con
vênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentan
do execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas
as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 20 de Novembro de 1.984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT.

De acordo:

DIRETORA DE OPERAÇÕES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 40/84

MUNICÍPIO: ITIQUIRA - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NUMA EXTENSÃO

DATA DA INSPEÇÃO 16/09/84

DE 1.170,00 mts

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85

Nº DE DIAS: 365

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Guias de concreto pré-moldado 12x15x30	m	1.170,00	14.215.428,00	100		
02 - Sarjeta de concreto fundido no local de 0,40x0,80cm	m	1.170,00	10.786.812,00	100		
- Av. 13 de maio	m	680,00				
- Rua 07 de setembro	m	680,00				
- Av. Cuiabá	m	680,00				
- Rua de 13 de junho	m	1.120,00				
- Rua das oliveiras	m	196,00				
- Rua fernando correia	m	392,00				
- Rua J. F. Carvalho	m	392,00				
- Rua Mato Grosso	m	392,00				
- Rua José da Costa	m	588,00				
TOTAL		5.120,00m				
TOTAL			25.002.240,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC

- Obra concluída

- O serviço executado, ou seja 5.120m de meio fio e sarjeta, também faz parte do programa FAS da Caixa Econômica Federal.

PESSOAS CONTACTADAS: Roberto Ferreira da Silva - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 17.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO 7.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

CH. SET-FISC.

18.09.84

3025156



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 40/84

MUNICÍPIO: ITIQUIRA / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NUMA EXTENSÃO

DATA DA INSPEÇÃO 26/06/84

DE 1.170,00 Mts.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/84
TÉRMINO: 01/06/85
Nº DE DIAS: 365

EXECUTOR: ADM. DIRETA

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr#	VALOR	Cr#	VALOR
01). Guias de concreto pré moldado						
12 x 15 x 30.....	M	1.532,00				
02) Sarjeta de concreto fundido no						
local de 0,40 x 0,80 Cm.....	M	1.532,00				
TOTAL				25.002.240,00		100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Videlvique Velasque - Ch. Gabinete

PESSOAS CONTACTADAS: Roberto Ferreira da Silva - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 25.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ 29/05/84	Cr# 10.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 7	
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 25.000.000,00

TEC. RESH
PREFEITURA MUNICIPAL
13/09/84

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONCLUSÃO DO CENTRO ESPORTIVO


Objetivo : CONVÊNIO ADPC Nº 79/80

Aos 16 dias do mês de Setembro do ano de 1984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº, HÉLIO JUNES DE OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 79/80, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de ITIQUIRA em 27 / 06 / 80.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.


Cuiabá, 17 de Setembro de 1984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

De acordo:



DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 79/80

MUNICÍPIO: ITIQUIRA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO ESPORTIVO

DATA DA INSPEÇÃO 16/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 27/06/80

TÉRMINO: 27/10/80

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - VESTIÁRIO						
1.1 - Cobertura	vb	-	66.340,00	100		
1.2 - Madeiramento	vb	-	39.058,00	100		
02 - MURO						
2.1 - Escavação manual	m ³	43,64	5.348,00	100		
2.2 - Fundação	m ³	43,64	144.132,00	100		
2.3 - Estrutura	m ³	27,64	200.854,00	100		
2.4 - Alvenaria de elevação	m ²	1.520,00	556.140,00	100		
TOTAL			1.011.872,50	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Obra concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESR.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUA A. 17.09.84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: ~~ROZARIO~~ RONDÔNIO

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CONVÊNIO ADPC Nº 172/81

EXECUTOR: ARCO-Arquitetura e Construções LTDA

FISCAL: Helio Lm

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22-09-81
TÉRMINO: —
Nº DE DIAS: CC.F.F.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. Serviço pulverização	ub	—	2.638,1000	100	—	—
02. Fundação Concreto	m³	140,0	5.766,6000	100	—	—
03. Estrutura	m²	345,0			24.216,5000	10
04. Cobertura	m²	2180,0			27.679,7000	10
05. Fechamento lateral e chapas	m²	865,0			5.925,2500	10
06. Alvenaria	m²	440,0			5.923,0000	10
07. Revestimento	m²	1580,0			1.338,7000	10
08. Piso	m²	3112,0			8.374,9300	10
09. Esquadrias	m²	244,0			1.710,9000	10
10. Instalações	ub	—			11.980,7600	10
11. Pintura e tratamento	m²	1850,0			6.971,0000	10
12. Outros	m²	36,0			125,6000	11
13. Diversos	ub	—			1.499,7690	15
13. Limpeza	ub	—			84,0000	10
TOTAL			8.449,780,00	10	82.633,5000	9

ANDAMENTO DA OBRA:

Assinatura do Contrato - 23-11-81.
Saldo do contrato - Cr\$ 91.083.289,00.
Quanto, exp. o apresentado pela
juiz de Direito -
Executado 10 % da obra.
Observar, no local, forma e
posições dos pilares.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: / / Cr\$ 8.404.780,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ — X —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 8.404.780,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 16.595.220,00

REC. RESP.

REC. MIN.

REC. TÍTULOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

10

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 23/11/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CONVÊNIO ADPC Nº 172/81

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRazo DE EXECUÇÃO:

INÍCIO: 24/09/81

TÉRMINO: 24/05/82

Nº DE DIAS: 240

FISCAL Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Serviços preliminares			2.638.180,00	100	-	-
0.2 - Fundação			5.766.600,00	100	-	-
0.3 - Estrutura			-	-	24.216.500,00	100
0.4 - Cobertura			-	-	27.679.700,00	100
0.5 - Fechamentos lateral com chapas			-	-	5.925.250,00	100
0.6 - Alvenaria			-	-	592.300,00	100
0.7 - Revestimentos			-	-	8.113.630,00	100
0.8 - Esquadrias			-	-	1.710.900,00	100
0.9 - Instalações			-	-	11.988.760,00	100
10.0 - Pinturas e tratamentos			-	-	697.100,00	100
11.0 - Vidros			-	-	125.600,00	100
12.0 - Diversos			-	-	1.499.769,00	100
13.0 - Limpeza da obra			-	-	84.000,00	100
TOTAL			8.404.780,00	10	82.678.509,00	90

ANDAMENTO DA OBRA:

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - Cr\$ 91.083.289,00

Orçamento conforme o apresentado pela firma construtora.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 4.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 4.449.780,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 8.404.780,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 16.595.220,00

TEC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
<u>SERVICOS PRELIMINARES</u>						
1.1 - Sondagens, taxas e dem. de muro	Vb ²	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da Obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento de Terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da Obra	m	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação provisória de luz e água	Vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	Vb ²	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m	42,0	336.000,00	100	-	-
<u>FUNDAÇÕES</u>						
2.1 - Escavação Manual	m ³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escavamento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento D'água das valas	Vb	-	150.000,00	100	-	-
<u>CONCRETO PARA FUNDAÇÃO</u>						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.760,00	100	-	-
3.2 - Concreto traço 1:2.1/2:3	m	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço - CA 50 e CA - 60	Kg ²	6.827,94	1.586.901,90	100	-	-
3.4 - Forma comu inclusive desforma	m	984,17	2.214.382,50	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr#

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET. FISC.

GUIARÁ,

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/E

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS: -

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
ESTRUTURA						
4.1 - Aço CA - 50 e CA - 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Forma especial inclusive desforma	m ²	3.700,0	10.148.000,00	100	-	-
4.3 - Concreto no traço 1:2 1/2:3	m ³	345,0	6.727.500,00	100	-	-
COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	Vb	-	18.977.700,00	100	-	-
5.2 - Cobrimento c/ chapas Rol - for	m ²	2.180,0	-	-	7.957.000,00	100
5.3 - Chumbadores	Kg	400,0	-	-	130.000,00	100
5.4 - Calhas em chapa 10	m	40,0	-	-	210.000,00	100
5.5 - Tubulações de águas pluviais	m	270,0	-	-	405.000,00	100
ALVENARIA DE ELEVACÃO						
6.1 - De 1/2 vez c/ tijolos 8 furos	m ²	220,0	200.200,00	100	-	-
6.2 - " 1 vez c/ " 8 "	m ²	20,0	33.600,00	100	-	-
6.3 - " 1/2 vez c/ " 18 "	m ²	110,0	217.800,00	100	-	-
6.4 - " 1/2 vez c/ " maciços	m ²	50,0	57.500,00	100	-	-
6.5 - " 1 vez c/ " "	m ²	40,0	83.200,00	100	-	-
REVESTIMENTO						
7.1 - CHAPISCO	m ²	3.900,0	390.800,00	80	97.700,00	20
7.2 - Emboço paulista	m ²	970,0	330.160,00	80	82.540,00	20
7.3 - Capeamento de argamassa	m ²	697,0	-	-	620.330,00	100
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$	
TOTAL ACUMULADO	Cr\$
SALDO DO CONVÊNIO	Cr\$

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC.

CUIABÁ,

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
7.4 - Azulejos	m ²	250,0	-	-	437.500,00	100
7.5 - Piso inclusive calçadas	m ²	3.380,0	-	-	5.849.400,00	100
7.6 - Rodapé e peitoris	m ²	16,5	-	-	305.200,00	100
8 - Esquadrias de ferro e fechamento	m	1.109,0	1.157.230,00	-	6.108.920,00	-
9 - Inst. e aparelhos	Vb	-	5.994.380,00	50	5.994.380,00	50
10 - Pintura e Tratamentos	m ²	185,0	-	-	697.100,00	100
11 - Vidros	m	36,0	-	-	125.600,00	100
12 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
13 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			63.526.711,20	73	24.295.519,00	27

Liberado 73 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 73 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra em andamento mas somente com 6(seis) operários.

1 - Convênio ADPC nº172/81 - R\$ 32.500.000,00

2 - Convênio ADPC nº 42/82 - R\$ 41.000.000,00

TOTAL R\$ 73.500.000,00

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 41.000.000,00
 PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 25.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 5.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 11.000.000,00

TEC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH S T FISC

CUIABÁ, 25/10/82



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS: -

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>						
1.1 - Sondagens, Taxas e dem. de muro	Vb	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento de terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da obra	m	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação provisória de luz e água	Vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	Vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m	42,0	336.000,00	100	-	-
<u>FUNDAÇÕES</u>						
2.1 - Escavação manual	m ³	735,8	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escovamento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água valas	Mb	-	150.000,00	100	-	-
<u>CONCRETO PARA FUNDAÇÃO</u>						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.769,00	100	-	-
3.2 - Concreto traço 1:2 1/2: 3	m ³	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço - CA 50 e CA - 60	Kg	6.827,94	1.586.901,90	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr#

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS:

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.4 - Forma comum inclusive desforma	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
ESTRUTURA						
4.1 - Aço - CA 50 e CA 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Forma especial inclusive desforma	m ³	3.700,0	8.118.400,00	80	2.029.600,00	20
4.3 - Concreto traço 1:21/2: 3	m ³	345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
ABERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	Vb	-	18.977.700,00	100	-	-
5.2 - Cobrimento com chapas ZOL - FOR	m ²	2.180,0	-	-	7.957.000,00	10
5.3 - Chumbadores	Kg	400,0	-	-	130.000,00	10
5.4 - Calhas em chapa 10	m ²	40,0	-	-	210.000,00	10
5.5 - Tubulações de águas pluviais	m	270,0	-	-	405.000,00	10
ALVENARIA DE ELEVACÃO						
6.1 - 1/2 vez tijolos 8 furos	m ²	220,0	100.100,00	50	100.100,00	50
6.2 - 1 vez " " "	m ²	20,0	16.800,00	50	16.800,00	50
6.3 - 1/2 vez " 18 furos	m ²	110,0	108.900,00	50	108.900,00	50
6.4 - 1/2 vez " maciços	m ²	50,0	28.750,00	50	28.750,00	50
6.5 - 1 vez " "	m ²	40,0	41.600,00	50	41.600,00	50
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GIMÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
REVESTIMENTO						
7.1 - Chapisco	m ²	3.900,00	244.250,00	50	244.250,00	50
7.2 - Emboço paulista	m ²	970,00	206.350,00	50	206.350,00	50
7.3 - Capeamento de arg.	m ²	697,00	-	-	620.330,00	100
7.4 - Azulejo	m ²	250,00	-	-	437.500,00	100
7.5 - Piso incl. calçada	m ²	3.380,00	-	-	5.849.400,00	100
7.6 - Rodapé e peitoris	m ²	16,50	-	-	305.200,00	100
8 - Esquadrias e fechamento lateral	m	1.109,00	-	-	7.636.150,00	100
9 - Instalações e Aparelho	Vb	-	-	-	11.988.760,00	100
10 - Pintura e Tratamento	m ²	185,00	-	-	697.100,00	100
11 - Vidros	m	36,00	-	-	125.600,00	100
12 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
13 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			50.415.240,00	53	44.085.909,00	

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc

Obra em andamento

Dotações: 1) Convênio ADPC nº 172/81(Termo Aditivo) - Cr\$ 32.500.000,00

2) Convênio ADPC nº 42/82 - Cr\$ 41.000.000,00

Assinatura do Contrato - 23/11/81

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 41.000.000,00
PARCELAS (%) C.C.F.F.

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# X

VALOR A SER LIBERADO(1ª PARCELA) Cr# 25.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 16.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 23/07/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

jl-01

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: Rondonópolis

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: Continuação da Construção

DATA DA INSPEÇÃO 19-07-82

EXECUTOR: SCS - Arquitetura e Constr. Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31-05-82

TÉRMINO: 24-08-82

Nº DE DIAS: -

FISCAL: Helio Luis de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
Serviços Preliminares						
1. Sondagens, taxas e demais	vd	-	899648,00	100	-	-
2. Barricadas da obra	m²	100,0	580.000,00	100	-	-
3. Movimento de terra	m³	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
4. Locação da obra	m²	2.220,0	303.800,00	100	-	-
5. Lig. prov. de luz e água	vd	-	337.584,00	100	-	-
6. Estaloso e transformador	vd	-	1.107.500,00	100	-	-
7. Placa da obra	m²	412,0	336.000,00	100	-	-
Fundações						
2.1. Escavação manual	m³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2. Escoramento de valas	m²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3. Apilagem fundo valas	m³	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4. Esgotamento d'água valas	vd	-	150.000,00	100	-	-
concreto p fundações						
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EN

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) C C F F

Cr# 410.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr# -

VALOR A SER LIBERADO (1ª PARCELA)

Cr# 25.415.240,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr# 25.415.240,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr# 15.584.760,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 23-07-82

6.727.500

27 50 66-71-89



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

fl. 02.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82.

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 01.

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 31-01

EXECUTOR: ARCO-ARQUIT. E CONST. LTDA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31-05-82.
TÉRMINO: 21-08-82
Nº DE DIAS

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
3.1. Cimento de cimento magro	m³	14,38	215.760,00	100	—	—
3.2. Cimento traço 1:2 1/2:3	m³	136,45	2.456.172,00	100	—	—
3.3. Areia CA 50 - CA 60	Kg	6.287,94	1.586.901,90	100	—	—
3.4. Forma comum ine. desforma	m²	984,17	2.214.382,50	100	—	—
4.1. Areia CA 50 - CA 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	2.079.600,00	20
4.2. Forma especial ine. desforma	m²	370,00	8.343.750,00	100	2.079.600,00	20
4.3. Cimento traço 1:2 1/2:3	m³	345,5	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
5.1. Estrutura em perfis metálicos	vt	—	18.977.700,00	100	—	—
5.2. Colunado e chapas rd. For	mt	2.180,0	7.957.000,00	100	7.957.000,00	100
5.3. Chumbadores	Kg	400,0	130.000,00	100	130.000,00	100
5.4. Chapas em chapa 16	mt	40	210.000,00	100	210.000,00	100
5.5. Tubulações de águas pluviais	m	77,0	405.000,00	100	405.000,00	100
6.1. 1/2 ver tijolo 8 furos	m²	22,50	100.100,00	50	100.100,00	50
6.2. 1 ver " " 8 furos	m²	16,80	16.800,00	50	16.800,00	50
6.3. 1/2 ver tijolo 18 furos	m²	108,90	108.900,00	50	108.900,00	50
20,0 TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

8.118.400,00.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr# 41.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

fl 03

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADRC Nº _____

MUNICÍPIO:

RELATÓRIO Nº _____

PROJETO:

DATA DA INSPEÇÃO _____

EXECUTOR:

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL:

INÍCIO:

TÉRMINO:

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
6.4. 1/2 vez tij maciços	m ²	50,0	28.750,00	50	28.750,00	50
6.5. 1 vez tij maciços	m ²	40,0	41.600,00	50	41.600,00	50
<u>Revestimentos</u>						
7.1. Olinpico	m ²	3900,00	244.250,00	50	244.250,00	50
7.2. manta paulista	m ²	970,0	206.350,00	50	206.350,00	50
7.3. Olinpico Capoteamento de arg.	m ²	697,0	—	—	620.330,00	10
7.4. Aculeto	m ²	250,0	—	—	437.500,00	10
7.5. Piso sel-esleada	m ²	3380,0	—	—	5.849.400,00	10
7.6. Rodape e pitoris	m ²	16,5	—	—	305.200,00	10
8. Esquadrias e fechamentos	m ²	1109,0	—	—	7636.450,00	10
9. Instalações e Aparelhos	vb	—	—	—	1988760,00	10
10. Pinturas e tratamentos	m ²	185,0	—	—	697100,00	10
11. Obras	m ²	360	—	—	125.600,00	10
12. Dispersos	vb	—	—	—	1499.769,00	10
13. Limpeza da Obra	vb	—	—	—	84.000,00	10
94.504.149,00 TOTAL			50.415.240,00	53	440859090,00	6

APLICADO — % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E, CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Serviço executado — Cr# 50.415.240,00
Sistema ADRC-172/81 — Cr# 25.000.000,00
Valor a ser lib — Cr# 25.415.240,00

Assinatura do Contrato - 23-11-81.
Termino da obra —

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CC.F.F. Cr# 41.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr# _____

VALOR A SER LIBERADO(

1º PARCELA) Cr# 25.415.240,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr# 25.415.240,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr# 15.584.760,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 23-07-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

FI - (01)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

Cr\$ VALOR

%

A EXECUTAR

Cr\$ VALOR

%

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - Sondagens, Taxas e dem. de muro

Vb

-

899.648,00

100

1.2 - Barracão da obra

m³

100,0

580.000,00

100

1.3 - Movimento de terra

m²

1.314,0

1.227.020,00

100

1.4 - Locação da obra

m

2.220,0

303.800,00

100

1.5 - Ligação provisória de luz e água

Vb

-

337.584,00

100

1.6 - Estaleiro com transformador

Vb

-

1.107.500,00

100

1.7 - Placa da obra

m

42,0

336.000,00

100

FUNDAÇÕES

2.1 - Escavação manual

m³

735,5

529.560,00

100

2.2 - Escovamento de valas

m²

106,8

186.900,00

100

2.3 - Apiloamento do fundo das valas

m

287,6

60.412,80

100

2.4 - Esgotamento d'água valas

Vb

-

150.000,00

100

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

3.1 - Lastro de concreto magro

m³

14,38

215.760,00

100

3.2 - Concreto traço 1:2 1/2: 3

m³

136,45

2.456.172,00

100

3.3 - Aço - CA 50 e CA - 60

Kg

6.827,94

1.586.901,90

100

TOTAL

ALICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA,

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

PRazo DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS:

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
3.4 - Forma comum inclusive desforma ESTRUCTURA	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
4.1 - Aço - CA 50 e CA 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Forma especial inclusive desforma	m ³	3.700,0	8.118.400,00	80	2.029.600,00	20
4.3 - Concreto traço 1:2:1 1/2: 3	m ³	345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	Vb	-	18.977.700,00	100	-	-
5.2 - Cobrimento com chapas ROL - FOR	m	2.180,0	-	-	7.957.000,00	100
5.3 - Chumbadores	Kg	400,0	-	-	130.000,00	100
5.4 - Calhas em chapa 10	m	40,0	-	-	210.000,00	100
5.5 - Tubulações de águas pluviais	m	270,0	-	-	405.000,00	100
ALVENARIA DE ELEVACÃO						
6.1 - 1/2 vez tijolos 8 furos	m ²	220,0	100.100,00	50	100.100,00	50
6.2 - 1 vez " " "	m ²	20,0	16.800,00	50	16.800,00	50
6.3 - 1/2 vez " 18 furos	m ²	110,0	108.900,00	50	108.900,00	50
6.4 - 1/2 vez " maciços	m ²	50,0	28.750,00	50	28.750,00	50
6.5 - 1 vez " "	m ²	40,0	41.600,00	50	41.600,00	50
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:


VALOR DO CONVÊNIO Cr# _____
PARCELAS (%) _____

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# _____

VALOR A SER LIBERADO (_____, PARCELA) Cr# _____

TOTAL ACUMULADO: Cr# _____

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# _____

TEC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC. 

GUIABA

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS.

RELATÓRIO Nº001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS:

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
REVESTIMENTO						
7.1 - Chapisco	m ²	3.900,0	244.250,00	50	244.250,00	50
7.2 - Emboco paulista	m ²	970,0	206.350,00	50	206.350,00	50
7.2 - Capeamento de Arg.	m ²	697,0	-	-	620.330,00	100
7.4 - Azulejo	m ²	250,0	-	-	437.500,00	100
7.5 - Piso incl. calçada	m ²	3.380,0	-	-	5.849.400,00	100
7.6 - Rodapé e peitoris	m ²	16,5	-	-	305.200,00	100
8 - Esquadrias e fechamento lateral	m	1.109,0	-	-	7.636.150,00	100
9 - Instalações e Aparelha	Vb	-	-	-	11.988.760,00	100
10 - Pintura e Tratamento	m ²	185,0	-	-	697.100,00	100
11 - Vidros	m	36,0	-	-	125.600,00	100
12 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
13 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	
TOTAL			50.415.240,00	53	44.085.909,00	47

ABILICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Serviços executados - Cr\$ 50.415.240,00

Convênio ADPC nº 172/81 - Cr\$ 25.000.000,00

Valor a ser liberado - Cr\$ 25.415.240,00

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Término da obra -

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO C.C.F.F. Cr\$ 41.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2

VALOR A SER LIBERADO (1ª PARCELA) Cr\$ 25.415.240,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 25.415.240,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 15.584.760,00

TEC. RESP.

PRÉFECTURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 23/07/82

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>						
1.1 - Sondagens, Taxas e dem. de muro	Vb	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento de terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da obra	m	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação provisória de luz e água	Vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	Vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m	42,0	336.000,00	100	-	-
<u>FUNDAÇÕES</u>						
2.1 - Escavação manual	m ³	735,9	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escovamento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água valas	Mb	-	150.000,00	100	-	-
<u>CONCRETO PARA FUNDAÇÃO</u>						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.769,00	100	-	-
3.2 - Concreto traço 1:2 1/2: 3	m ³	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço - CA 50 e CA - 60	Hg	6.827,94	1.586.901,90	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr#

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO(____PARCELA)Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABÁ,



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.4 - Forma comum inclusive desforma	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
<u>ESTRUTURA</u>						
4.1 - Aço - CA 50 e CA 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Forma especial inclusive desforma	m ³	3.700,0	8.118.400,00	80	2.029.600,00	20
5 - Concreto traço 1:2:3	m ³	345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
<u>COBERTURA</u>						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	Vb	-	18.977.700,00	100	-	-
5.2 - Cobrimento com chapas ZOL - FOR	m ²	2.180,0	-	-	7.957.000,00	100
5.3 - Chumbadores	Kg	400,0	-	-	130.000,00	100
5.4 - Calhas em chapa 10	m ²	40,0	-	-	210.000,00	100
5.5 - Tubulações de águas pluviais	m	270,0	-	-	405.000,00	100
<u>ALVENARIA DE ELEVACÃO</u>						
6.1 - 1/2 vez tijolos 8 furos	m ²	220,0	100.100,00	50	100.100,00	50
6.2 - 1 vez " " "	m ²	20,0	16.800,00	50	16.800,00	50
6.3 - 1/2 vez " 18 furos	m ²	110,0	108.900,00	50	108.900,00	50
6.4 - 1/2 vez " maciços	m ²	50,0	28.750,00	50	28.750,00	50
6.5 - 1 vez " "	m ²	40,0	41.600,00	50	41.600,00	50
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ,



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GIMÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 19/07/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 31/05/82
TÉRMINO: 21/08/82
Nº DE DIAS: -

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
REVESTIMENTO						
7.1 - Chapisco	m ²	3.900,00	244.250,00	50	244.250,00	50
7.2 - Emboço paulista	m ²	970,00	206.350,00	50	206.350,00	50
7.3 - Capeamento de arg.	m ²	697,00	-	-	620.330,00	100
7.4 - Azulejo	m ²	250,00	-	-	437.500,00	100
7.5 - Piso incl. calçada	m ²	3.380,00	-	-	5.849.400,00	100
7.6 - Rodapé e peitoris	m ²	16,50	-	-	305.200,00	100
8 - Esquadrias e fechamento lateral	m	1.109,00	-	-	7.636.150,00	100
9 - Instalações e Aparelho	Vb	-	-	-	11.988.760,00	100
10 - Pintura e Tratamento	m ²	185,00	-	-	697.100,00	100
11 - Vidros	m	36,00	-	-	125.600,00	100
12 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
13 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			50.415.240,00	53	44.085.909,00	

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc

Obra em andamento

Dotações: 1) Convênio ADPC nº 172/81(Termo Aditivo) - R\$ 32.500.000,00

2) Convênio ADPC nº 42/82 - R\$ 41.000.000,00

Assinatura do Contrato - 23/11/81

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO C.C.F.F. Cr# 41.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# X

VALOR A SER LIBERADO(1ª PARCELA) Cr# 25.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 16.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 23/07/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 212

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - Sondagens, taxas e dem. de muro	Vb	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da Obra	m ²	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento de Terra	m ³	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da Obra	m ²	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação provisória de luz e água	Vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	Vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m	42,0	336.000,00	100	-	-
FUNDAÇÕES						
2.1 - Escavação Manual	m ³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escavamento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esqotamento D'água das valas	Vb	-	150.000,00	100	-	-
CONCRETO PARA FUNDAÇÃO						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.760,00	100	-	-
3.2 - Concreto traço 1:2.1/2:3	m	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço - CA 50 e CA - 60	Kg	6.827,94	1.586.901,90	100	-	-
3.4 - Forma comu inclusive desforma	m	984,17	2.214.382,50	100	-	-
T O T A L						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC.

GUIANA

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº _____

MUNICÍPIO: AGUIDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
ESTRUTURA						
4.1 - Açc CA - 50 e CA - 60	Kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Forma especial inclusive desforma	m ²	3.700,0	10.148.000,00	100	-	-
4.3 - Concreto no traço 1:2 1/2:3	m	345,0	6.727.500,00	100	-	-
COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálico	Vb	-	18.977.700,00	100	-	-
5.2 - Cobrimento c/ chapas Rol - for	m	2.180,0	-	-	7.957.000,00	100
5.3 - Chumbadores	Kg	400,0	-	-	130.000,00	100
5.4 - Calhas em chapa 10	m	40,0	-	-	210.000,00	100
5.5 - Tubulações de águas pluviais	m	270,0	-	-	405.000,00	100
ALVENARIA DE ELEVACÃO						
6.1 - De 1/2 vez c/ tijolos 8 furos	m ²	220,0	200.200,00	100	-	-
6.2 - " 1 vez c/ " 8 "	m	20,0	35.600,00	100	-	-
6.3 - " 1/2 vez c/ " 18 "	m ²	110,0	217.800,00	100	-	-
6.4 - " 1/2 vez c/ " maciços	m ²	50,0	57.500,00	100	-	-
6.5 - " 1 vez c/ " "	m	40,0	83.200,00	100	-	-
REVESTIMENTO						
7.1 - CHAPISCO	m ²	3.900,0	390.800,00	80	97.700,00	20
7.2 - Emboço paulista	m ²	970,0	330.160,00	80	82.540,00	20
7.3 - Capeamento de argamassa	m	697,0	-	-	620.330,00	100
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$	
TOTAL ACUMULADO:	Cr\$
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr\$

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CIDADE

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 42/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002

PROJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 18/10/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 31/05/82

TÉRMINO: 21/08/82

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: -

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
7.4 - Azulejos	m ²	250,0	-	-	437.500,00	100
7.5 - Piso inclusive calçadas	m ²	3.380,0	-	-	5.849.400,00	100
7.6 - Rodapé e peitoris	m ²	16,5	-	-	305.200,00	100
8 - Esquadrias de ferro e fechamento	m	1.109,0	1.157.230,00	-	6.108.920,00	-
9 - Inst. e aparelhos	Vb	-	5.994.380,00	50	5.994.380,00	50
10 - Pintura e Tratamentos	m ²	185,0	-	-	697.100,00	100
11 - Vidros	m	36,0	-	-	125.600,00	100
12 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
13 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			63.526.711,20	73	24.295.519,00	27

LIBERADO 73 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 73 % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra em andamento mas somente com 6(seis) operários.

1 - Convênio ADPC nº172/81 - R\$ 32.500.000,00

2 - Convênio ADPC nº 42/82 - R\$ 41.000.000,00

TOTAL R\$ 73.500.000,00

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 41.000.000,00
 PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 25.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ 5.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 30.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO Cr\$ 11.000.000,00

TEC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SE T FISC.

CUIABÁ, 25/10/82

FAZER TERMO CONCLUSÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 10-03-82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES
DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 197/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01-12-81
TÉRMINO: 01-04-82
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Ponte s/ córrego AREIA - 6,30m		CPB 475	029,00			
1.1 Fundação			47.502,00	100		
1.2 Colocação de Estacas			198.004,00	100		
1.3 Travessia longitudinal			47.502,00	100		
1.4 Asfalto médio rodoviário			237.510,00	100		
1.5 Cxão aterro			47.502,00	100		
02- Ponte s/ córrego PONTINHA - 6,50m		CPB 490	100,00			
1.1 Fundação			49.019,00	100		
1.2 Colocação de Estacas			128.070,00	100		
1.3 Travessia longitudinal			49.019,00	100		
1.4 Asfalto médio rodoviário			245.050,00	100		
1.5 Cxão aterro			49.020,00	100		
03- Ponte s/ córrego SAPE - 6,20m		CPB 467	480,00			
1.1 Fundação			46.748,00	100		
1.2 Colocação de Estacas			116.496,00	100		
1.3 Travessia longitudinal			46.748,00	100		
1.4 Asfalto médio rodoviário			233.740,00	100		
1.5 Cxão aterro			46.748,00	100		
TOTAL			1.501.600,00	100		

ANDAMENTO DA OBRA:

A. QUENTES

S. LORENÇO

JACARA

ROO

- custo equivalente a 90% do valor do orçamento - DERMAT-DEZ/81
- Executado - 100% da obra
- As pontes foram executadas na estrada rural que liga a região de S. Lorenzo às Águas Quentes no município de Rondonópolis.
- Pontes que constam no convênio são ponte s/ córrego S. Lorenzo, Aldemira, Turvo.

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 01-12-81

Cr\$ 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO:

Cr\$ 750.000,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$ — x —

TEC. RESP

PROFESSOR

CHIEF



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 197/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/12/81
TÉRMINO: 01/04/82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - PONTE S/ CÓRREGO AREIA - 6,30 m						
Cr\$ 475.020,00						
1.1 - Fundação	m		47.502,00	100	-	-
1.2 - Colocação de Esteios			118.004,00	100	-	-
1.3 - Travesseiros e Longarinas			47.502,00	100	-	-
1.4 - Assoalho, Rodeiro, Rodapé			237.510,00	100	-	-
1.5 - Caixão de Aterro			47.502,00	100	-	-
02 - PONTE S/ CÓRREGO PONTINHA - 6,50 m						
Cr\$ 490.100,00						
2.1 - Fundação	m		49.010,00	100	-	-
2.2 - Colocação de Esteios			121.020,00	100	-	-
2.3 - Travesseiros e Longarinas			49.010,00	100	-	-
2.4 - Assoalho, Rodeiro, Rodapé			245.050,00	100	-	-
2.5 - Caixão de Aterro			49.010,00	100	-	-
TOTAL						

ANDAMENTO DA OBRA:

- Custo equivalente: à 90 % do valor do Orçamento - DERMAT - Dez/81.
- Executado - 100 % da obra
- As pontes foram executadas na estrada rural que a região de S. Lourenço à Águas Quente no Município de Rondonópolis.
- As pontes que constam no Convênio são: Pontes s/ Córregos S. Lourenço, Aldeinha, Tugore

Segue

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 01/12/81 Cr\$ 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 750.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 197/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/12/81


TÉRMINO: 01/04/82

Nº DE DIAS: 120

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
03 - PONTE S/ CÓRREGO SAPE - 6,20 m						
03 467.480,00						
3.1 - Fundação			46.748,00	100	-	-
3.2 - Colocação de Esteios			116.496,00	100	-	-
3.3 - Travesseiros, Longarinas			46.748,00	100	-	-
3.4 - Assoalho, Rodeiro, Rodapé			233.740,00	100	-	-
3.5 - Caixão de Aterro			46.748,00	100	-	-
TOTAL			1.501.500,00	100	-	-

ANDAMENTO DA OBRA:

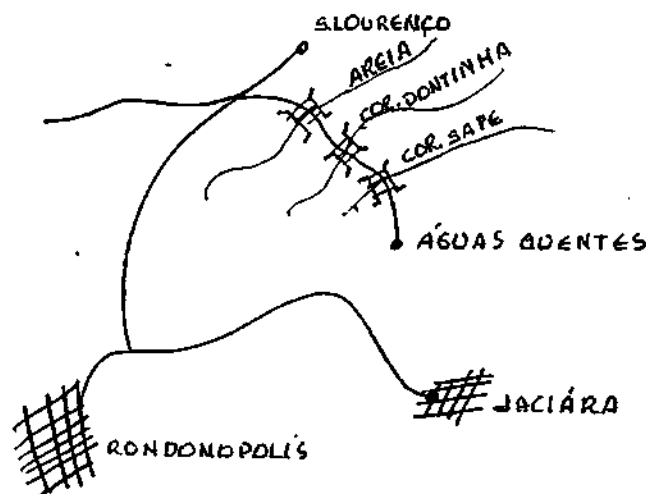

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 01/12/81 Cr# 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# 750.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 105/84

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA SEDE

DATA DA INSPEÇÃO 06/12/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA


PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 20/11/84
TÉRMINO: 20/11/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Rua "SUTERO SILVA" (entre a Rua Rio Branco e Av. Fernando Corrêa).	m ²	6.000,0	90.000.000,	100		
02 - Rua "RIO BRANCO" (entre a Rua Suterio Silva e a Rua "09").	m ²	1.200,0	18.000.000,	100		
03 - Rua "09" (entre a Rua Rio Branco e a Rua Otávio Pitaluga).	m ²	1.200,0	18.000.000,	100		
04 - Rua "OTÁVIO PITALUGA" (entre a Rua Suterio Silva e a Rua "09").	m ²	1.200,0	18.000.000,	100		
TOTAL			144.000.000,	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E

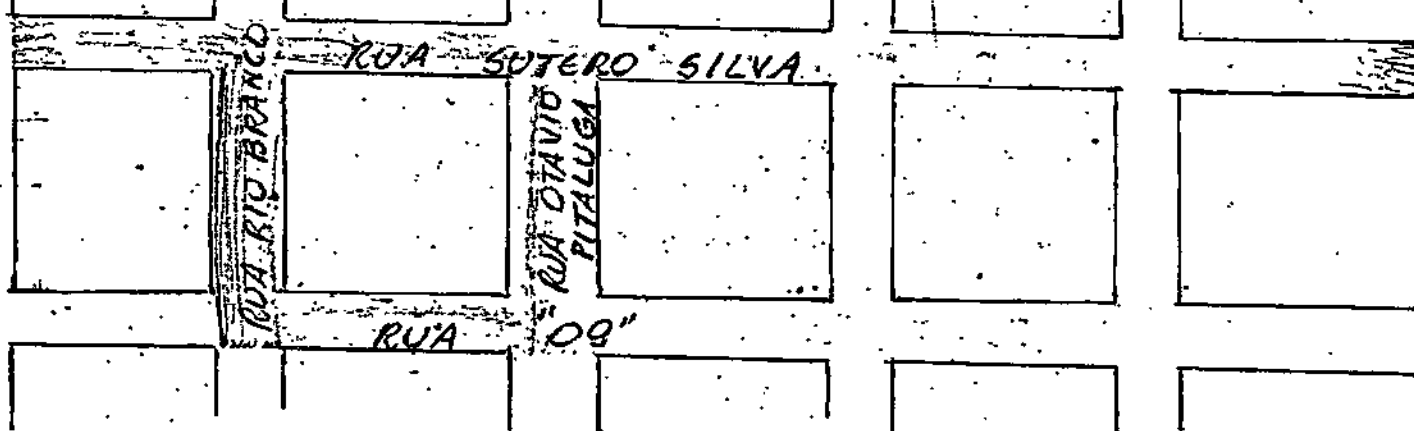

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 20.000.000,
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 12.000.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 6.000.000,

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 20.000.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUAUA 11/12/84

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 105/84

Objetivo : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA SEDE

Aos 06 dias do mês de Dezembro do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 105/84, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de RONDONÓPOLIS - MT.
em 20 / 11 /84 .

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 1.984



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT

De acordo:

DIRETORA DE OPERAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSERÇÃO

MUNICÍPIO: 5^{to} Batalhão de Polícia

PROJETO: Construção da sede da

Prefeitura Municipal

EXECUTOR: ENCO-Eng^o e Comércio Ltda

FISCAL: Helio Nunes de Oliveira Filho

CONVÊNIO ADPC Nº 64/80

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30.06.80

TÉRMINO

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
1 Serviços preliminares			849.400,00		
2 Fundação e estacas e bloco			257.000,00		
TOTAL					

ANDAMENTO DA OBRA:

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 2.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 12/10/80 Cr\$ 2.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ —

TEC. RESP.

ENF. MIN.

CR. DE FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ~~DO CONVÊNIO~~ DE OBRAS

CONVENIO ADPC Nº 67/80

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA

DATA DA INSPEÇÃO 23/04/85

PREFEITURA MUNICIPAL

EXECUTOR: ENCO. Eng. e Comércio Ltda.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/12/80

TÉRMINO: 01/08/81

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 270.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. Serviços preliminares	vb	-	238.434	100	-	
02. Trabalhos em terra	m³	484,13	229811	100	-	
03. Estrutura das fundações	m³	7200	1.732.004	100	-	
04. Impermeabilização	m²	27,20	8.610	100	-	
05. Estrutura de elevação e laje	m³	104,80	291.141	10	2.669.866	90
06. Complementação da obra	-	-	-	-	8390827	
TOTAL			2.500.000	17	12.060.693,8	

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Valor global da obra — Cr\$ 14.560.693.
(orçamento 27/10/80)

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$ 2.500.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$ 2.500.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 2.500.000

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA, 23/04/85

(1)

CONTRATO DE PRECATORIO Nº 001/80 - 1ª FOLHA DE 01

DATA DA
12/01/80

DE IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: S^{to} Antonio de Leverger

CONVÊNIO ADPC Nº 67/80

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 20-06-80

TERMINO:

Nº DE DIAS: 180

ITEM	FASES OU ETAPAS	EXECUTADO		A EXECUTAR	
		VALOR	%	VALOR	%
①	Serviços Preliminares e Instalação do Canteiro de obras.				
1.1	Limpeza ^{regularização} do terreno e locação	302.000,00		—	
1.2	Placas (prefeitura e Construtor)	46.000,00		—	
1.3	Deposito (7,0 x 3,0) de madeira	130.000,00		—	
1.4	Inst. de luz. e água.	56.400,00		—	
1.5	Cimento, areia, casc. ferro e equip.	415.000,00		—	
②	Fundação, estrutura e alvenaria				
2.1	Escavações para estações c/trado.	67.000,00		—	
2.2	Execução de estacas Ø 30cm:	172.000,00		—	
2.3	Escavação de valas para cinta.	18.000,00		—	
	TOTAL	1.096.400,00		—	

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO ANDAMENTO DA OBRA:

~~Placa de placa de placa~~

Conforme o cronograma anexo, da firma construtora, ENCO, Engenharia e Comércio Ltda. parcela referente a serviços preliminares e instalação do canteiro ^{já executada} corresponde a R\$ 2.500,00. Observou-se a ^{alta} placa da CODEMAT.

VALOR DO CONVÊNIO:

2.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 12/01/80

VALOR A SER LIBERADO:

1.096.400,00

TOTAL ACUMULADO:

1.096.400,00

SALDO DO CONVÊNIO:

1.403.600,00

TEC RESP.

PREF MUN.

CH SET 1/80

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
IMPLANTAÇÃO 15.05.81

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POÇO SEMI ARTEZIANO EM JATOBÁ

CONVÊNIO ADPC Nº 19/81

EXECUTOR: FENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19.05.81
TÉRMINO 19.08.81
Nº DE DIAS: 90

FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO		A EXEC.
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01. Perfuração do poço semi-arteziano				100	
02. Reservatório tipo Australiano				100	
Vazão: 90 m ³ /h					
Prof.: 112 m					
Reserv.: Ø 4,40 m - h= 80 cm					
Volume: 40.000 litros					
Saídas d'água c/cano: Ø 3/4					
TOTAL			1.059.499,00	100	

ANDAMENTO DA OBRA:

OBRA CONCLUÍDA

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 19 / 5 / 81 Cr\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$

ELC HESP

DATA INÍCIO

DATA FIM



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 15-06-81

MUNICÍPIO: 5^{TO} ANTONIO DO LEVERGER.

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POÇO SEMI

CONVÊNIO ADPC Nº 49/81

ARTEZIANO EM JATOBA

EXECUTOR: FENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 19-05-81
TÉRMINO: 19-08-81
Nº DE DIAS: 90

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01-Perfuração do poço semi-arteziano		—	—	100	—
02-Reservatório tipo Australiano		—	—	100	—
VAZÃO = 90 m³/hora. PROF = 112 metros. Reserv = ϕ 4,40 m h=80cm Volume = 40000 l. com saídas d'água ϕ cano ϕ 3/4".					
TOTAL			1.059.499,00	100	

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra concluída

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 19/05/81 Cr\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ —

TEC RESP.

PREF MUN.

CH 511 1156

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSCRIÇÃO 15-06-81

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

PROJETO: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL

EXECUTOR: ENCO-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

CONVÊNIO ADPC Nº 79/81

DE 05-06-81

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO 01-12-80

TÉRMINO 01-08-81

Nº DE DIAS: 270

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01. Serviços Preliminares	vb	-	238.434,00	100	-
02. Trabalhos em terra	m³	484,13	92.886,51	44,0	136.924,89
03. Estrutura das fundações	-	-	1.732.004,32	100	-
04. Estrutura de elevação e hje	-	-	2.961.007,87	100	-
05. Impermeabilização	m²	27,20	8.610,70	58,0	13.866,77
06. Alvenaria (muro)	m²	165,50	276.476,02	36,0	478.067,64
07. Revestimento (muro)	m²	893,70	101.658,37	24,0	320.829,04
08. Cobertura de telhas de barro	m²	-	-	-	574.953,75
09. Esquadrias de ferro e madeira	vb	-	-	-	2.321.240,20
10. Piso	m²	-	-	-	1.199.932,54
11. Vidros e pintura	vb	-	-	-	762.052,78
12. Inst. hid. elétrica e ap. sanitários	vb	-	-	-	1.896.586,13
13. Área externa e serv. complement.	vb	-	-	-	1.417.159,91
14. Limpeza geral da obra	vb	-	-	-	28.003,24
TOTAL			5.411.077,79	37,0	9.149.615,89

ANDAMENTO DA OBRA:

VALOR GLOBAL DA OBRA - 14.560.693,68 (conforme cronograma em anexo)
(orçamento - 27-10-80)

Serviços executados até - 5.411.077,79 (conforme as medições em obra)
(15-06-81)

Convênio ADPC. 67/80 - 2.500.000,00.

Saldo dos serviços executados até (15-06-81) menos convênio 67/80 - 2.911.077,00

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr\$ 3.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 05/06/81 Cr\$

VALOR A SER LIBERADO:

Cr\$ 2.911.077,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 2.911.077,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$ 588.923,00

TEC RESP

TEC RESP

TEC RESP

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 05-08-81

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

PROJETO: CONCLUSÃO DO PREDIO DA

PREFEITURA MUNICIPAL

EXECUTOR: ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

CONVENIO ADPC Nº 79/80

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01-12-80
TERMINO: 01-08-81
Nº DE DIAS: 270

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01. Servicos preliminares	vb	—	238.434,00	100	—
02. Trabalhos em terra	m ³	4850	92.886,51	410	136.924,89
03. Estrutura das fundações	—	—	1.732.004,32	100	—
04. Estrutura de elev. m. laje	—	—	2.961.007,87	100	—
05. Impermeabilização	m ²	272	8610,70	380	13.865,77
06. Alvenaria (muro)	m ²	165,5	754.543,66	100	—
07. Revestimento (muro)	m ²	893,7	422.487,41	100	—
OK 08. Cobertura e telhas barro	vb	—	57.188,38	100	517.188,38
OK 09. Esquadrias de fe. e madeira	vb	—	—	—	232.817,19
10. Piso (alta pressão)	—	—	—	—	1.199.932,54
OK 11. Vidros e pintura (p. vidros)	—	—	—	—	762.052,78
OK 12. Inst. hid. elet. e ap. san.	—	—	379.317,22	200	1.517.268,91
50% 13. Area externa e serv. comp.	—	—	—	—	1.417.159,91
80% 14. Limpeza geral da obra.	—	—	—	—	28.003,24
TOTAL			6.646.480,01		7.772.887,2

ANDAMENTO DA OBRA:

VALOR GLOBAL DA OBRA - Cr\$ 4.560.693,68 (conf. homologação após pela J. Terr.)
(orçamento de 27.10.80)

SERVICOS EXECUTADOS ATÉ - Cr\$ 6.646.480,01
05-08-81

CONVENIO ADPC 67/80 - Cr\$ 2.500.000,00

CONVENIO ADPC 79/81 - Cr\$ 3.500.000,00

OBS. ALTERADO O OBJETIVO COM O TERMO ADITIVO PARA:
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 15/06/81 Cr\$ 2.911.078,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 588.923,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 3.600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ —

TEC. NESP.

PRF. MUN.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 04/03/82

MUNICÍPIO: Sto ANTÔNIO DO LEVERGER

PROJETO: Conclusão do Prédio da Prefeitura

CONVÊNIO ADPC Nº 79/81

EXECUTOR: ENCO - Engenharia e Comércio Ltda

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/12/80
TÉRMINO: 01/08/81
Nº DE DIAS: 270

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	238.434,00	100	-	-
02 - Trabalhos em Terra	m ³	484,0	229.811,40	100	-	-
03 - Estruturas das Fundações	m ³	72,0	1.732.004,32	100	-	-
04 - Estrutura de Elevação e Laje	m ²	104,8	2.961.007,81	100	-	-
05 - Impermeabilização	m ²	70,0	22.476,47	100	-	-
06 - Alvenaria (Muro)	m ²	165,5	754.543,66	100	-	-
07 - Revestimento (Muro)	m ²	893,7	422.487,41	100	-	-
08 - Cobertura c/ Telha de Barro	m ²	890,0	574.276,76	100	-	-
09 - Esquadrias de Ferro e Madeira	Vb	-	2.321.817,19	100	-	-
10 - Piso inclusive Contra - Piso	m ²	820,0	1.199.932,54	80	244.986,51	2
11 - Vidro e Pintura	Vb	-	762.052,78	100	-	-
12 - Inst. Hid. Elét. Sanit. e Aparelhos	Vb	-	1.896.586,13	100	-	-
13 - Área externa e Serv. Comp.	Vb	-	708.759,95	150	708.759,95	5
14 - Limpeza Geral da Obra	Vb	-	22.402,59	180	5.600,65	2
TOTAL			13.846.411,00	93	959.347,11	07

ANDAMENTO DA OBRA:

18.946.411,00

Valor Global da Obra - R\$ 14.560.693,68 (conforme Orçamento apresentado pela firma), de 27/10/80

Conv: ADPC Nº 67/80 - R\$ 2.500.000,00

Conv: ADPC Nº 79/81 - R\$ 3.500.000,00

TOTAL - R\$ 6.000.000,00

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 3.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 05/08/81 Cr# 3.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 04/03/82

MUNICÍPIO: Sto ANTONIO DO LEVERGER

PROJETO: Conclusão do Prédio da Prefeitura

CONVÊNIO ADPC Nº 79/81

EXECUTOR: ENCO - Engenharia e Comércio Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/12/80
TÉRMINO: 01/08/81
Nº DE DIAS: 270

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	238.434,00	100	-	-
02 - Trabalhos em Terra	m ³	484,0	229.811,40	100	-	-
03 - Estruturas das Fundações	m ³	72,0	1.732.004,32	100	-	-
04 - Estrutura de Elevação e Laje	m ²	104,8	2.961.007,81	100	-	-
05 - Impermeabilização	m ²	70,0	22.476,47	100	-	-
06 - Alvenaria (Muro)	m ²	165,5	754.543,66	100	-	-
07 - Revestimento (Muro)	m ²	893,7	422.487,41	100	-	-
08 - Cobertura c/ Telha de Barro	m ²	890,0	574.276,76	100	-	-
09 - Esquadrias de Ferro e Madeira	Vb	-	2.321.817,19	100	-	-
10 - Piso inclusive Contra - Piso	m ²	820,0	1.199.932,54	80	244.986,51	2
11 - Vidro e Pintura	Vb	-	762.052,78	100	-	-
12 - Inst. Hid. Elét. Sanit. e Aparelhos	Vb	-	1.896.586,13	100	-	-
13 - Área externa e Serv. Comp.	Vb	-	708.759,95	150	708.759,95	5
14 - Limpeza Geral da Obra	Vb	-	22.402,59	180	5.600,65	2
TOTAL			13.846.411,00	93	959.347,11	07

ANDAMENTO DA OBRA:

Valor Global da Obra - R\$ 14.560.693,68 (conforme Orçamento apresentado pela firma), de 27/10/80

Conv: ADPC Nº 67/80 - R\$ 2.500.000,00

Conv: ADPC Nº 79/81 - R\$ 3.500.000,00

TOTAL - R\$ 6.000.000,00

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 05/08/81 Cr\$ 3.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 04-03-82

MUNICÍPIO: STO ANTONIO DO LEUERGER

PROJETO: CONC. DO PREDIO DA PREFEITURA

CONVÊNIO ADPC Nº 79/81

EXECUTOR: ENCO- ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01-12-80

TÉRMINO: 01-08-81

Nº DE DIAS: 270

FISCAL HELIO NUNES D

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Serviços preliminares	vb	—	238.434,00	100	—	—
02- Trabalhos em terra	m ³	484,0	229.811,40	100	—	—
03- Estrutura das fundações	m ³	72,0	1.732.004,32	100	—	—
04- Estrutura de alvenaria de laje	m ³	104,8	2.961.007,81	100	—	—
05- Impermeabilização	m ²	70,0	22.476,47	100	—	—
06- Alvenaria (muro)	m ²	165,5	754.543,66	100	—	—
07- Revestimento (muro)	m ²	893,7	422.487,41	100	—	—
08- Cobertura c/ telhas de barro	m ²	890,0	574.276,76	100	—	—
09- Esquadrias e Fe e madeira	vb	—	2.321.817,19	100	—	—
10- Piso inc. contra-piso	m ²	820,0	1.199.932,54	80	244.986,51	20
11- Pintura e pintura	vb	—	762.052,78	100	—	—
12- Inst. hid. elet. san. e aparelhos	vb	—	1.896.586,13	100	—	—
13- Arca externa e serv. comp.	vb	—	708.572,95	50	708.572,95	50
14- Limpeza geral da obra	vb	—	22.402,59	80	5.600,65	20
TOTAL			13.846.411,00	93	959.347,11	7

ANDAMENTO DA OBRA:

Valor global da obra - Cr\$ 14.560.693,68 (conf. orga
nizado após p/financ

- Conv. ADPC- 67/80 - Cr\$ 2.500.000,00 de 27-10-80...

" " 79/81 Cr\$ 3.500.000,00

TOTAL Cr\$ 6.000.000,00

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 05-08-81 3.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ — X —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ — X —

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. SET. FISC.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 28/08/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

PROJETO: Contra Partida nas obras de Canalização do

Córrego Patrimônio

EXECUTOR:

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

CONVÊNIO ADPC Nº

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/08/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS: C.C.F.F.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
ORÇAMENTO EM ANEXO :	m	2.097,00	-		52.167.695,90	
TOTAL					52.167.695,90	

RESCINDIDO

ANDAMENTO DA OBRA:

- Canal a céu aberto = 2.097,00 ml
- Canal tubos Ø 1.20 m = 404,00 ml
- A obra ainda não foi iniciada.
- Em fase de Concorrência Pública.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 4.800.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: / / Cr\$

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$

TOTAL ACUMULADO: Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 4.800.000,00

TEC. RESP.

PRÉF. MUN.

CH. GEN. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 25.08.81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

PROJETO: Comp. da Praça dos Carreiros

CONVÊNIO ADPC Nº 144/81

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07.08.81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS: C.C.F.F.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Orçamento anexo	Gb				4.630.380,0	
0.2 - Revestimento c/ Pedras Portuguesas	m ²	3.200,00			3.200.000,0	
0.3 - Iluminação	Vb	-			5.051.046,0	
TOTAL					15.237.596,0	

RESCINDIDO

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra não iniciada.
Em fase de concorrência pública.
Aguardando da Prefeitura Cronograma Físico e Financeiro.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.200.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 07/08/81 Cr\$ -

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ -

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 3.200.000,00

TEC. RESP.

PRES. MUN.

CH. SECRET.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 25/08/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

PROJETO: Pavimentação de Ruas

CONVÊNIO ADPC Nº 145/81

EXECUTOR:

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07/08/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS: C.C.F.F.

FISCAL H Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
Orçamento em anexo		Gb			21.849.992,00	
TOTAL					21.849.992,00	

ANDAMENTO DA OBRA:

- Ruas a serem pavimentadas:
- 1)- Av. Rui Barbosa (entre a rua Pe. Ferreo e José Barriga)
 - 2)- Rua Dutra (entre a rua Domingos Lima e José Barriga)
 - 3)- Av. Cuiabá (entre a rua Domingos Lima e José Barriga)
 - 4)- Av. Amazonas (entre a rua Domingos Lima e José Barriga)
- A obra ainda não foi iniciada.
- Concorrência Pública realizada em 25.08.81

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 21.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: / / Cr\$ -

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ -

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 21.000.000,00

TEC RESP.

PREF MUN

CH. SET. FISC.

ARCO

SANEAMENTO

URBANISMO

ARCO

ARCO

Rondonópolis-MT., 03 de Abril de 1.982

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

N E S T A

Prezados Senhores:

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., nossa 2ª (Segunda) medição dos serviços executados na obra Ginásio Coberto de Rondonópolis.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos
mai

Atenciosamente

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

Engº José Shigueo Hashino



ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 - INSCR. EST. 13.060.041 - 5

AV. FERNANDO CORREA, 1546 - CUIABA - M.T.

OBRA - GINÁSIO

REFERÊNCIA - 2ª M

LOCAL - RONDONÓPOLIS

DATA - 30/03/82

RTO DE RONDONÓPOLIS

AO - ACUMULADA

-MT

FOLHA - 01/03

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUAN
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Sondagens (11) + (15) * 720.000,00 OK	vb	100%
1.2	Barracão da obra { PAREDES = 208.650,00 PISO = 59.100,00 COB. = 81.200,00 348.950,00	m2	100,
1.3	Movimento de terra		
1.3.1	Limpeza da área 157.200,00	m2	5.240,
1.3.2	Corte 286.770,00	m3	790,
1.4	Locação da Obra 401.800,00	m2	2.200,
1.5	Taxas e seguros * 79.000,00 OK	vb	100%
1.6	Ligações provisórias de água e força inclusive		
	consumos CONSUMO INCL. 270.630,00 + 66.956,00	vb	100%
1.7	Placa da obra 238.692,00	m2	42,
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	Escavações 686.957,00	m3	735,
2.2	Escoramentos 71.342,00	m2	106,
2.3	Apiloamento das cavas 41.056,00	m2	287,
2.4	Esgotamento de valas com bomba 150.000,00 OK	vh	100%

VALOR EM CRUZEIRO	
UNITÁRIO	TOTAL
720.000,00	720.000,00
5.800,00	580.000,00
103,00	539.720,00
870,00	687.300,00
179,00	303.800,00
79.000,00	79.000,00
337.584,00	337.584,00
8.000,00	336.000,00
720,00	529.560,00
1.750,00	186.900,00
210,00	60.412,80
150.000,00	150.000,00

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

Eng. Joo Chiquito Hoshino



ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 - INSCR. EST. 13.060.041-5

AV. FERNANDO CORREA, 1546 - CUIABA - M.T.

OBRA - GINASIO

REFERENCIA - 2ª

LOCAL - RORAIMA

DATA - 30/01/82

BERTO DE RONDONÓPOLIS

FEICÇÃO - ACUMULADA

ÓPOLIS - MT

82 FOLHA - 02/03

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUA
2.5	Concreto		
2.5.1	2.5.1 - Lastro para regularização 133.046,00	m3	14,38
2.5.2	2.5.2 - Concreto Traço 1:2 1/2:3 1.768.853,00	m3	136,45
2.6	Armaduras		
2.6.1	2.6.1 - CA-50 990.635,00	kg	5.86
2.6.2	2.6.2 - CA-60 83.670,00	kg	42
2.7	Formas comuns de tábuas 723.240,00	m2	98
3.0	ESTRUTURA		
3.4	Armaduras		
3.4.1	3.4.1 - CA-50 2.642.200,00	kg	16.0
3.4.2	3.4.2 - CA-60 60.916,00	kg	31
4.0	COBERTURA		
4.1	Estrutura em perfis metálicos (tesoura) 4.175.094,00	vb	2.
9.0	INSTALAÇÃO		

VALOR EM CRUZEIRO	
UNITÁRIO	TOTAL
15.000,00	215.760,00
18.000,00	2.456.172,00
250,00	1.465.437,50
285,00	121.464,15
2.250,00	2.214.382,50
250,00	4.006.280,00
285,00	89.435,85
18.977.700,00	4.175.094,00

ARCO - Arquitetura e Construções

Engº José Shigueo Hoshino

APCO - Architectural & Construction
Eng. José Shigueo Hashino

Rondonópolis-MT, 03 de Abril de 1.982

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

N E S T A.

ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RUA ... Nº ... FONE ...

Prezados Senhores:

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., nosso reajustamento referente a 2ª (Segunda) medi-
ção dos serviços executados na obra Ginásio Coberto de Ron-
donópolis.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos
muito

Atenciosamente

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

Shigueo Hoshino
Engº José Shigueo Hoshino

Cuiabá-MT., 30 de março de 1982

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLISREF.: REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOORÇAMENTO GERAL DE OBRAS

Referência: 15.952.153,95

$$a = 15\%$$

$$b = 16\%$$

$$c = 69\%$$

$$R = |(aV_m + bV_s + cV_c)| \times P_o$$

$$V_m = V_s = 1,000$$

$$I_m = \frac{(10 \times 16.328) + (31 \times 16.686) + (31 \times 16.869) + (28 \times 1887) + (31 \times 1877)}{131}$$

$$I_m = 17.925,7709$$

$$V_c = \frac{I_m}{I_o} = \frac{17.925,7709}{16.328} = 1,0978$$

$$R = |(0.15 \times 1,00) + (0.16 \times 1,00) + (0.69 \times 1,0978) - 1| \times P_o$$

$$R = |0.15 + 0.16 + 0.7574 - 1| \times P_o$$

$$R = 0.0674 \times 15.952.153,95$$

$$R = 1.075.175,17$$

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda
.....
Eng. José Shiguco Hoshino

Importa o presente reajuste em

Cr\$ 1.075.175,17 (hum milhão, setenta e cinco mil cento e setenta e cinco cruzeiros e dezesseis centavos).

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/000-08 - INSC. EST. 13.060-041



CONSTRUÇÕES	CIVIS	ARCO
PROJETOS		
SANEAMENTO		
URBANISMO		

Rondonópolis-MT., 03 de Abril de 1.982

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

N E S T A

Prezados Senhores:

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., nossa 1ª (primeira) medição dos serviços executados na obra Ginásio Coberto de Rondonópolis.

Sem mais para o momento subcrevemo-nos
mui

Atenciosamente

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

Ena^o José Shigueo Hoshino



ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03474780/0001-08 - INSCR. EST. 13.060.041-5

AV. FERNANDO CORREA, 1546 - CUIABA - MT.

OBRA - GINÁSIO

REFERÊNCIA - 1ª

LOCAL - RONDONÓPOLIS

DATA - 29/01/1980

PROJETO DE RONDONÓPOLIS

PROJETO

S-MT

FOLHA - 01/01

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QU.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Sondagens	vb	100
1.2	Barracão da obra	m2	10
1.3	Movimento de terra		
1.3.1	Limpeza da Área	m2	5.240
1.3.2	Corte	m3	790
1.4	Locação da Obra	m2	2.200
1.5	Taxas e Seguros	vb	100
1.6	Ligações provisórias de água e força, inclusive consumos	vb	100
1.7	Placas da Obra	m2	4
02	FUNDAÇÕES		
2.1	Escavações	m3	73
2.2	Escoramentos	m2	10
2.3	Apiloamento das cavas	m2	28
2.4	Esgotamento de valas com bomba	vb	100

VALOR EM CRUZEIRO	
UNITÁRIO	TOTAL
720.000,00	720.000,00
5.800,00	580.000,00
103,00	539.720,00
870,00	687.300,00
179,00	393.800,00
79.000,00	79.000,00
337.584,00	337.584,00
8.000,00	336.000,00
720,00	529.560,00
1.750,00	186.900,00
210,00	60.412,80
150.000,00	150.000,00

Importância a presente medição em Cr\$ 4.600.276,80 (quatro milhões seiscentos mil e oitenta e seis cruzeiros e oitenta centavos)

duzentos e se-

ARCO - Arquitetura e Construções

Engº José Shigueo

Rondonópolis-MT, 03 de Abril de 1982

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
N E S T A

Prezados Senhores:

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., nosso reajustamento referente a 1ª (Primeira) medição dos serviços executados na obra Ginásio Coberto de Rondonópolis.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos!

mti

Atenciosamente

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

Engº José Shiguro Hoshino

Cuiabá-MT., 30 de março de 1982

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Ref.: REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO
GINASIO COBERTO DE RONDONÓPOLIS

Referência : 4.600.276,80

$$a = 15\%$$

$$b = 16\%$$

$$c = 69\%$$

$$R = (aV_m + bV_s + cV_c - 1) \times P_o$$

$$V_m = \frac{I_m}{I_o} = \frac{16.710,6714}{16328} = 1,0234$$

$$R = [(0,15 \times 1000) + (0,16 \times 1,000) + (0,69 \times 1,0234) - 1] \times P_o$$

$$R = [(0,15 + 0,16 + 0,7061) - 1] \times P_o$$

$$R = 0,0161 \times 4.600.276,80$$

$$R = 74.064,45$$

Importa o presente reajuste em
Cr\$ 74.064,45 (setenta e quatro mil sessenta e quatro cruzei
ros e quarenta e cinco centavos).

ARCO Arquitetura e Construções Ltda
Jose Shigueo Hoshino
Enqº José Shigueo Hoshino



ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

C.G.C. 03.474.780/0001-03 - INSCR. EST. 13.060.041-5

AV. FERNANDO CORREA, 1548 - CUIABA - MT.

OBRA - GINASIO DE ESPORTE / RONDONÓPOLIS

REFERÊNCIA - RESUMO

LOCAL - AV. CEL. MAL. DUTRA

DATA - NOVEMBRO/81

FOLHA -

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR EM CRUZEIRO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.683.180,00
2	FUNDAÇÃO				5.766.600,00
3	ESTRUTURA				24.216.500,00
4	COBERTURA				27.679.700,00
5	FECHAMENTO LATERAIS EM CHAPAS ROL-FOR PRÉ-PINTADAS INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO				5.925.250,00
6	ALVENARIA				592.300,00
7	REVESTIMENTOS.....				8.113.630,00
8	ESQUADRIAS				1.710.900,00
9	INSTALAÇÕES				11.988.760,00
10	PINTURAS E TRATAMENTOS				697.100,00
11	VIDROS				125.600,00
12	DIVERSOS.....				1.499.769,00
13	LIMPEZA DA OBRA				84.000,00
	TOTAL			R\$	91.083.289,00

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda.

depto. Marcelo Guimarães


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DATA DA INSPEÇÃO: 0

FISCAL	HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
--------	-------------------------------

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 24-09-81
 TÉRMINO:
 Nº DE DIAS: CC.F.F.

ANDAMENTO DA OBRA:

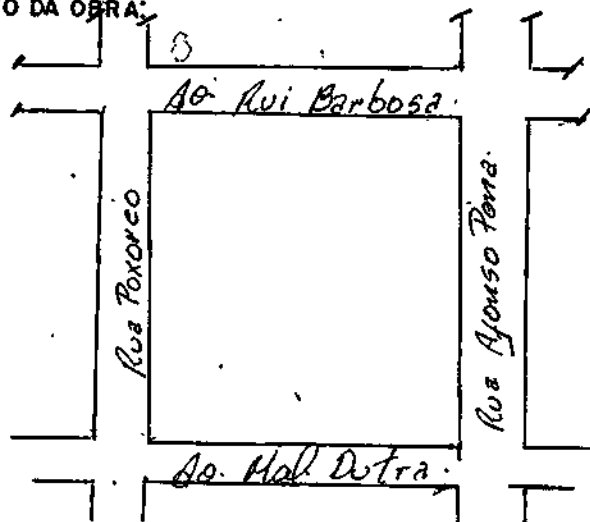

SALDO DO CONVÊNIO: Crd _____

TEC. RESP.

PRC/MUN

CH 517150

Of.

Cuiabá, 01 de Outubro de 1982.

À

ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

N E S T A

Prezados Senhores

Através do presente, vimos propor à V.Sa., as sugestões para as devidas modificações à serem feitas na Obra - Ginásio de Esportes em Rondonópolis.

Itens à serem modificados:

- 1) - Altura insuficiente na passagem para os vestiários, bar , etc, $\pm$ 1,30m (do piso a viga);
- 2) - A não possibilidade de utilização alternada dos vestiários e banheiros (vestiários masculino do lado esquerdo e feminino do lado direito);
- 3) - O comprimento da quadra não possibilita a passagem de pessoas pelos fundos;


Sugestões para as modificações:

- 1) - Diminuir o comprimento da quadra, passando de 36m para 30m a 32m;
- 2) - Deverá ter uma faixa de no mínimo 02 (dois) metros para a segurança de jogadores e torcedores na linha de fundos, conforme o livro de instruções Nestor Lindenberg;
- 3) - Fazer alambrado aos fundos da quadra permitindo a passagem de torcedores;
- 4) - Transladar as " 4 " (quatro) escadas para dar acesso ao bar e vestiários, fazendo um patamar para dar acesso às arquibancadas;
- 5) - Na junta de dilatação fazer sapatas e pilares para dar acesso ao vestiário, diminuindo a altura da viga.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Visto:


EDSON JOSÉ DA SILVA

Ch. da Div. de Proj. em exercício


HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Chefe do Setor de Fiscalização

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS-MT.

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 26.05.82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.09.81

TÉRMINO: 22.05.82

FISCAL: ENGE HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 240

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - Sondagens, taxas e <i>demol. muro</i>	vb	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento da Terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da obra	m ²	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação prov. de luz e água	vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m ²	42,0	336.000,00	100	-	-
02 - FUNDACOES						
2.1 - Escavações manuais	m ³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escoramento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m ²	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água das valas	vb	-	150.000,00	100	-	-
03 - CONCRETO PARA A FUNDAÇÃO						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,88	215.760,00	100	-	-
3.2 - Concreto no traço 1:2 1/2:3	m ³	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço CA-50	kg	5.861,75	1.465.437,50	100	-	-
3.4 - Aço CA-60	kg	426,19	121.464,40	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr#

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 01.06.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS-MT.

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 26.05.82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.08.81

TÉRMINO: 22.05.82

FISCAL: ENGRº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 240

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.5 - Forma comum inc.desforma	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
04 - <u>ESTRUTURA</u> 75% a 85%						
4.1 - Aço CA-50 e CA-60	kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Formas esp.inc.desforma	m ²	3.700,0	5.236.000,00	100	5.236.000,00	50
4.3 - Concreto traço 1:2 1/2:3	m ³	345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
05 - <u>COBERTURA</u> mat. na obra						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	vb	-	18.977.700,00	-	18.977.700,00	100
5.2 - Cobrimento c/telhas Rol-For	m ²	2.180,0	2.957.000,00	62	2.957.000,00	38
5.3 - Chubadores, calhas, tubulação	vb	-	745.000,00	-	745.000,00	100
5.4 - Fechamento lat. c/chapas	m ²	865,0	5.925.250,00	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenarias de elevação 50% (uma todo do org.)	m ²	440,0	592.300,00	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,0	1.388.700,00	-	1.388.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,00	6.774.920,00	-	6.774.920,00	100
09 - Esquadrias	m ²	244,0	1.710.900,00	-	1.710.900,00	100
10 - Inst. Hid. Elétr. esgoto	vb	-	11.988.760,00	-	11.988.760,00	100
TOTAL						

3.781.906,00

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 01.06.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS-MT

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 08/08/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.09.81

TÉRMINO: 22.05.82

Nº DE DIAS: 240

FISCAL: ENGE HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
11. Pinturas e Tratamentos	m ²	185,0	-	-	697.600,00	100
12. Vidros	m ²	36,0	-	-	125.600,00	100
13. Diversos	vb	-	-	-	1.499.769,00	100
Limpeza da obra	vb	-	-	-	84.000,00	100
			31.984.234,40	33	62.942.145,00	67
TOTAL			32.797.742,00	37	58.285.546,60	63

APLICADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 37 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Assinatura do contrato: 23.11.81

Término conf. ordem de serviço: 15.08.82

Valor do contrato: R\$ 91.083.289,00

Orçamento executado conforme apresentado pela firma construtora.

Serviços extra contratuais (Cr# 3.843.090,40) nos itens
serviços Preliminares e Fundação

PESSOAS CONTACTADAS: Leonidas Clementino da Silva - (Diretor da ECOPEP).

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 25.000.000,00
PARCELAS (%) C.C.F.F.

VALOR LIBERADO ATÉ 14.04.82 Cr# 22.213.662,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 2.786.338,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 25.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 01.06.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº GÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
3.5 - Forma comum inc. desforma	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
04 - ESTRUTURA						
4.1 - Aço CA-60	kg	331,84	89.435,85	100	-	-
4.2 - Aço CA-50	kg	16.025,04	4.006.260,00	100	-	-
4.3 - Concreto, forma e desforma	vb	-	1.811.232,00	9	18.313.573,00	91,0
05 - COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálica	vb	-	4.175.094,00	16,0	23.504.606,00	85,0
06 - Demolição de muro alv. 1/2 vez	m ²	277,00	100.647,95	100	-	-
07 - Fechamento lateral c/chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
08 - Alvenaria de elevação	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
09 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
10 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.920,00	100
11 - Esquadrias	m ²	244,00	-	-	1.710.900,00	100
12 - Inst.Hid. Elétrica, Esgoto	vb	-	-	-	11.988.760,00	100
13 - Pintura e tratamentos	m ²	185,00	-	-	697.100,00	100
14 - Vidros	m ²	36,00	-	-	125.600,00	100
15 - Diversos	vb	-	-	-	1.499.769,00	100
16 - Limpeza geral da obra	vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			22.213.662,00	23	72.555.488,00	100

APLICADO 61 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 23 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - R\$ 91.083.289,00

Valor a ser liberado: (executado) - (liberado)
R\$ 22.213.662,00 R\$ 16.000.000,00
= R\$ 6.213.662,00

Leonidas Clementino da Silva (Diretor da ECODER)

PESSOAS CONTATADAS: Manoel Getúlio (Mestre de Obras)

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 25.000.000,00
PARCELAS (%):

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 16.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (48 PARCELA) Cr# 6.213.662,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 22.213.662,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 2.786.338,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 14-04-82

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADRO Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 03

PROJETO: INICIO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - Sondagem, taxas e seguros	Vb	-	799.000,00	100	-	-
1.2 - Locação da obra	m	2.220,0	404.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação provisória de luz e água	Vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	Vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m	42,0	238.692,00	100	-	-
02 - FUNDACOES						
2.1 - Escavações manuais	m ³	735,5	689.957,00	100	-	-
2.2 - Escoramento de valas	m ²	106,8	71.342,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m	287,6	71.056,00	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água das valas	Vb	-	150.000,00	100	-	-
03 - CONCRETO PARA A FUNDAÇÃO						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	133.046,00	100	-	-
3.2 - Concreto no traço 1:2/1/2:3	m ³	136,45	1.768.853,00	100	-	-
3.3 - Aço CA - 50	Kg	5.861,75	990.635,00	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

(segue)

VALOR DO CONVÊNIO	Cr#
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr#
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	Cr#
TOTAL ACUMULADO:	Cr#
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr#

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 03

PROJETO: INICIO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO: 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/09/81

TÉRMINO: 6.C.F.F.

Nº DE DIAS:

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.4 - Aço CA - 60	Kg	426,19	83.070,00	100	-	-
3.5 - Forma comum inclusive desforma	m	934,17	723.240,00	100	-	-
4.2 - Aço CA - 50	Kg	16.025,04	2.692.200,00	11,0	-	-
4.3 - Concreto, forma e desforma	Vb	-	-	-	21.463.384,00	88,0
05 - COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	Vb	-	4.175.094,00	15,0	23.504.606,00	85,0
06 - Demolição de muro alv. 1/2 vez	m ²	277,00	54.887,00	100	-	-
07 - Fecham. laterai c/ chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
08 - Alvenaria de elevação	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
09 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
10 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.930,00	100
11 - Esquadrias	m	244,00	-	-	1.710.900,00	100
12 - Inst. hidraulica, elétrica, esgoto	Vb	-	-	-	11.980.760,00	100
13 - Pintura e tratamentos	m ²	185,00	-	-	697.100,00	100
14 - Vidros	m	36,00	-	-	125.600,00	100
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

(Segue)

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$

TEC. RESP

VALOR LIBERADO ATÉ:

Cr\$

PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$

CH. SET. FISC.

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

GUIABA

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPS Nº 12/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 03

PROJETO: INÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

PRAZO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL:

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

Cr# VALOR

Cr# VALOR

%

%

15 - Diversos

Vb

--

--

1.541.267,00

100

84.000,00

100

TOTAL

15.344.492,00

16

75.738.797,00

84

PLICADO 61 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 16 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - R\$ 91.083.289,00

Leonidas Crementino da Silva (Diretor da ECODER).

PESSOAS CONTACTADAS: Manoel Getúlio (Mestre de Obras).

VALOR DO CONVÊNIO C.C.F.F. Cr# 25.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (3ª PARCELA) Cr# 7.344.492,00

TOTAL ACUMULADO Cr# 15.344.492,00

LDO DO CONVÊNIO Cr# 9.655.508,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 12/04/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CONVÊNIO ADPC Nº 172/81

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F;
Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	2.638.100,00	100	-	-
02 - Fundação(Concreto)	m ³	14,00	5.766.600,00	100	-	-
03 - Estrutura	m ²	345,00	-	-	24.216.500,00	100
04 - Cobertura	m ²	2.180,00	-	-	27.679.700,00	100
05 - Fechamento Lateral c/ chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenaria	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.930,00	100
09 - Esquadrias	m	244,00	-	-	1.710.900,00	100
10 - Instalações	Vb	-	-	-	11.980.760,00	100
11 - Pintura e Tratamentos	m ²	1.850,00	-	-	697.100,00	100
12 - Vidros	m	36,00	-	-	125.600,00	100
13 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
14 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			8.449.780,00	10	82.633.509,00	90

ANDAMENTO DA OBRA:

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - Cr\$ 91.083.289,00

Orçamento, conforme o apresentado pela firma ARCO

Executado 10 % da obra

Observamos no local, formas e ferragens dos pilares

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 8.404.780,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 8.404.780,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 16.595.220,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CONVÊNIO ADPC Nº 172/81

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/09/81

TÉRMINO: C.C.F.F;

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	2.638.100,00	100	-	-
02 - Fundação(Concreto)	m ³	14,00	5.766.600,00	100	-	-
03 - Estrutura	m ²	345,00	-	-	24.216.500,00	100
04 - Cobertura	m ²	2.180,00	-	-	27.679.700,00	100
05 - Fechamento Lateral c/ chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenaria	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.930,00	100
09 - Esquadrias	m	244,00	-	-	1.710.900,00	100
10 - Instalações	Vb	-	-	-	11.980.760,00	100
11 - Pintura e Tratamentos	m ²	1.850,00	-	-	697.100,00	100
12 - Vidros	m ²	36,00	-	-	125.600,00	100
13 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
14 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			8.449.780,00	10	82.633.509,00	90

ANDAMENTO DA OBRA:

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - R\$ 91.083.289,00

Orçamento, conforme o apresentado pela firma ARCO

Executado 10 % da obra

Observamos no local, formas e ferragens dos pilares

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 8.404.780,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 8.404.780,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 16.595.220,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 10/03/82

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS - MT

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

CONVÊNIO ADPC Nº 172/81

EXECUTOR: ARCO - Arquitetura e Construções Ltda

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/09/81

TÉRMINO: C.C.F.F;

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	2.638.100,00	100	-	-
02 - Fundação(Concreto)	m ³	14,00	5.766.600,00	100	19 373.200,00	-
03 - Estrutura	m ²	345,00	4.843.300,00	-	24.216.500,00	100
04 - Cobertura	m ²	2.180,00	-	-	27.679.700,00	100
05 - Fechamento Lateral c/ chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenaria	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.930,00	100
09 - Esquadrias	m	244,00	-	-	1.710.900,00	100
10 - Instalações	Vb	-	-	-	11.980.760,00	100
11 - Pintura e Tratamentos	m ²	1.850,00	-	-	697.100,00	100
12 - Vidros	m ²	36,00	-	-	125.600,00	100
13 - Diversos	Vb	-	-	-	1.499.769,00	100
14 - Limpeza	Vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			8.449.780,00	145	82.633.509,00	85,5

ANDAMENTO DA OBRA:

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - R\$ 91.083.289,00

Orçamento, conforme o apresentado, pela firma ARCO

Executado 10 % da obra

Observamos no local, formas e ferragens dos pilares

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 25.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 8.404.780,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 8.404.780,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 16.595.220,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - Sondagens, taxas e seguros	vb	-	799.000,00	100	-	-
1.2 - Bariação da obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento de Terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da obra	m	2.220,0	393.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação prov. de luz e água	vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m ²	42,0	336.000,00	100	-	-
02 - FUNDAÇÕES						
2.1 - Escavações manuais	m ³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escoramento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m ²	287,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água das valas	vb	-	150.000,00	100	-	-
03 - CONCRETO PARA A FUNDAÇÃO						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.760,00	100	-	-
3.2 - Concreto no traço 1:2 1/2:3	m ³	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço CA-50	kg	5.861,75	1.465.437,50	100	-	-
3.4 - Aço CA-60	kg	426,19	121.464,40	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFORME ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	Cr\$
TOTAL ACUMULADO:	Cr\$
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr\$

TEC. RESP.	
PREFEITURA MUNICIPAL	
CH. SET. FISC.	
CUIABÁ,	14-04-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 001/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 04/04/82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/09/81
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
3.5 - Forma comum inc. desforma	m ²	984,17	2.214.382,50	100	-	-
04 - ESTRUTURA						
4.1 - Aço CA-60	kg	331,84	89.435,85	100	-	-
4.2 - Aço CA-50	kg	16.025,04	4.006.260,00	100	-	-
4.3 - Concreto, forma e desforma	vb	-	1.811.232,00	9	18.313.573,00	91,0
05 - COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálica	vb	-	4.175.094,00	16,0	23.504.606,00	85,0
06 - Demolição de muro alv. 1/2 vez	m ²	277,00	100.647,95	100	-	-
07 - Fechamento lateral c/chapas	m ²	865,00	-	-	5.925.250,00	100
08 - Alvenaria de elevação	m ²	440,00	-	-	592.300,00	100
09 - Revestimento	m ²	1.580,00	-	-	1.338.700,00	100
10 - Piso	m ²	3.112,00	-	-	6.774.920,00	100
11 - Esquadrias	m	244,00	-	-	1.710.900,00	100
12 - Inst.Hid. Elétrica, Esgoto	vb	-	-	-	11.988.760,00	100
13 - Pintura e tratamentos	m ²	185,00	-	-	697.100,00	100
14 - Vidros	m ²	36,00	-	-	125.600,00	100
15 - Diversos	vb	-	-	-	1.499.769,00	100
16 - Limpeza geral da obra	vb	-	-	-	84.000,00	100
TOTAL			22.213.662,00	23	72.555.488,00	100

APLICADO 61 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 23 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Assinatura do Contrato - 23/11/81

Valor do Contrato - R\$ 91.083.289,00

Valor à ser liberado: (executado) - (liberado)
R\$ 22.213.662,00 R\$ 16.000.000,00
= R\$ 6.213.662,00

Leonidas Clementino da Silva (Diretor da ECODER)

PESSOAS CONTACTADAS: Manoel Getúlio (Mestre de Obras)

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 25.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 16.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (4ª PARCELA) Cr# 6.213.662,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 22.213.662,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 2.786.338,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA, 14-04-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADP Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 26.05.82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.09.81
TÉRMINO: 22.05.82
Nº DE DIAS: 240

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 - Sondagens, taxas e demol. muro	vb	-	899.648,00	100	-	-
1.2 - Barracão da obra	m ³	100,0	580.000,00	100	-	-
1.3 - Movimento da Terra	m ²	1.314,0	1.227.020,00	100	-	-
1.4 - Locação da Obra	m ²	2.220,0	303.800,00	100	-	-
1.5 - Ligação prov. de luz e água	vb	-	337.584,00	100	-	-
1.6 - Estaleiro com transformador	vb	-	1.107.500,00	100	-	-
1.7 - Placa da obra	m ²	42,0	336.000,00	100	-	-
02 - FUNDACÕES						
2.1 - Escavações manuais	m ³	735,5	529.560,00	100	-	-
2.2 - Escoramento de valas	m ²	106,8	186.900,00	100	-	-
2.3 - Apiloamento do fundo das valas	m ²	288,6	60.412,80	100	-	-
2.4 - Esgotamento d'água das valas	vb	-	150.000,00	100	-	-
03 - CONCRETO PARA A FUNDAÇÃO						
3.1 - Lastro de concreto magro	m ³	14,38	215.760,00	100	-	-
3.2 - Concreto no traço 1:2 1/2:3	m ³	136,45	2.456.172,00	100	-	-
3.3 - Aço CA-50	kg	5.861,75	1.465.437,50	100	-	-
3.4 - Aço CA-60	kg	426,19	121.464,40	100	-	-
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# _____
PARCELAS (%) _____
VALOR LIBERADO ATÉ Cr# _____
VALOR A SER LIBERADO (____ PARCELA) Cr# _____
TOTAL ACUMULADO: Cr# _____
SALDO DO CONVÊNIO: Cr# _____

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 02-06-82.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 26.05.82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.09.81
TÉRMINO: 22.05.82
Nº DE DIAS: 240

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
04 - ESTRUTURA						
4.1 - Aço CA-50 e CA-60	kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Formas esp. desforma	m ²	3.700,0	5.236.000,00	50	5.236.000,00	50
4.3 - Concreto traço 1:2 1/2:3	m ³	345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
05 - COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	vb	-	-	-	18.977.700,00	100
5.2 - Cobrimento c/telhas Rol-For	m ²	2.180,0	4.175.094,00	62	3.781.906,00	38
5.3 - Chubadores, calhas, tubulação	vb	-	-	-	745.000,00	100
5.4 - Fechamento lat. c/chapas	m ²	865,0	-	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenaria de elevação	m ²	440,0	-	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,0	-	-	1.388.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,0	-	-	6.824.910,00	100
09 - Esquadrias	m ²	244,0	-	-	1.710.900,00	100
10 - Inst. Hid. Elétrica e Esgoto	vb	-	-	-	11.988.760,00	100
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr#

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr#

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO:

Cr#

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 02-06-82.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 172/81

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO Nº 002/82

PROJETO: INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 26.05.82

EXECUTOR: ARCO - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.09.81
TÉRMINO: 22.05.82
Nº DE DIAS: 240

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
04 - ESTRUTURA						
4.1 - Aço CA-50 e CA-60	kg	27.200,0	7.017.000,00	100	-	-
4.2 - Formas esp. desforma	m ²	3.700,0	5.236.000,00	50	5.236.000,00	50
4.3 - Concreto traço 1:2 1/2:3	m ³	3.345,0	3.363.750,00	50	3.363.750,00	50
05 - COBERTURA						
5.1 - Estrutura em perfis metálicos	vb	-	-	-	18.977.700,00	100
5.2 - Cobrimento c/telhas Rol-For	m ²	2.180,0	4.175.094,00	62	3.781.906,00	38
5.3 - Chubadores, calhas, tubulação	vb	-	-	-	745.000,00	100
5.4 - Fechamento lat. c/chapas	m ²	865,0	-	-	5.925.250,00	100
06 - Alvenaria de elevação	m ²	440,0	-	-	592.300,00	100
07 - Revestimento	m ²	1.580,0	-	-	1.388.700,00	100
08 - Piso	m ²	3.112,0	-	-	6.824.910,00	100
09 - Esquadrias	m ²	244,0	-	-	1.710.900,00	100
10 - Inst. Hid. Elétrica e Esgoto	vb	-	-	-	11.988.760,00	100
TOTAL						

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONR ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# _____
PARCELAS (%) _____

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# _____

VALOR A SER LIBERADO(____PARCELA)Cr# _____

TOTAL ACUMULADO: Cr# _____

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# _____

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 02-06-82.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

CONVENIO ADPC Nº 104/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/12/84

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Peças conforme Nota Fiscal nº 9240 Auto Peças Rondonia - Rondonópolis	Gb	-	1.632.000,00	100		
- Peça conforme Nota Fiscal nº 3044 Retífica - Motorforte - Rondonópolis.	Gb	-	900.000,00	100		
TOTAL			2.532.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

OBS.: O Termo de Recebimento será lavrado, na ocasião da execução total do Convênio.

O presente orçamento se refere apenas as Notas Fiscais apresentadas.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 5.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 5.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO Cr\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ 18.09.84



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

CONVENIO ADPC Nº 195/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CALÇAMENTO DA RUA Dr. HUMBERTO MARCÍLIO

DATA DA INSPEÇÃO 22/01/84

3.050 m²

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 10/12/84

TÉRMINO: 10/06/85


Nº DE DIAS: 180

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Regularização e compactação do terreno.	m ²	3.050,0	3.500.000	100	-	
02- Aquisição de lajotas sextavadas com c= 8,0 cm.	um	30.500,0	12.000.000	50	12.000.000	50
03- Assentamento de lajotas sextavadas.	m ²	3.050,0	-	-	5.500.000	100
TOTAL			15.500.000	45	17.500.000	55

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Foi instalado o barracão para fabricação das lajotas.
Adquiridas 500 bolsas de cimento, 50 m³ de areia e 50 m³ de cascalho.

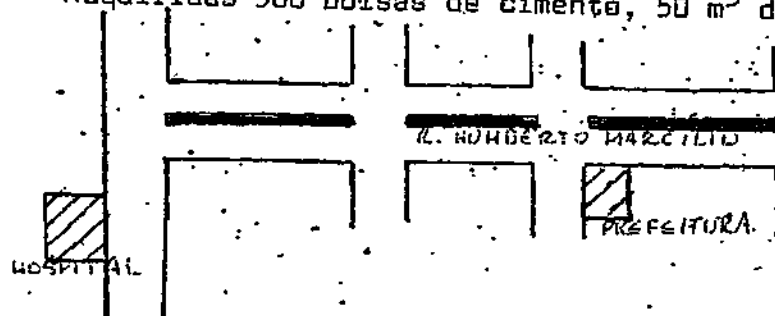

Prot. n.º 206/85
Proc. n.º 199/85
20.04/85
Ass: 22/01/85

PESSOAS CONTACTADAS: LEANDRO ALVES FEITOSA - Pref; Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 30.000.000
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 15.000.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 10.000.000

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 25.000.000

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 5.000.000

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 195/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/85

PROJETO: CALÇAMENTO DA RUA Dr. HUMBERTO MARCÍLIO

CATA DA INSPEÇÃO 02/06/84

3.050 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/12/84
TÉRMINO: 10/06/85
Nº DE DIAS: 180


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
Regularização e compactação do terreno	m ²	3.050,0	3.500.000	100	-	-
Aquisição de lajotas sextavadas com c= 8,0 cm	um	30.500,0	12.000.000	25	36.000.000	75
03- Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	3.050,0			5.500.000	100
					27 41.500.000	43
					11.500.000	27
TOTAL			15.500.000			

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Foi instalado o barracão para fabricação das lajotas. *elas foram*
Aquisição 500 bolsas de cimento, 50 m³ de areia e 50 m³ de cascalho.

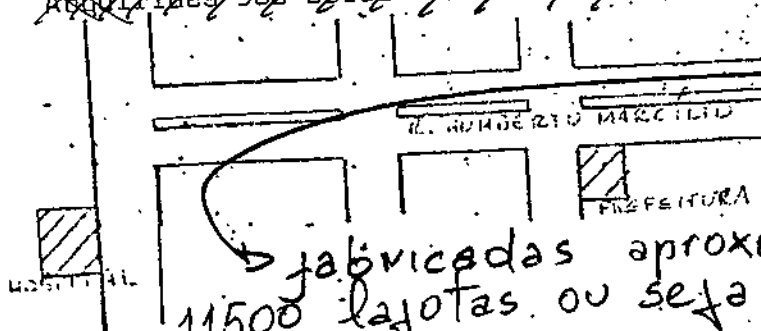


11500 lajotas ou seja 25% da área a ser calçada.

PESSOAS CONTACTADAS: LEANDRO ALVES FEITOSA - Pref; Municipal

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$ 30.000.000
PARCELAS (%)	Cr\$ 25.000.000
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$ 5.000.000
VALOR A SER LIBERADO (PARCELAS)	Cr\$ 25.000.000
TOTAL A SER LIBERADO	Cr\$ 5.000.000

TSC RESP. *[Assinatura]*
PREFEITURA MUNICIPAL
10/06/85



CONVÊNIO ADPC Nº 27/88

RELATÓRIO Nº 01/85

DATA DA INSPEÇÃO

PRAZO DE EXECUCAO
INICIO: 23/06/85

TERMINO: 25/02/86

Nº DE DIAS: 270

LIBERADO	% DO RECURSO DO CONVÊNIO.	EXECUTADO	% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.		QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.	

CR\$

CU1A8A,



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 103/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS PONCE DE

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

ARRUDA E MAL. RONDON

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 06/12/84

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Retirada de meio fio	m	400,0	380.000,00	100		
02 - Assentamento de meio fio	m	400,0	950.600,00	50	950.600,00	50
03 - Retirada de calçamento	m ²	1.674,0	108.642,00	100		
04 - Assentamento de calçamento	m ²	1.674,0	1.086.426,00	50	1.086.426,00	50
05 - Execução de sarjetas	m	400,0	-		1.901.200,00	100
TOTAL			2.525.668,00	40	3.938.226,00	60

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COME ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PRACA
GETÚLIO
VARGAS

RUA MARECHAL RONDON.

RUA HUMBERTO
MARCELLO

RUA D. BOSCO

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.403.000,00

VALOR A SER LIBERADO 600.000,00 - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

15/11/84

CH. SET. FISC.

CH. FISC. 15/09/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 103/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 04/84

PROJETO: COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARGETAS NAS RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 15/11/84

PONCE DE ARRUDA E MARACHAL RONDON

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 06/12/84

Nº DE DIAS: 180

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Retirada de meio-fio	m	400,00	380.000,00	100		
02- Assentamento de meio-fio	m	400,00	1.901.200,00	100		
03- Retirada de calçamento	m ²	1.674,00	108.642,00	100		
04- Assentamento de calçamento	m ²	1.674,00	2.172.852,00	100		
05- Execução de sargetas	m	400,00	1.901.200,00	100		
TOTAL			6.463.894,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra concluída

Praca
Getúlio
Vargas

Rua Mal Rondon

Rua Humberto
Macedo

Rua D. Busco

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 2.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC. RESR

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CH. SET. FISC. 20/11/84

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº 103/84

OBRA: Colocação de Guias e Sarjetas nas ruas
Ponce de Arruda e Mal. Rondon

Aos 15 dias do mês de novembro do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC nº 103/84, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Tesouro em 01 / 06 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 20 de novembro de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal

Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

CONVENIO ADPC Nº 104/84

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

DATA DA INSPEÇÃO 01/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01.06.84
TÉRMINO: 01.12.84
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Peças conf. Nota Fiscal nº 9240 - Aut. Peças Rondonia - Rondonópolis	Gb	-	1.632.000,00	100	-	
- Peça conf. Nota Fiscal nº 3044 - Retífica - Motorforte - Rondonópolis	Gb	-	900.000,00	100	-	
TOTAL			2.532.000,00	51		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

OBS.: O Termo de Recebimento será lavrado, na ocasião da execução total do convênio.

O presente orçamento se refere apenas às notas fiscais apresentadas.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 5.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 2.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 2.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$

TEC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

C-SET FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 102/84

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/84
TÉRMINO: 01/06/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Arborização	un	10,00	123.000,00	100		
02 - Recuperação de meio fio	m	30,00	220.000,00	100		
03 - Colocação de luminárias	un	4,00	620.000,00	100		
04 - Colocação de bancos	un	6,00	-	-	450.000,00	100
05 - Mourões de proteção	un	24,00	-	-	120.000,00	100
06 - Recuperação do gramado	m ²	1.500,00	645.000,00	100		
07 - Cerca de proteção com tela	m	220,00	-	-	909.400,00	100
TOTAL			1.608.000,00	53	1.474.000,00	47

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.200.000,00 21

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 900.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.100.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 900.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUR. 3A 05/09/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 102/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Arborização	un	10,00	123.000,00	100		
02 - Recuperação de meio fio	m	30,00	220.000,00	100		
03 - Colocação de luminárias	un	4,00	620.000,00	100		
04 - Colocação de bancos	un	6,00	400.000,00	88	50.000,00	100
05 - Mourões de proteção	un	24,00			120.000,00	100
06 - Recuperação do gramado	m ²	1.500,00	645.000,00	100		
07 - Cerca de proteção com tela	m	220,00	909.400,00	1	909.400,00	100
TOTAL			2.006.000,00	53	1.074.000,00	4

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr# 2.100.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#	900.000,00 - X
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 3.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr# - , - - X

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

18.09.84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 102/84

RELATÓRIO Nº 02/84

DATA DA INSPEÇÃO 15/11/84

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/84
TÉRMINO: 01/06/85
Nº DE DIAS: 365

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01- Arborização	Un	10,00	123.000,00	100		
02- Recuperação de meio-fio	m	30,00	220.000,00	100		
03- Colocação de luminárias	Un	4,00	620.000,00	100		
04- Colocação de bancos	Un	6,00	450.000,00	100		
05- Mourões de proteção	Un	24,00	120.000,00	100		
06- Recuperação de gramado	m ²	1.500,00	645.000,00	100		
07- Cerca de proteção com tela	m	220,00	909.400,00	100		
TOTAL			3.082.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)
VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 3.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -
TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/11/84

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº102/84

OBRA: Reforma da Praça Getúlio Vargas

Aos 15 dias do mês de novembro do ano de . . ., dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC nº 102/84, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOURO. em 01 / 06 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 20 de novembro de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal

Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 103/84

MUNICÍPIO: TESOURO / MT

RELATÓRIO Nº 001/84

PROJETO: COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS PONCE

DATA DA INSPEÇÃO 25/06/84

DE ARRUDA E MAL. RONDON

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/12/84

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Aquisição e colocação de guias de concreto.	Ml	130,00			1.196,00	100
02) Sarjeta de concreto	Ml	130,00			910,00	100
TOTAL					2.106,00	100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Adquirido cimento - 300 sacas
- Será recuperado o meio fio da Rua Mal. Rondon
- Obra não iniciada.

Rua Getúlio Vargas

Rua Mal. Rondon

Rua Humberto Marcondes

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 29/05/84 Cr# 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 1.200.000,00

TEC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CH. DA OBRA 05/07/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 103/84

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 82/84

PROJETO: COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS PONCE DE

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

ARRUDA e MAL. RONDON

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/12/84

Nº DE DIAS: 180

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Retirada de meio fio	m	400,0	380.000,00	100	-	
02 - Assentamento de meio	m	400,0	950.600,00	50	950.600,00	50
03 - Retirada de calçamento	m ²	1.674,0	108.642,00	100	-	
04 - Assentamento de calçamento	m ²	1.674,0	1.086.426,00	50	1.086.426,00	50
05 - Execução de sarjetas	m	400,0	-		1.901.200,00	100
TOTAL			2.525.668,00	40	3.938.226,00	60

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Rua
Getúlio
Vargas

Rua Mauchal Rondon

Liberado
Mauchal

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 2.000.000,00

PARCELAS (%) Cr\$ 800.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 600.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 600.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPO Nº 101/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA S/ O Córrego

DATA DA INSPEÇÃO 22/01/85

ESTRELA - 42,00 m

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Fundação com concreto	m ³	18,00	4.300.000	100		
02- Colocação de estaios, longarinas, travessieiros e tesouras	m ¹	484,00	8.800.000	100		
03- Assoalho e rodeiro	m ²	264,00	4.400.000	100		
04- Rodapé e guarda-corpo	m ¹	168,00	1.540.000	100		
05- Tratamentos	m ²	680,00	660.000	100		
06- Caixaão de aterro	m ³	170,00	2.200.000	100		
TOTAL			21.980.000	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA. -
 ABAIXO, ARDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra Concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 20.000.000
 PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 20.000.000

VALOR A SER LIBERADO PARCELA Cr\$ -

TOTAL A SER LIBERADO Cr\$ 20.000.000

TSC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET 8100

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 101/84

Objetivo : CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA S/ O Córrego ESTRELA,
42,00 m

Aos 22 dias do mês de Janeiro do ano
de 1.985, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HELIO NUNES
DE OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com
a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços
constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 101/84, firmado entre
a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOIRO - MT
em 01 / 06 / 84.

Verificados os serviços em função do teor do Con
vênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentam
do execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas
as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 30 de Janeiro de 1.985.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO - MT

De acordo:

DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 156/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 07/04/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23-12-82
TÉRMINO: 23-01-83
Nº DE DIAS: 30 dias

FISCAL: ENG. CIVIL - HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
<u>Abertura de Estradas Vicinais</u>	<u>m</u>	<u>5000,0</u>	<u>850.000,00</u>	<u>100</u>	<u>—</u>	
<u>Patrolamento de Estradas vicinais</u>	<u>m</u>	<u>4500,0</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100</u>	<u>—</u>	
TOTAL			<u>1.610.000,00</u>	<u>100</u>	<u>—</u>	

APLICADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO 100% DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.



<u>Entr. Estrada Batoyi à Faz. (1)</u>	<u>3000m</u>	<u>Patrolamento</u>
<u>Fazenda (1) à Faz. Ederio Vilela</u>	<u>3000m</u>	<u>Abert. Patrol.</u>
<u>Fazenda Sr. Ederio ao Cor. Celebra</u>	<u>2000m</u>	<u>Abert. Patrol.</u>
<u>Cor. Celebra à Est. de Batoyi</u>	<u>1500m</u>	<u>Patrolamento</u>

PESSOAS CONTACTADAS: construtor

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 25/01/83 Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/07/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 101/84

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO ESTRELA - 42,00

DATA DA INSPEÇÃO 01/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85

Nº DE DIAS: 265

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Fundação com concreto	m ³	18,00	3.500.000,00	80	880.000,00	20
02 - Colocação de esteios, longarinas, travessieiros e tesoura	m ¹	484,00	880.000,00 7.040.000,00	100	1.760.000,00	100
03 - Assoalho e rodeiro	m ²	264,00	-	-	4.400.000,00	100
04 - Rodapé e guarda corpo	m ¹	168,00	-	-	1.540.000,00	100
05 - Tratamentos	m ²	680,00	-	-	660.000,00	100
06 - Caixão de aterro	m ³	170,00	-	-	2.200.000,00	100
TOTAL			10.220.000,00	53	10.220.000,00	43

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.



PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 20.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 01/09/84 Cr# 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 3.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 17.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 7.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. PISC.

CUIABA

05/09/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIA CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 101/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE S/ O Córrego Estrela - 42,00m

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/06/84
TÉRMINO: 01/06/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Fundação com concreto	m ³	18,00	3.500.000,00	80	880.000,00	20
02 - Colocação de esteios, longarinas, travesseiros e tesoura	m ¹	484,00	8.800.000,00	100		
03 - Assoalho e rodeiro	m ²	264,00	-	-	4.400.000,00	100
04 - Rodapé e guarda corpo	m ¹	168,00	-	-	1.540.000,00	100
05 - Tratamentos	m ²	680,00	-	-	660.000,00	100
06 - Caixaão de aterro	m ³	170,00	-	-	2.200.000,00	100
TOTAL			12.300.000,00	60	7.920.000,00	40

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

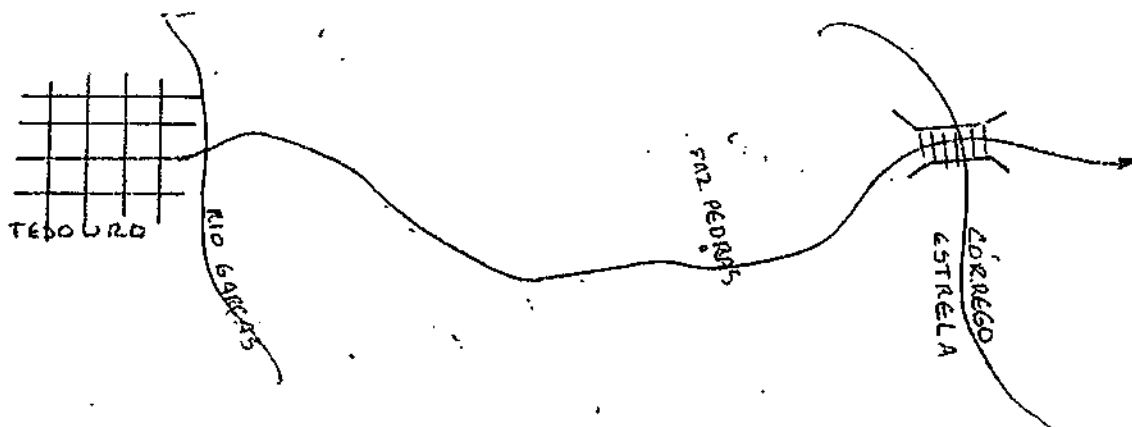

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 20.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 6.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 14.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 6.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DATA 15/09/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 101/84

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA S/ O Córrego Es-

DATA DA INSPEÇÃO 15/10/84

TRELA - 42,00m

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO: 01/06/85


Nº DE DIAS: 365

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Fundação com concreto	m ³	18,00	3.500.000,00	80	880.000,00	20
02 - Colocação de esteios, longarinas, travesseiros e tesoura	m ¹	484,00	8.800.000,00	100		
03 - Asfalto e rodeiro	m ²	264,00	-	-	4.400.000,00	100
04 - Rodapé e guarda corpo	m ¹	168,00	-	-	1.540.000,00	100
05 - Tratamentos	m ²	680,00	-	-	660.000,00	100
06 - Caixaão de aterro	m ³	170,00	-	-	2.200.000,00	100
TOTAL			12.300.000,00	68	7.920.000,00	40

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

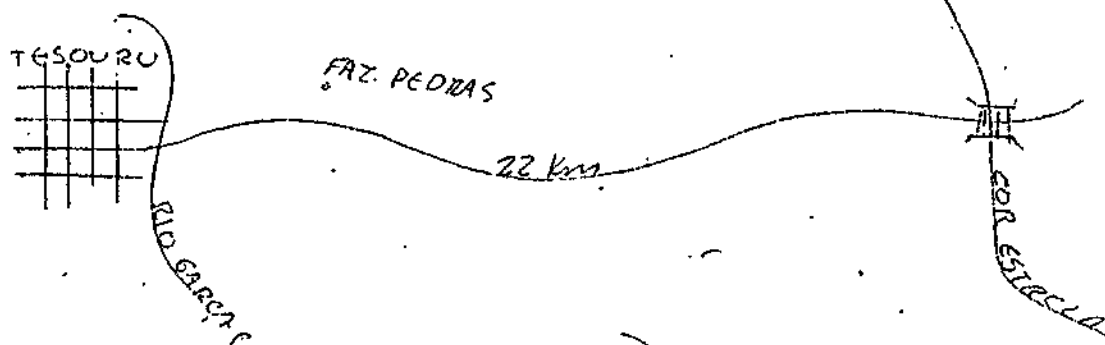

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 20.000.000,00
PARCELAS (%) /

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 8.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 6.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 18.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

24/10/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 101/84

MUNICÍPIO: TESDURO - MT

RELATÓRIO Nº 04/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA S/ O CÓRREGO

DATA DA INSPEÇÃO 14/11/84

ESTRELA - 42,00 m

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84


TÉRMINO: 01/06/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO MUNUES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01- Fundação com concreto	m ³	18,00	3.500.000,00	80	880.000,00	20
02- Colocação de esteios, longarinas, travesseiros, e tesoura	m ¹	484,00	8.800.000,00	100		
03- Asfalto e rodeiro	m ²	264,00	3.520.000,00	120	3.520.000,00	80
04- Rodapé e guarda-corpo	m ¹	168,00	-	-	1.540.000,00	100
05- Tratamentos	m ²	680,00	-	-	660.000,00	100
06- Caixa de aterro	m ³	170,00	2.280.000,00	100	2.280.000,00	100
TOTAL			13.180.000,00	62	8.800.000,00	38

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

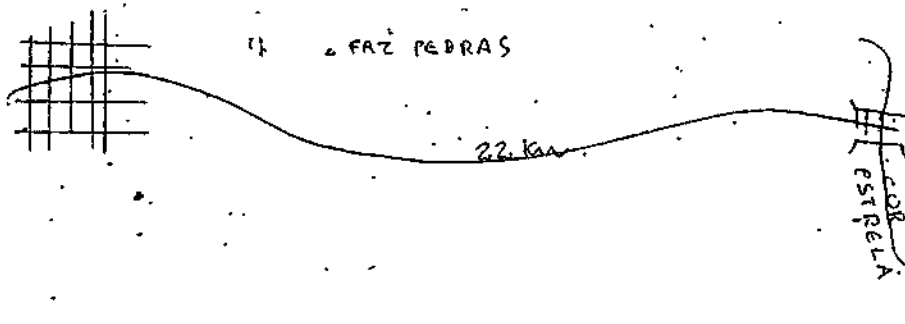

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 20.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr# 18.500.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr#	
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 18.500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr# 1.500.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/11/84

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

* Fazer termo de conclusão

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº -101/84

MUNICÍPIO

TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/85

PROJETO CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO

DATA DA INSPEÇÃO 02/06/85

ESTRELA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 01/06/84

TÉRMINO 01/06/85

FISCAL Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS 365

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

CR\$ VALOR

%

A EXECUTAR

CR\$ VALOR

%

CÓRREGO ESTRELA-42,0m

Fundação em concreto	m3	18,00	7.200,000	100		
2.0- Esteios, longarimas, traveseiros e tesouras.....	m3	44,00	23.400,000	100		
3.0- Assoalho e rodeiros.....	m2	276,00	22.080,000	100		
4.0- Guarda-rodas e guarda-corpo..	m	192,00	8400,000	100	8.400,000	100
5.0- Caixaão de aterro.....	m3	170,00	2.200,000	100	2.200,000	100
			63.280,000	100		
TOTAL			52.680,000	83	20.600,000	100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC

~~Obra em execução normal. Na oportunidade estavam desmontados os assoalhos.~~

Observamos que foi anexado mas um lance de 6,00 m de comprimento. Assim, a ponte foi construída com 48,0 m de extensão. Obra concluída.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 20.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 20.000.000

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$

VALOR ACUMULADO

CR\$ 20.000.000

VALOR DO CONVÊNIO

CR\$

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. P.S.

02/06/85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 156/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/83

PROJETO:

ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 23.12.82

TÉRMINO: 23.01.83

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 30


DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Abertura de Estradas Vicinais	m1	5.000,0	850.000,00	100		
02 - Patrolamento de Estradas Vicinais	m1	4.500,0	640.000,00	85,0	120.000,00	15,0
TOTAL			1.490.000,00	94,0	120.000,00	0,6

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.

ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO

% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA, QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

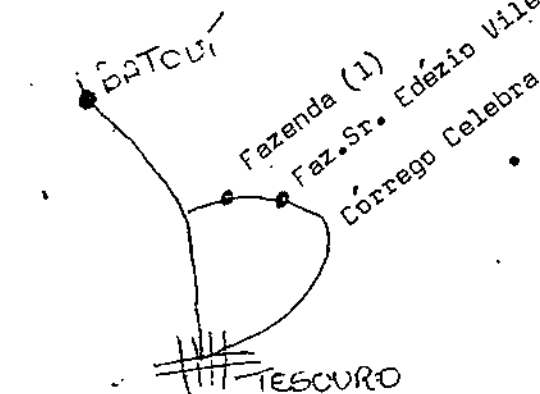

PESSOAS CONTACTADAS: Construtor

Entrac. Estrada Batoví à Fazenda (1)	3.000m	Patrolamento
Fazenda (1) à Fazenda Sr. Edézio Vilela	3.000m	Abert. e Patrol.
Fazenda Sr. Edézio ao Córrego Celebra	2.000m	Abert. e Patrol.
Córrego celera à Estrada de Batoví	1.500m	Patrolamento

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ 23.12.82 Cr# 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO(3ª PARCELA) Cr# 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27.01.83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 156/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/83

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 23.12.82

TÉRMINO: 23.01.83

Nº DE DIAS: 30


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%
01 - Abertura de Estradas Vicinais	m1	5.000,0	850.000,00	100		
02 - Patrolamento de Estradas Vicinais	m1	4.500,0	640.000,00	85,0	120.000,00	15,0
TOTAL			1.490.000,00	94,0	120.000,00	0,6

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

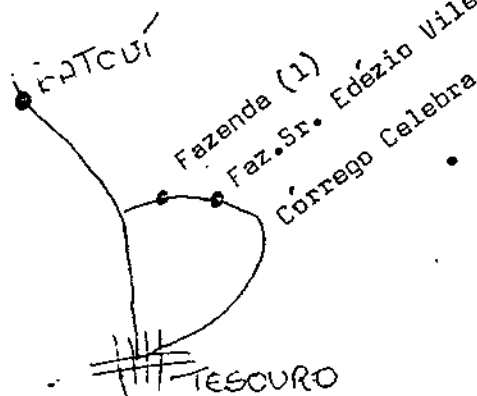

Entroc. Estrada Batoví à Fazenda (1)	3.000m	Patrolamento
Fazenda (1) à Fazenda Sr. Edézio Vilela	3.000m	Abert. e Patrol.
Fazenda Sr. Edézio ao Córrego Celebra	2.000m	Abert. e Patrol.
Córrego celera à Estrada de Batoví	1.500m	Patrolamento

PESSOAS CONTACTADAS: Construtor

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23.12.82 Cr/ 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO (3ª PARCELA) Cr/ 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27.01.83

TERMO DE RECEBIMENTO


Referência: CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA S/O Córrego LAJEADINHO
Objetivo : CONVÊNIO ADPC Nº 77/83

Aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 1984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO, e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 77/83, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOURO em 21 / 11 / 83 .

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.


Cuiabá, 18 de Setembro de 1984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO

De acordo:



DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 77/83

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA S/ O Córrego LA-

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

JEADINHO - 20,00m

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 21/11/83

TÉRMINO: 21/03/84

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>PONTE S/ O Córrego LAJEADINHO - 14,00m</u>						
01 - Fundação com concreto	m ³	15,40	840.000,00	100		
02 - Colocação de esteios	m ³	4,20	800.000,00	100		
03 - Assent. trav. e longarina	m ²	6,30	1.110.000,00	100		
04 - Assent. assoalho, rodeiro e rodapé	m ³	77,0	1.200.000,00	100		
05 - Caixaõ de aterro	m	30,0	380.000,00	100		
<u>PONTE S/ O Córrego GROTA SECA - 08,00m</u>						
01 - Fundação com concreto	m ³	5,20	283.000,00	100		
02 - Colocação de esteios	m ³	1,60	304.000,00	100		
03 - Assent. trav. e longarina	m ²	3,20	560.000,00	100		
04 - Assent. assoalho e rodapé	m ³	36,0	510.000,00	100		
05 - Caixaõ de aterro	m	-	executado			
TOTAL			5.987.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Observamos, que a obra do convênio está concluída com 14,0m de comprimento, e a complementação do restante (06m) foi executada sobre o Córrego Grota Seca com (08m) de comprimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Lenandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 5.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 5.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 18.09.84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 7/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 25/04/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/07/82


TÉRMINO: 02/12/82

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	301.000,00	100	-	-
02 - Aquisição de Lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	1.093.750,00 712.250,00	70	712.250,00 159.750,00	30
03 - Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	422.750,00 159.750,00	70	159.750,00 -	30
04 - Aquisição e assentamento de meio fio	ml	1.080,0	911.520,00	100	-	-
05 - Acabamento Geral	m ²	1.720,0	-	-	301.000,00	100
TOTAL			2.729.000,00	70	1.173.000,00	30

Liberado 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 70 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

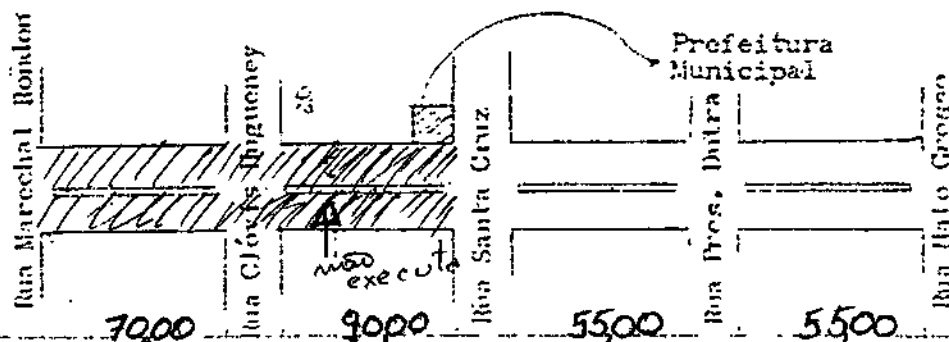

concluído
a concluir

PESSOAS CONTACTADAS:

LEANDRO ALVES FEITOSA.

Prefeito Municipal

Obs: Estão sendo executados os serviços de meio fio, não especificados no Convênio.

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$ 3.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 09/10/82

Cr\$ 2.600.000,00

VALOR A SER LIBERADO

PARCELA Cr\$ 400.000,00

TOTAL A SER LIBERADO

Cr\$ 3.000.000,00

TEC. RESO

PREFEITURA MUNICIPAL

Assinada 27/01/83

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS


DATA DA INSPEÇÃO 27/04/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02/07/82
TÉRMINO: 02/12/82
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	E-EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	301.000,00	100		
02 - Aquisição de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	1.093.750,00	70	712.250,00	30
03 - Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	422.750,00	70	159.750,00	30
04 - Aquisição e assentamento de meio-fio	m ¹	1.080,0	911.520,00	100		
05 - Acabamento geral	m ²	1.720,0	301.000,00	100		
TOTAL			3.030.020,00	78	872.000,00	22

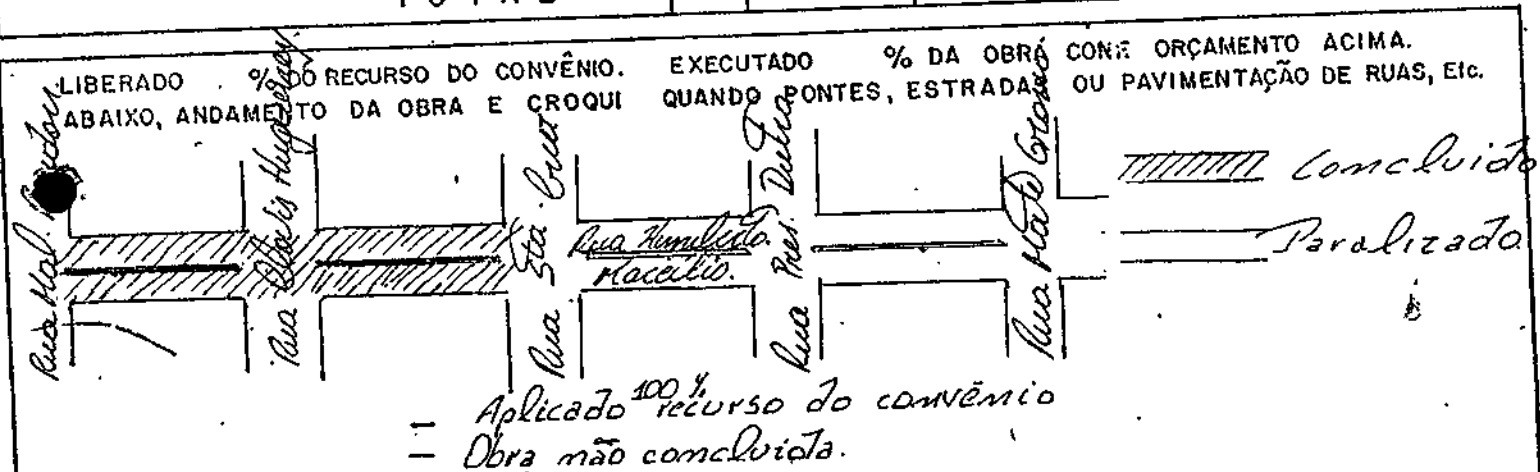

PESSOAS CONTACTADAS: Leandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 28/01/84 Cr# 3.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/05/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 77/83

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO PONTE MADEIRA S/ O Córrego LAJEADINHO

DATA DA INSPEÇÃO 27/04/84

20,00m

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 21/11/83

TÉRMINO: 21/03/84

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

Cr# VALOR

%

A EXECUTAR

Cr# VALOR

%

PONTE SÔBRE O Córrego LAJEADINHO - 14,0m

01 - Fundação com concreto

m³

15,40

940.000,00

100

-

-

02 - Colocação de esteios

m³

4,20

800.000,00

100

-

-

03 - Assent. trav. e longarina

m³

6,30

1.110.000,00

100

-

-

04 - Assent. assoalho, rodeiro e rodapé

m³

77,0

1.200.000,00

100

-

-

05 - Caixaõ de aterro

m³

30,0

380.000,00

100

-

-

PONTE SÔBRE O Córrego GROTA SÊCA - 08,00m

01 - Fundação com concreto

m³

5,20

-

-

283.000,00

100

02 - Colocação de esteios

m³

1,60

-

-

304.000,00

100

03 - Assent. trav. e longarina

m³

3,20

-

-

560.000,00

100

04 - Assent. assoalho e rodapé

m³

36,0

-

-

510.000,00

100

05 - Caixaõ de aterro

m³

-

executado

TOTAL

4.330.000,00

73,0

1.657.000,00

27,0

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Observamos, que a obra de convênio está concluída com 14,0m de comprimento, e a complementação do restante (06m) está sendo executada sôbre o Córrego Grota Sêca com (08m) de comprimento.

PESSOAS CONTACTADAS: Leandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 5.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 4.250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 750.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 02/05/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 19.08.82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02.07.82

TÉRMINO: 02.12.82

FISCAL: Engº Civil - HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	90.300,00	30	210.700,00	90
02 - Aquisição de lajotas	m ²	1.720,0	361.200,00	20	1.444.800,00	80
03 - Assentamento de lajotas	m ²	1.720,0	-		602.000,00	100
04 - Acabamento geral	vb	1.720,0	-		301.000,00	100
TOTAL			451.500,00	15	2.558.500,00	85

~~Liberado~~
LIBERADO 33% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 15 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.
Estava em execução as lajotas sextavadas, com aproximadamente 5.000 la-
jotas prontas para o assentamento.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00


SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 2.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 03.09.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 19.08.82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02.07.82

TÉRMINO: 02.12.82

FISCAL: Engº Civil - HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	90.300,00	30	210.700,00	90
02 - Aquisição de lajotas	m ²	1.720,0	361.200,00	20	1.444.800,00	80
03 - Assentamento de lajotas	m ²	1.720,0	-	.	602.000,00	100
04 - Acabamento geral	vb	1.720,0	-		301.000,00	100
TOTAL			451.500,00	15	2.558.500,00	85

~~LIBERADO~~ 33% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 15 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.
Estava em execução as lajotas sextavadas, com aproximadamente 5.000 la-
jotas prontas para o assentamento.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr/ 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr/ -

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ 2.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 03.09.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 02/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 19/10/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/07/82


TÉRMINO: 02/12/82

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	301.000,00	100	-	-
02 - Aquisição de Lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	712.250,00	30	1.093.750,00	70
03 - Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	159.250,00	30	422.750,00	70
04 - Aquisição e assentamento de meio fio	ml	1.080,0	911.520,00	100	-	-
05 - Acabamento Geral	m ²	1.720,0	-	-	301.000,00	100
TOTAL			2.084.020,00	40	1.817.500,00	60

Liberado 60 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 40 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

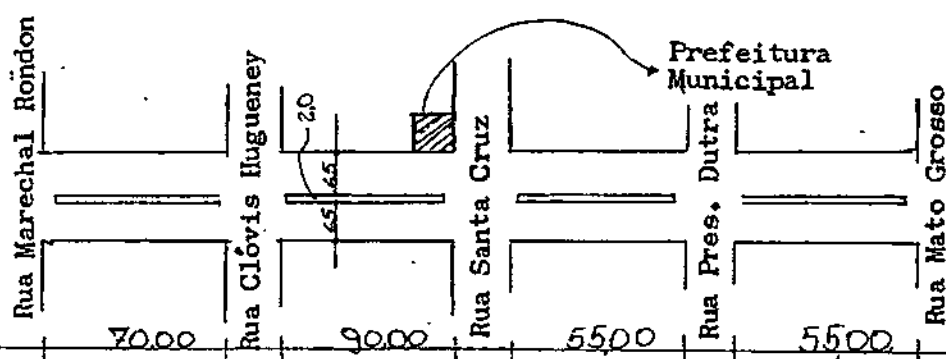

Obs: Estão sendo executados os serviços de meio fio, não especificados no Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 1.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.000.000,00

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 02/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 19/10/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/07/82


TÉRMINO: 02/12/82

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	301.000,00	100	-	-
02 - Aquisição de Lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	712.250,00	30	1.093.750,00	70
03 - Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	159.250,00	30	422.750,00	70
04 - Aquisição e assentamento de meio fio	ml	1.080,0	911.520,00	100	-	-
05 - Acabamento Geral	m ²	1.720,0	-	-	301.000,00	100
TOTAL			2.084.020,00	40	1.817.500,00	60

Liberado 60 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 40 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

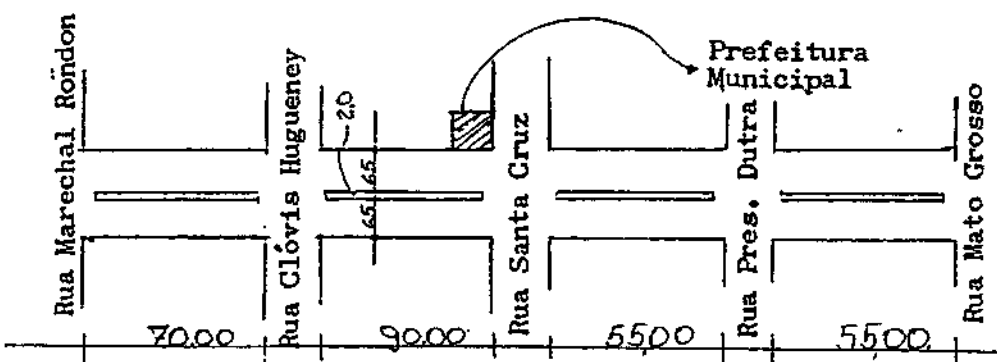

Obs: Estão sendo executados os serviços de meio fio, não especificados no Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 1.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 1.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/07/82


TÉRMINO: 02/12/82

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.720,0	301.000,00	100		
02 - Aquisição de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	1.093.750,00	70	712.250,00	30
03 - Assentamento de lajotas sextavadas	m ²	1.720,0	422.750,00	70	159.750,00	30
04 - Aquisição e assentamento de meio fio	m ¹	1.080,0	911.520,00	100		
05 - Acabamento Geral	m ²	1.720,0	-	-	301.000,00	100
TOTAL			2.729.020,00	70	1.173.000,00	30

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 70 % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

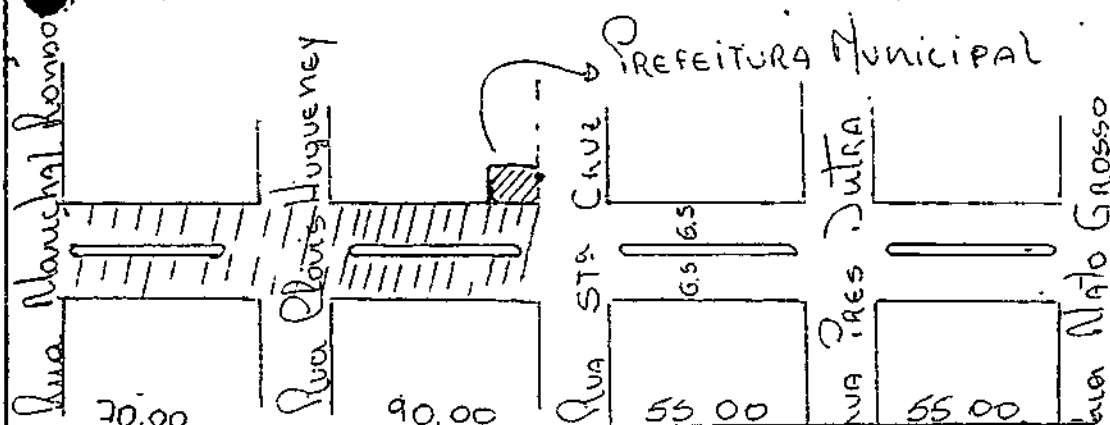

Concluído

à concluir

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 3.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 19/10/83 Cr\$ 2.950.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 50.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 26.01.83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 204/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11.12.81
TÉRMINO: 11.04.82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>CÓRREGO CUIABANO - 9,0 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	108.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	108.000,00	100	-	-
0.3 - Travesseiro, longarina	-	-	108.000,00	100	-	-
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	141.750,00	87	20.250,00	13
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	-	-	54.000,00	100
<u>AFLUENTE CÔR. CUIABANO -10,9 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	120.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	120.000,00	100	-	-
0.3 - Longarina, travesseiro	-	-	120.000,00	100	-	-
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	90.000,00	50	90.000,00	50
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	-	-	60.000,00	100
TOTAL			915.750,00	71	224.250,00	19

ANDAMENTO DA OBRA:

Executado 71,0 % da obra

Aplicado 91,0 % do Recurso do Convênio

MONÇÃO
DOURADO

TESOURO

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 18/02/82 Cr# 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# 300.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# X

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CIL SET FISC



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

Relatório - 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 204/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11.12.81
TÉRMINO: 11.04.82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO


DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
CÓRREGO CUIABANO - 70m						
0.1 - Fundação	-	-	108.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	108.000,00	100	-	-
- Travesseiro, longarina	-	-	108.000,00	100	-	-
- Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	111.159,00	97	20.250,00	49
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	162.000,00	100	54.000,00	100
			54.000,00	100		
AFLUENTE Cór. CUIABANO - 75m						
0.1 - Fundação	-	-	120.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	120.000,00	100	-	-
0.3 - Longarina, travesseiro	-	-	120.000,00	100	-	-
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	180.000,00	100	50.000,00	50
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	60.000,00	100	60.000,00	100
			104.000,00			
TOTAL			952.000,00	100	204.250,00	29

FUNDAMENTO DA OBRA:

Executado 100% da obra

Aplicado 100% do Recurso do Convênio

FAZER TERMO
DE CONCLUSÃO

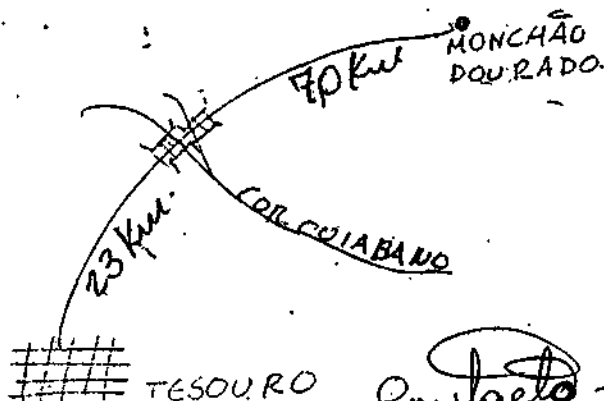

Dianari Vieira Barros
Contrato - Construtor da Obra.

11.11
22.050

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 18/02/82 Cr\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 300.000,00

TOTAL DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ - X - - -

TEC. RESP

TEC. RESP

TEC. RESP

Cuiabá - 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 204/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11.12.81


TÉRMINO: 11/04/82

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>CÓRREGO CUIABANO - 7,0 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	108.000,00	100		
0.2 - Esteios	-	-	108.000,00	100		
0.3 - Travesseiros, longarina	-	-	108.000,00	100		
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	162.000,00	100		
0.5 - Caixaão de aterro	-	-	54.000,00	100		
<u>AFLUENTE CÓRREGO CUIABANO-7,5 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	120.000,00	100		
0.2 - Esteios	-	-	120.000,00	100		
0.3 - Longarina, travesseiros	-	-	120.000,00	100		
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	180.000,00	100		
0.5 - Caixaão de aterro	-	-	60.000,00	100		
TOTAL			1.040.000,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

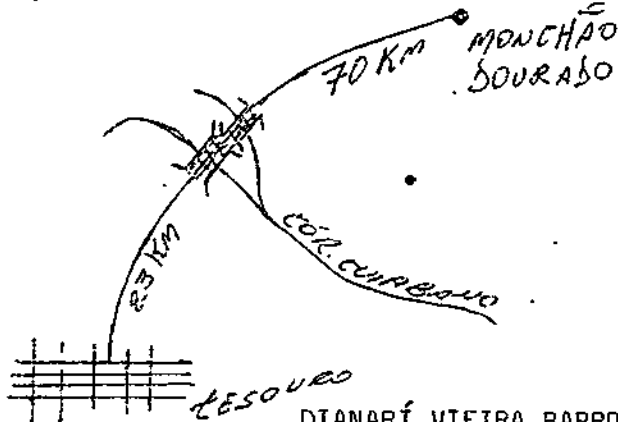

PESSOAS CONTACTADAS: DIANARÍ VIEIRA BARROS
CONTACTO - CONSTRUTOR DA OBRA;

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 09/03/82 Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# XXXXXXXXXX

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 204/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11.12.81,
TÉRMINO: 11/08/82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>CÓRREGO CUIABANO - 7,0 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	108.000,00	100		
0.2 - Esteios	-	-	108.000,00	100		
0.3 - Travesseiros, longarina	-	-	108.000,00	100		
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	162.000,00	100		
0.5 - Caixaão de aterro	-	-	54.000,00	100		
<u>AFLUENTE CÓRREGO CUIABANO-7,5 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	120.000,00	100		
0.2 - Esteios	-	-	120.000,00	100		
0.3 - Longarina, travesseiro	-	-	120.000,00	100		
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	180.000,00	100		
0.5 - Caixaão de aterro	-	-	60.000,00	100		
TOTAL			-	1.040.000,00	100	

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

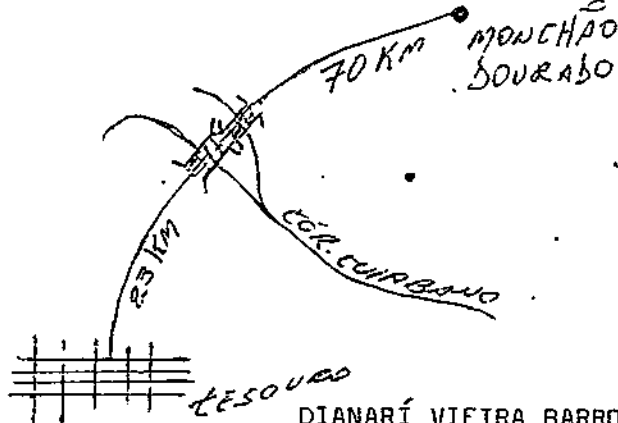

PESSOAS CONTACTADAS: DIANARÍ VIEIRA BARROS
CONTACTO - CONSTRUTOR DA OBRA;

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 09/03/82 Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# XXXXXXXXXX

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 204/81

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 1983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 204/81, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOURO - MT em 11 / DEZEMBRO / 81.


Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 27 de Janeiro de 1983


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal de TESOURO - MT


Diretor de Operações

2º Atimado

INÍCIO: 21/11/10
PROJETO: OBRAS DE REPARAÇÃO
CUST. PONTE DE VILA
CUPIM I (15,7) CUPIM II (15,7)
EXECUTOR: ADMINISTRACAO MIA
FISCAL: FELIO INES DE OLIVEIRA FILHO

CONVENIO ADPC Nº 1
PRAZO DE EXECUCAO
INICIO: 03/11/10
TERMINO: 12/11
Nº DE DIAS: 100

DISCRIMINACAO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECU
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
CUPIM I - R\$ 250.000,00					
1. Fundacao	m ³	5,3	50.000,00	100	
2. Estacas, travesseiros, longarim	m ³	6,2	50.000,00	100	
3. Asscalho, rodeiro e rodape	ml	108,0	125.000,00	100	
4. Caixaõ de aterro	m ²	33,0	25.000,00	100	
CUPIM II - R\$ 250.000,00					
21. Fundacao	m ³	6,3	50.000,00	100	
22. Estacas, travesseiros, longarim	m ³	6,2	50.000,00	100	
23. Asscalho, rodeiro e rodape	ml	108,0	125.000,00	100	
24. Caixaõ de aterro	m ²	33,0	25.000,00	100	
TOTAL			500.000,00	100	

ANDAMENTO DA OBRA:

Foi executado o aterro das pontes com
aterro de areia

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 500.000,00
VALOR LIBERADO, ATÉ 02/10/18: Cr\$ 250.000,00
VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 250.000,00
TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$

TEC RESP:
PREF MUN:
CHefe FISC:

INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE LEBERZEL

CONVÊNIO ADPC Nº 14/80

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 15/12/80

TERMINO: 05/12/80

Nº DE DIAS: 17

ITEM	FASES OU ETAPAS	EXECUTADO		A EXECUTAR	
		VALOR	%	VALOR	%
01	<u>PONTE SOBRE RIO CUPIM</u>				
01	Fundação	55000,00			
02	Estreios	81400,00			
03	Vigas, sobre vigas e trav.	126100,00			
04	Assobalho rodapé, corrimão	113800,00			
05	Guias de roda	47000,00			
	<u>PONTE SOBRE GROTA SECA</u>				
01	Fundação	14800,00			
02	Estreios	18600,00			
03	Vigas sobre vigas e transversais	28800,00			
04	Assobalho, rodapé e corrimão	26100,00			
05	Guias de roda	9300,00			
	TOTAL	530900,00	100		100

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO ANDAMENTO DA OBRA:

Foram executadas duas pontes, com
croqui ao lado

A 1ª sobre o rio cupim com 22,0m.

A 2ª ~~sobre~~ ~~grotas~~ grotas seca 5,0m

VALOR DO CONVÊNIO: 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 10/10/80 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO: 250.000,00

TOTAL ACUMULADO: 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: —

TEC RESP

PREF MUN

CH SEI

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 09-03-82

MUNICÍPIO: TESOURO.
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA -
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

CONVÊNIO ADPC Nº 204/81

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11-12-81.
TÉRMINO: 11-04-82.
Nº DE DIAS: 120.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
Córrego Cuabano. 90 m.						
001- Fundação			108.000,00	100	—	—
002- Esteios			108.000,00	100	—	—
003- Travesseiro, longarina			108.000,00	100	—	—
004- Assoalho, madeiro, rodapé			141.750,00	87,5	20.250,00	13,5
005- Caixa de aterro			—	—	54.000,00	100
Afluentes cór. Cuabano. 100 m.						
01 Fundação			120.000,00	100	—	—
02 Esteios			120.000,00	100	—	—
03 Trav. Longarina			120.000,00	100	—	—
04 Assoalho, madeiro, rodapé			90.000,00	50	90.000,00	50
05 Caixa de aterro			—	—	60.000,00	100
TOTAL			915.750,00	71,0	224.250,00	19,0

ANDAMENTO DA OBRA:

Executado. 71,0 da obra.
Aplicado. 91,0 do recurso do convênio.
Contactos: ~~concordo~~ ~~com~~ ~~o~~ ~~proj~~ ~~eto~~
Helio Duarte D. Lela.
Pref. Municipal.
Luiz da Silva.
Construtor.

MOUCHAD
DOURADO

TESOURO

1

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ 18-02-82: Cr\$ 700.000,00
VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 300.000,00
TOTAL ACUMULADO Cr\$ 1.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ —

TEC. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL
CONSTRUTORA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82.

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

RELATÓRIO Nº 02/82.

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA.

DATA DA INSPEÇÃO 21/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18-06-82.
TÉRMINO: 18-11-82.
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
1- PONTE SI/ Córrego Aricaçu - 30 metros.						
1.1. Fundação c/ concreto c/ cimento.	m ³	15,8.	—		158.000,00	100
1.2. Colocação de esteiros.	m ²	4,8	—		400.000,00	100
1.3. Assent. travess. longarinas.	m ³	7,2	—		850.000,00	100
1.4. Assent. assoalho, rodéio e rodape.	m ³	171,0	—		1.200.050,00	100
1.5. Caixa de aterro.	m ³	300,0	—		430.000,00	100
TOTAL					3038050,00	100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

*Obra não iniciada, recurso não aplicado.
Convênio deverá ser reprogramado*

PESSOAS CONTACTADAS: Milton Ribeiro
Secretário Geral.

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 10/09/82 Cr\$ 1.300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 1. —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.700.000,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT.

RELATÓRIO Nº 01/82

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 21/08/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/06/82

TÉRMINO: 18/11/82

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - PONTE SOBRE O Córrego Aricá - AQUÍ	m	30,0				
1.1 - Fundação com concreto ciclo-	m ³	15,8	-	-	274.662,00	100
pico.	m ³	4,8	-	-	549.324,00	100
1.2 - Colocação de esteios.	m ³	7,2	-	-	823.986,00	100
1.3 - Assentamento travessias e long.	m ³					
1.4 - Assentamento assoalho, rod.	m ²	171,0	-	-	823.986,00	100
rodapéis	m ³	300,0	-	-	274.662,00	100
1.5 - Caixão de aterro.						
TOTAL					2.746.620,00	100

RELACIONADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

OBS.: Obra não iniciada

Até a presente data, o Sr. Prefeito Municipal não encontrou empreiteiro com preços combatíveis ao do convênio.

Orçamento mês Julho/82, conforme 70% dos preços DERMAT.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr# 2.500.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ 18.06.82	Cr# 1.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO(PARCELA)Cr#	-
TOTAL ACUMULADO:	Cr# 1.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr# 1.000.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 24.08.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 11/04/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 24/02/83

TÉRMINO: 24/06/83

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - REFORMA DA PONTE S/ O RIO CAETE - 30 m.						
1.1 - Fundação concreto ciclópico	m ³	2,3			280.000,00	100
1.2 - Colocação de Esteios	m ³	0,78			372.000,00	100
1.3 - Assent. assoalho, rod, rodapé	m ³	171,0			840.000,00	100
1.4 - Assent. traveseiros e longarinas	m ³	1,42			840.000,00	100
1.5 - Caixão de aterro	m ³	130,0			280.000,00	100
TOTAL					2.612.000,00	100


LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA É CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- A obra Reforma Ponte Caete - 30m, inclui prolongamento de 5m de ponte, assent. traveseiro, longarina, troca de assoalho, rodéiro e caixão de aterro de 1(um) lado.

- Obra não iniciada

- Em fase de aquisição de material

PESSOAS CONTACTADAS:

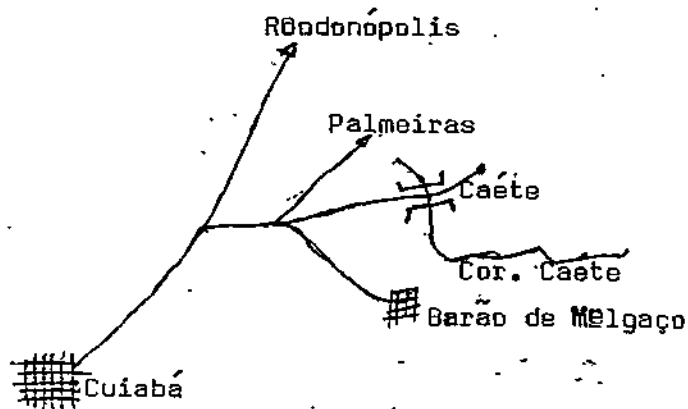

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/02/83 Cr# 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 700.000,00

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/04/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT.

RELATÓRIO Nº 01/82

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 21/08/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/06/82

TÉRMINO: 18/11/82

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - PONTE SOBRE O CÓRREGO ARICÁ - AÇÚ	m	30,0				
1.1 - Fundação com concreto ciclópico.	m ³	15,8	-	-	274.662,00	100
1.2 - Colocação de esteios.	m ³	4,8	-	-	549.324,00	100
1.3 - Assentamento travess e long.	m ³	7,2	-	-	823.986,00	100
1.4 - Assentamento assoalho, rod. rodapés	m ²	171,0	-	-	823.986,00	100
1.5 - Caixaão de aterro	m ³	300,0	-	-	274.662,00	100
TOTAL					2.746.620,00	100

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

OBS.: Obra não iniciada

Até a presente data, o Sr. Prefeito Municipal não encontrou empreiteiro com preços combatíveis ao do convênio.

Orçamento mês Julho/82, conforme 70% dos preços DERMAT.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 18.06.82 Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 1.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 24.08.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT.

RELATÓRIO Nº 01/82

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 21/08/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 18/06/82

TÉRMINO: 18/11/82

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: Enge Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. PONTE SOBRE O CÓRREGO ARICÁ - ACÚ	m	30,0				
1.1 - Fundação com concreto ciclo-	m ³	15,8	-	-	274.662,00	100
pico.	m ³					
1.2 - Colocação de esteios	m ³	4,8	-	-	549.324,00	100
1.3 - Assentamento traves e long.	m ³	7,2	-	-	823.986,00	100
1.4 - Assentamento assoalho, rod.	m ²	171,0	-	-	823.986,00	100
rodapé	m ³					
1.5 - Caixa de aterro	m ³	300,0	-	-	274.662,00	100
TOTAL					2.746.620,00	100

ADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

OBS.: Obra não iniciada

Até a presente data, o Sr. Prefeito Municipal não encontrou empreiteiro com preços combatíveis ao do convênio.

Orçamento mês Julho/82, conforme 70% dos preços DERMAT.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 18.06.82 Cr\$ 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 24.08.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 11/04/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 24/02/83

TÉRMINO: 24/06/83

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120


DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - REFORMA DA PONTE S/ O RIO CAETE - 30 m.						
1.1 - Fundação concreto ciclópico	m ³	2,3			280.000,00	100
1.2 - Colocação de Esteios	m ³	0,78			372.000,00	100
1.3 - Assent. assoalho, rod, rodapé	m ³	171,0			840.000,00	100
1.4 - Assent. travesseiros e longerinas	m ³	1.42			840.000,00	100
1.5 - Caixão de aterro	m ³	130,0			280.000,00	100
TOTAL					2.612.000,00	100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA É CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

A obra Reforma Ponte Caete - 30m, inclui prolongamento de 5m de ponte, assent. travesseiro, longerina, troca de assoalho, rodeiro e caixão de aterro de 1(um) lado.

- Obra não iniciada
- Em fase de aquisição de material

PESSOAS CONTACTADAS:

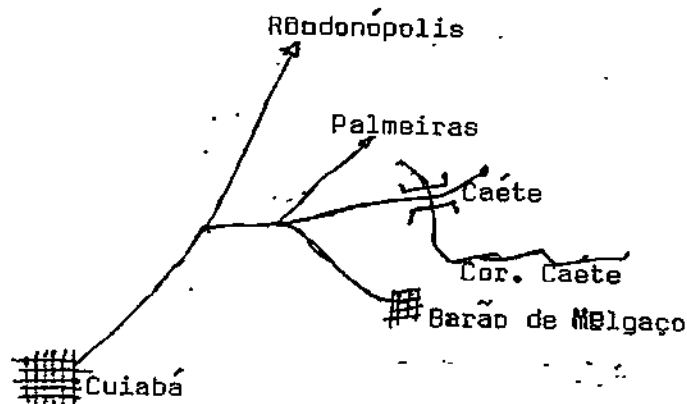

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/02/83 Cr\$ 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.800.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 700.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 20/04/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 21/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 18.06.82
TÉRMINO: 18.11.82
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO

UNIC.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
		Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%
0.1 - Ponte s/Córrego Aricá-Açú - 30 mts					
1.1 - Fundação c/ concreto ciclópico	m ³ 15,8	-	-	158.000,00	100
1.2 - Colocação de esteios	m ³ 4,8	-	-	400.000,00	100
1.3 - Assentamento, travessieiros, long.	m ³ 7,2	-	-	850.000,00	100
1.4 - Assentamento, assoalho, rodeiro e rodapé	m ³ 171,0	-	-	1.200.050,00	100
1.5 - Caixão de aterro	m ³ 300,0	-	-	450.000,00	100
TOTAL				3.038.050,00	100

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra não iniciada, recurso não aplicado.

Convênio deverá ser reprogramado.

PESSOAS CONTACTADAS: Milton Ribeiro - Sec. Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 10.09.82 Cr/ 1.300.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr/ -

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 1.300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ 1.200.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 26.01.83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 116/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 01

PROJETO: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 20/10/82

EXECUTOR: ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 14/09/82
TÉRMINO: 14/02/83
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	238.434,00	100	-	-
02 - Trabalhos em Terra	m ³	484,0	229.811,40	100	-	-
03 - Estruturas das Fundações	m ³	72,0	1.732.004,32	100	-	-
04 - Estrutura de Elevação e Laje	m ³	104,8	2.961.007,81	100	-	-
05 - Impermeabilização	m ²	70,0	22.476,47	100	-	-
06 - Alvenaria(muro)	m ²	165,5	754.543,66	100	-	-
07 - Revestimento(muro)	m ²	893,7	422.487,41	100	-	-
08 - Cobertura c/ Telha de Barro	m	890,0	574.276,76	100	-	-
09 - Esquadrias de Ferro e Madeira	Vb	-	3.321.817,19	100	-	-
10 - Piso inclusive contra piso	m	820,0	2.199.932,54	100	-	-
11 - Vidro e Pintura	Vb	-	1.762.052,78	100	-	-
12 - Inst. Hid. Elét. Sanit. e Aparelhos	Vb	-	2.896.586,13	100	-	-
13 - Área externa e Serv. Comp.	-	-	1.708.759,95	100	-	-
14 - Limpeza Geral da Obra	Vb	-	122.402,59	100	-	-
TOTAL			18.946.411,00	100		

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Conv: ADPC Nº 67/80 - Cr\$ 2.500.000,00

Conv: ADPC Nº 79/81 - Cr\$ 3.500.000,00

Conv: ADPC Nº 116/82 - Cr\$ 10.000.000,00

Cr\$ 16.000.000,00

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 10.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 20/09/82 Cr\$ 7.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ 3.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 10.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIARA, 21/10/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMÔNSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 116/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEUENBERG.

RELATÓRIO Nº 02.

PROJETO: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

DATA DA INSPEÇÃO 21/01/83

EXECUTOR: ENCO - ENGENHARIA E COMERCIO - LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 14-09-82

TÉRMINO: 14-02-83

Nº DE DIAS: 150.

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Serviço preliminar.	ob	-	238.434,00	100	-	-
02- Trabalho em terra	m ³	484,0	229.811,00	100	-	-
03- Estrutura das fundações	m ³	72,0	1.732.004,00	100	-	-
04- Estrutura de elevação, laje	m ²	104,8	2961.007,00	100	-	-
05- Impermeabilização	m ²	700	22.476,00	100	-	-
06- Alvenaria (muro)	m ²	165,5	754.543,00	100	-	-
07- Revestimento (muro)	m ²	893,7	422.487,00	100	-	-
08- Cobertura de telha barro	m ²	899,0	574.276,00	100	-	-
09- Esquadrias de fe e made	ob	-	3321.817,00	100	-	-
10- Piso inv. contra-piso.	m ²	820,0	2199.932,00	100	-	-
11- Dado e pintura	m ²	3600,0	3.762.052,00	100	-	-
12- Teto inv. tel. san. e ap.	ob	-	3.896.586,00	100	-	-
13- Área externa e repl. comp.	m ²	1400,0	2.708.759,00	100	-	-
14- Limpeza geral da obra	ob	-	622.402,00	100	-	-
TOTAL			23.446.411,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Conv. ADPC Nº 67/80 - Cr\$ 2500.000,00
Conv. ADPC Nº 79/81 - Cr\$ 3500.000,00.
Conv. ADPC Nº 116/82 - Cr\$ 10.000.000,00
ADITIVO AO CONV. 116/82 - Cr\$ 7.000.000,00
Cr\$ 23.000.000,00.

PESSOAS CONTACTADAS:

Hilton Ribeiro
Secretario Geral.

FAZER TERMO
DE CONCLUSÃO

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr\$ 17.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 20/10/82. Cr\$ 17.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(____PARCELA) Cr\$ ____

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 17.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$ ____

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 116/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 02

PROJETO: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 21/01/83

EXECUTOR: ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 14/09/82

TÉRMINO: 14/02/83

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Serviços preliminares	Vb	-	238.434,00	100		
02 - Trabalho em terra	m ³	484,00	229.811,00	100		
03 - Estrutura das fundações	m ³	72,00	1.732.004,00	100		
04 - Estrutura de elevação, laje	m ²	104,80	2.961.007,00	100		
05 - Impermeabilização	m ²	70,00	22.476,00	100		
06 - Alvenaria (Muro)	m ²	165,50	754.543,00	100		
07 - Revestimento (Muro)	m ²	893,00	422.487,00	100		
08 - Cobertura c/ telhas de barro	m	890,00	574.276,00	100		
09 - Esquadrias de ferro e madeira	Vb	-	3.321.817,00	100		
10 - Piso inclusive contra - piso	m ²	820,00	2.199.932,00	100		
11 - Vidro e pintura	m	3.600,00	3.762.052,00	100		
12 - Instalações hid., elét., san e apar	Vb	-	3.896.586,00	100		
13 - Área externa e serv. comp.	m ²	1.400,00	2.708.759,00	100		
14 - Limpeza geral da obra	Vb	-	622.402,00	100		
TOTAL			23.446.411,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Conv: ADPC Nº 67/80 - R\$ 2.500.000,00

Conv: ADPC Nº 79/81 - R\$ 3.500.000,00

Conv: ADPC Nº 116/82 - R\$ 10.000.000,00

TERMO ADITIVO CONV: 116/82 - R\$ 7.000.000,00

R\$ 23.000.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Milton Ribeiro - Secretario Geral

VALOR DO CONV.  Cr\$ 17.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 20/10/82 Cr\$ 17.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 17.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP. 

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC. 

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 116/82

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 02

PROJETO: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

DATA DA INSPEÇÃO 21/01/83

EXECUTOR: ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 14/09/82

TÉRMINO: 14/02/83

Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços preliminares	Vb	-	238.434,00	100		
02 - Trabalho em terra	m ³	484,00	229.811,00	100		
03 - Estrutura das fundações	m ³	72,00	1.732.004,00	100		
04 - Estrutura de elevação, laje	m ²	104,80	2.961.007,00	100		
05 - Impermeabilização	m ²	70,00	22.476,00	100		
06 - Alvenaria (Muro)	m ²	165,50	754.543,00	100		
07 - Revestimento (Muro)	m ²	893,70	422.487,00	100		
08 - Cobertura c/ telhas de barro	m	890,00	574.276,00	100		
09 - Esquadrias de ferro e madeira	Vb	-	3.321.817,00	100		
10 - Piso inclusive contra - piso	m ²	820,00	2.199.932,00	100		
11 - Vidro e pintura	m	3.600,00	3.762.052,00	100		
12 - Instalações hid., elét., san e apar	Vb	-	3.896.586,00	100		
13 - Área externa e serv. comp.	m ²	1.400,00	2.708.759,00	100		
14 - Limpeza geral da obra	Vb	-	622.402,00	100		
TOTAL			23.446.411,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Conv: ADPC Nº 67/80 - R\$ 2.500.000,00

Conv: ADPC Nº 79/81 - R\$ 3.500.000,00

Conv: ADPC Nº 116/82 - R\$ 10.000.000,00

TERMO ADITIVO CONV: 116/82 - R\$ 7.000.000,00

R\$ 23.000.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Milton Ribeiro - Secretario Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 17.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 20/10/82 Cr# 17.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# - x -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 17.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - x -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 116/82

OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Aos 21 dias do mês de Janeiro do ano de 1983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 116/83, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER em 14 / SETEMBRO / 82.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.


Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 27 de Janeiro de 1983



Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger - MT



Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 131/82

MUNICÍPIO: SINOP

RELATÓRIO Nº 01/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 2ª e 3ª FASE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

DATA DA INSPEÇÃO 15.04.83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 27.09.82

TÉRMINO: C.C.F.F.

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	m ²	240,0	276.078,00	100		
02 - Fundação c/sapatas diretas	m ²	11,92	531.800,00	100		
03 - Impermeabilização da fund.	m ²	50,00	50.000,00	100		
04 - Adlv. tj. cerâmicos 8 furos	m ²	498,75	897.750,00	100		
05 - Forro de madeira	m ²	280,00	560.000,00	100		
06 - Revestimento inc. azulejos	m ²	2.970,00	2.072.070,00	100		
07 - Contra piso e cimentado	m ²	240,00	667.200,00	100		
08 - Estrutura da cobertura e cobertura	m ²	240,00	1.310.000,00	100		
09 - Esquadrias de Fe e madeira	ud	31,00	630.160,00	100		
10 - Vidros tipo canelado	m ²	37,20	297.600,00	100		
11 - Instalação elétrica	vb	-	300.000,00	100		
12 - Instalação hidro-sanitária	vb	-	280.000,00	100		
13 - Pintura	m ²	379,75	532.875,00	100		
14 - Limpeza da edificação	m ²	240,00	50.000,00	100		
TOTAL			9.253.533,00	100		

LIBERADO 77 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Obra concluída
- Observo que o piso, que será tipo paviflex será executado com recursos próprios, pois não consta no orçamento fornecido por esta Cia à Prefeitura de Sinop.

PESSOAS CONTACTADAS: Geraldino Barbosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 9.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 24.11.82 Cr# 7.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 2.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 9.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 20.04.83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 131/83

MUNICÍPIO: SINOP

RELATÓRIO Nº 01/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 2ª e 3ª FASE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

DATA DA INSPEÇÃO 15.04.83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 27.09.82
TÉRMINO: C.C.F.F.
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	
01 - Serviços Preliminares	m ²	240,0	276.078,00	100		
02 - Fundação c/sapatas diretas	m ²	11,92	531.800,00	100		
03 - Impermeabilização da fund.	m ²	50,00	50.000,00	100		
04 - Adlv. tj. cerâmicos 8 furos	m ²	498,75	897.750,00	100		
05 - Forro de madeira	m ²	280,00	560.000,00	100		
06 - Revestimento inc. azulejos	m ²	2.970,00	2.072.070,00	100		
07 - Contra piso e cimentado	m ²	240,00	667.200,00	100		
08 - Estrutura da cobertura e cobertura	m ²	240,00	1.310.000,00	100		
09 - Esquadrias de fe e madeira	uf	31,00	630.160,00	100		
10 - Vidros tipo cancelado	m ²	37,20	297.600,00	100		
11 - Instalação elétrica	vb	-	300.000,00	100		
12 - Instalação hidro-sanitária	vb	-	280.000,00	100		
13 - Pintura	m ²	379,75	532.875,00	100		
14 - Limpeza da edificação	m	240,00	50.000,00	100		
TOTAL			9.253.533,00	100		

LIBERADO 77 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra concluída
- Observo que o piso, que será tipo paviflex será executado com recursos próprios, pois não consta no orçamento fornecido por esta Cia à Prefeitura de Sinop.

PESSOAS CONTACTADAS: Geraldino Barbosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 9.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 24.11.82 Cr# 7.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 2.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 9.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 20.04.83

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 02/83

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 09/05/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 24/02/83

TÉRMINO: 24/06/83


Nº DE DIAS: 120

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	
Reforma Ponte s/ cor. Caete	18m					
1.1. Fundaçã em concreto	m ³	2,30	280.000,00	100	-	
1.2. Colocação de esteios	m ³	0,78	372.000,00	100	-	
1.3. Assent. assoalho e rodeiro	m ²	110,00	840.000,00	100	-	
1.4. Ament. travesseiro e longarino	m ³	1,42	840.000,00	100	-	
1.5. Caixão de aterro	m ³	130,00	280.000,00	100	-	
TOTAL			2.612.000,00	100	-	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc RONDONÓPOLIS

- Obra Concluída

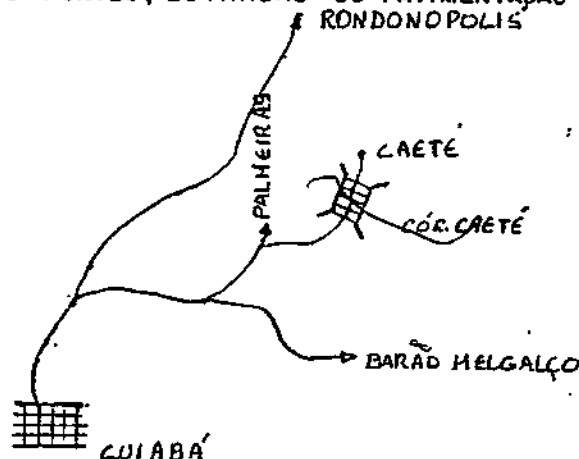

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/02/83 Cr# 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 700.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/05/83

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIA N.º 01/83

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DE INSPEÇÃO 22/02/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Eng.º HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 24.02.83

TÉRMINO: 24.06.83

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
1.1 - Reforma da Ponte s/Rio Caete -30m						
1.2 - Assentamento, travesseiros, long.	m	7,2	1.050.000,00	100		
1.2 - Assentf, assoalho, rodeiro e rodapé	m	171,0	340.000,00	29	800.050,00	71
1.3 - Caixão de aterro	m	300,0			430.000,00	100
TOTAL			1.390.000,00	60	1.230.050,00	40

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra em andamento

PESSOAS CONTACTADAS: Edison Gonçalves - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$ 2.500.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ 24.02.83	Cr\$ 1.200.000,00
VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$	700.000,00 :-
TOTAL ACUMULADO:	Cr\$ 2.500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr\$ - .

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 29.02.83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 02/83

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 09/05/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 24/02/83

TÉRMINO: 24/06/83


Nº DE DIAS: 120

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	
Reforma Ponte s/ cor. Caete	18m					
1.1. Fundaçã em concreto	m ³	2,30	280.000,00	100	-	
1.2. Colocação de estaios.	m ³	0,78	372.000,00	100	-	
1.3. Assent. asfalto e rodeiro	m ²	110,00	840.000,00	100	-	
1.4. Ament. travesseiro e longarino	m ³	1,42	840.000,00	100	-	
1.5. Caixão de aterro	m ³	130,00	280.000,00	100	-	
TOTAL			2.612.000,00	100	-	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc

- Obra Concluída

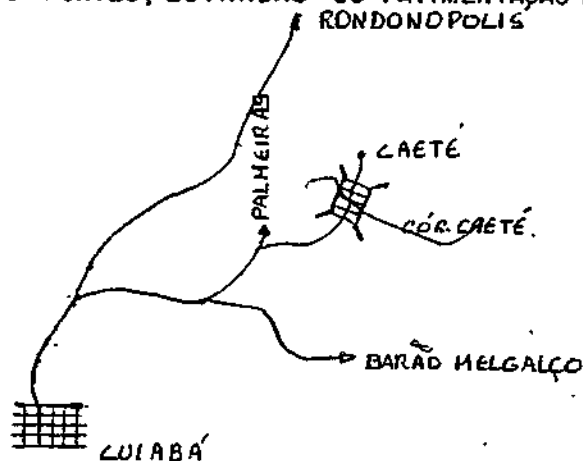

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 2.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/02/83 Cr# 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 700.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 2.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 10/05/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº 02/83

OBRA: Construção de Ponte de Madeira sobre o córrego Caete

Aos 09 dias do mês de maio do ano de 1983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de nº 02/83, firmado entre o Governo do Estado/ MT e a Prefeitura Municipal de Stº. Antonio do Leverger em 24 / 02 / 83.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 10 de maio de 1983


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal

Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: Convênio ADPC nº 02/83


OBRA: Construção de Ponte de Madeira sobre o córrego Caete

Aos 09 dias do mês de maio do ano de 1983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de nº 02/83, firmado entre o Governo do Estado/ MT e a Prefeitura Municipal de Stº. Antonio do Leverger em 24 / 02 / 83.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 10 de maio de 19 83


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal

Diretor de Operações



РАБОТА

4/5/

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 169/84

MUNICÍPIO: TORIXORÉO

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: INICIO DA CONSTRUÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO 23/01/85

DO TERMINAL RODOVIÁRIO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 09/10/84
TÉRMINO: 09/10/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº Helio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Serv. preliminares e limpeza	m ²	6834,0	3.259.000	100		
0.2 - Escavação das valas	m ³	33,80	1.241.954	100		
0.3 - Fundação c/ vigas baldrame	m ³	6,08	4.027.968	100		
0.4 - Aterro entre as vigas baldrame	m ³	180,0	1.497.420	100		
0.5 - Estrutura de elevação	m ³	12,01	6.103.394	100		
0.6 - Alvenaria de elevação	m ²	340,0	5.043.360	100		
0.7 - Cobertura canelada "90"	m ²	235,95	9.200.000	100	3.100.000	
0.8 - Serviços a executar	m ²	680,0	-	100	56.281.804	100
08 - Chapisco	m ²	680,0	-	-	-	10
09 - Revestimento	m ²	680,0	-	-	-	10
10 - Piso	m ²	736,0	-	-	-	10
11 - Esquadrias de Fe e Mad.	un	170	-	-	-	10
12 - Pintura	m ²	680,0	-	-	-	10
13 - Limpeza da obra	hb	-	-	-	-	10
TOTAL			30.373.696	51	59.187.304	4

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

OBS: obra em andamento normal

- Obra paralizada; porém executado até a cobertura inclusive alvenaria

C.I. nº 25/85 de
28/01/85 - do S. de
Fiscalização

Em 28/01/85

Lincom Sargin - Prefeito Municipal

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$ 40.000.000
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	Cr\$ 32.000.000
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$	6.000.000
TOTAL ACUMULADO:	Cr\$ 38.000.000
VALOR DO CONVÊNIO:	Cr\$ 2.000.000

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SBT FISC.

30/01/85



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 166/84

MUNICÍPIO: TORIXORÉO - MT

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 04/12/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 09/10/84
TÉRMINO: 09/02/85
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

Cr# VALOR

A EXECUTAR

Cr# VALOR

RIO DIAMANTINO - 25,0m

a) - Fundação

m³

18,00

4.500.000, 100

b) - Esteios, long. e travesseiros

m³

15,76

24.000.000, 100

c) - Assoalho e Rodeiros

m²

142,50

9.000.000, 100

d) - Caixaão de aterro

m³

84,00

7.500.000, 100

TOTAL

28.500.000, 63

16.500.000, 37

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO.

EXECUTADO

% DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.

ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra em execução normal.

Proc 8.177/84

10/12/84

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

Cr# 40.000.000,

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr# 16.000.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 12.000.000,

TOTAL ACJMLADO:

Cr# 28.000.000,

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr# 12.000.000,

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 06/12/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 166/84

MUNICÍPIO: TORIXORÉO

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: Construção de pontes de madeira

DATA DA INSPEÇÃO 23/01/85

EXECUTOR: Administração Direta

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 09/10/84

TÉRMINO: 09/02/85

FISCAL: Helio Nunes de Oliveira Filho

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
Ponte sobre o Córrego Gariroba-Vão	25 m					
0.1 - Escavação valas	m ³	21,9				
0.2 - Fundação c/ concreto ciclôpi-	m ³	16,7	2.300.000	100		
co						
0.3 - Colocação de esteios	ml	84,0	7.200.000	100		
0.4 - Vigamento	ml	112,0	10.600.000	100		
0.5 - Assoalho, madeiro	m	112,0	10.080.000	70	4320.000	3
0.6 - Caixaão de aterro	m ³	220,0			8.600.000	10
TOTAL			30.180.000	70	12.920.000	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

OBS: obra em execução normal

Obs: obra paralizada

Proc. nº 114/85

Del. nº 150/85

de 04/01/85

de 23/01/85

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 40.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 28.000.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 10.000.000

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 38.000.000

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 2000.000

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

24/04/85

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 04/84

MUNICÍPIO: TORIXOREO

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA AV. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (VILA

DATA DA INSPEÇÃO 28/04/84

PONTAL) 6500 m²

EXECUTOR: SERVITERRA S/A

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 15.03.84

TÉRMINO: 15.07.84

Nº DE DIAS: 120.

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Correção do greide com terreflunagem de $\pm$ 20cm	m ³	1.200,0	2.490.000,00	100	-	-
02 - Regularização e compactação do subleito	m ²	6.000,0	1.800.000,00	100	-	-
03 - Estabilização granulométrica da base com 20cm	m ³	1.200,0	3.980.000,00	100	-	-
04 - Imprimação	m ²	6.000,0	5.600.000,00	100	-	-
05 - Tratamento superficial duplo com emulsão	m ²	6.000,0	6.800.000,00	100	-	-
06 - Tapa selante com banho diluído	m ²	6.000,0	9.600.000,00	100	-	-
07 - Meio-fio	m	1.200,0	2.590.200,00	50	2.590.200,00	50
08 - Sarjetas	m	1.200,0	3.285.000,00	50	3.285.000,00	50
TOTAL			36.145.200,00	88	5.875.200,00	12

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Foram executados apenas 6.000 m² de pavimentação, outrossim foram executados 1.200m de meio-fio e 1.200m de sarjeta não citados no convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Valdecy Rodrigues de Paz - Construtor SERVITERRA S/A

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 40.000.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 16.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 24.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 40.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 02.05.84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 90/84

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO ACESSO À CIDADE

DATA DA INSPEÇÃO 16/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR
Obra em fase inicial	Vb		1.200.000,00	66	800.000,00
TOTAL			1.200.000,00	66	800.000,00

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E

- Feito o desmatamento e os serviços de terraplenagem.
- Será executado um "trevo" no acesso da cidade.
- Adquiridas 2.000 tijolinhas e 30 sacas de cimento

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 2.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr/ 1.400.000,00

VALOR A SER LIBERADO

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 1.400.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ 600.000,00

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

CONVENIO ADPC Nº 091/84

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA / MT

RELATÓRIO Nº 002/84

PROJETO: CONSTRUÇÕES DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 16/09/84

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: ENGR CELSO PEREIRA DO AMARAL

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
1.0) Córrego Jaguatirica - 10,00 M.						
1.1) Fundação.....	Vb	136	1.200.000,00	100		
1.2) Esteios.....	Vb	16	1.200.000,00	100		
1.3) Longarinas, travesseiros, Assoa- lho e rodeiros.....	Vb	450	2.400.000,00	100		
1.4) Acabamento.....	Vb	630	-	-	1.200.000,00	100
2.0) Córrego Fazenda Campo Alegre 20,00 M.						
-	m²	1840	18.000,00	50	18.000,00	50
-	m²	611	3	50	102	51
-		00,0			12.000.000,00	100
-		950				
TOTAL			4.800.000,00	200	13.200.000,00	220

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Obra em execução normal

PESSOAS CONTACTADAS: Sr. Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 18.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Inicial Cr\$ 2.400.000,00

VALOR A SER LIBERADO (2ª PARCELA) Cr\$ 2.400.000,00

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 5.600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO Cr\$ 12.400.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

SET. FISC.

DIÁRIA 12/09/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 91/84

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA - MT

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: CONSTRUÇÕES DE PONTES DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 16/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	
01 - Córrego Jaguatirica - 10,00m						
1.1 - Fundação	m ³	10,36	1.200.000,00	100		
1.2 - Esteios, longarina e trav.	m ²	2,16	1.200.000,00	100		
1.3 - Assoalho e rodeiros	m ³	45,0	2.400.000,00	100		
1.4 - Acabamento	m	60,0	-	-	1.200.000,00	
02 - Córrego Fazenda Campo Alegre - 20,00m						
Córrego " Confusão "						
2.1 - Fundação	m ³	18,40	1.200.000,00	50	1.200.000,00	
2.2 - Esteios, longarina e trav.	m ²	6,16	1.200.000,00	50	1.200.000,00	
2.3 - Assoalho, rodeiro e rodapé	m ³	90,0			4.800.000,00	
2.4 - Caixão de aterro	m	45,0			2.400.000,00	
TOTAL			7.200.000,00	40	10.800.000,00	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACUMULADO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,

- Aponte sobre o Córrego da fazenda campo alegre,
está em fase inicial, com o madeiramento de base (fundação)
e vigamento adquiridas

PESSOAS CONTACTADAS: Lourivaldo de Oliveira Mattos - Construtor

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 18.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 5.600.000,00

VALOR A SER LIBERADO

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 5.600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 12.400.000,00

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.

16.09.84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL MUNICIPAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Enqº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

INTERNO Nº 190/04

RELATÓRIO Nº 01/85

DATA DA INSPEÇÃO: 23/01/85

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 13/12/84
 TÉRMINO: 13/06/85
 Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR
01 - <i>Limpeza do terreno</i>	m ²	10400	1.980.320	100	-
02 - <i>Esboço de planta</i>	m ³	53,0	456.595	100	-
03 - <i>Fundação c/ blocos</i>	m ³	3,46	1.659.500	100	-
04 - <i>Sapatas</i>	m ³	60,0	10.787.880	100	-
05 - <i>Vigas baldraus</i>	m ³	33,24	6.334.713	100	-
06 - <i>Impermeabilização</i>	m ²	138,0	2.296.734	100	-
07 - <i>Alvenaria de elevação</i>	m ²	831,0	7.242.580	50	7.242.580
08 - <i>Cinta de concreto</i>	m ³	3,0	1.097.343	50	1.097.343
09 - <i>Reaterra entre baldraus</i>	m ³	230,0	3.179.060	100	-
TOTAL			35.034.725		8.339.923

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACUM.
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS, OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.

- Obra em fase de levantamento de alvenaria
 - Área a ser construída = 595,85 m²
 - Terreno (26 x 40) m.

CONTACTO = SINAL NOGUEIRA
 SEC GERAL

40
 45
 25

VALOR DO CONVÊNIO	Cr\$ 70.000.000
PARCELA Nº 1	Cr\$ 45.000.000
VALOR LIBERADO ATÉ	20.000.000
VALOR A SER LIBERADO	5.000.000
PARCELA Nº 2	Cr\$ 15.000.000

1.º
 2.º
 3.º
 4.º
 5.º
 6.º
 7.º
 8.º
 9.º
 10.º
 11.º
 12.º
 13.º
 14.º
 15.º
 16.º
 17.º
 18.º
 19.º
 20.º
 21.º
 22.º
 23.º
 24.º
 25.º
 26.º
 27.º
 28.º
 29.º
 30.º
 31.º
 32.º
 33.º
 34.º
 35.º
 36.º
 37.º
 38.º
 39.º
 40.º
 41.º
 42.º
 43.º
 44.º
 45.º
 46.º
 47.º
 48.º
 49.º
 50.º
 51.º
 52.º
 53.º
 54.º
 55.º
 56.º
 57.º
 58.º
 59.º
 60.º
 61.º
 62.º
 63.º
 64.º
 65.º
 66.º
 67.º
 68.º
 69.º
 70.º
 71.º
 72.º
 73.º
 74.º
 75.º
 76.º
 77.º
 78.º
 79.º
 80.º
 81.º
 82.º
 83.º
 84.º
 85.º
 86.º
 87.º
 88.º
 89.º
 90.º
 91.º
 92.º
 93.º
 94.º
 95.º
 96.º
 97.º
 98.º
 99.º
 100.º

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 32/84

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

DE ARTEFATOS DE CONCRETO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Mercadoria adquirida conforme nota fiscal nº 029 629 da firma Metalúrgica Ervino Menezes - Jaraguá Sul S.C.	G1	-	12.098.612			
- Comercial Senil - A. Arag. nº da N. Fiscal 0187	Gb	-	1.300.000			
- Macil - R. D. Pedro II A. Arag. N. Fiscal - nº 01	Gb	-	1.030.000			
- Encial Minas - A. Arag. N. Fiscal nº 0759	Gb	-	544.708			
- Mad. Sta. Monica - A. Arag. N. Fiscal nº 01313	Gb	-	1.226.680			
- Comercial Minas - A. Arag. N. Fiscal nº 17229	Gb	-	100.000			
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE R

- Falta prestação de contas de R\$ 5.000

- Saldo será p/ const. do barracão

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (R\$)

Cr\$ 25.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$ 22.500,00

VALOR A SER LIBERADO:

PARCELAS 2.500,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 25.000,00

TSC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SEC. TSC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 22/84

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/85

ARTEFATOS DE CONCRETO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TERMINO: 02/05/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
- Pedro Alberto Resende	Gb	-	1.200.000			
<u>TOTAL</u>			17.500.000			
2- BARRACÃO P/ ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS (10 x 30)						
2.1- Esteios de arameira	pc	30,0	1.080.000	100		
2.2- Vigamento e tesoura	m ²	300,0	4.238.000	100		
2.3- Cobertura com telha C.A. 6mm	m ²	300,0	7.161.000	100		
<u>TOTAL</u>			29.979.100	100		
<u>TOTAL</u>						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

OBRA CONCLUÍDA

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário GERAL

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 25.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 22.500.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 2.500.000

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 25.000.000

VALOR DO COM Cr\$

TSC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 33/

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL -

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

BAIRRO: GABIROBA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 10/10/84

TÉRMINO: 10/10/85

Nº DE DIAS: 305

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01- Serviços Preliminares	m ²	1.500	715.500	100	
02- Escavação manual	m ³	26	186.134	100	
03- Fundação tijolo maciço	m ³	18,40	3.358.055	100	
04- Fundação baldramas	m ³	4,60	721.730	100	
05- Alvenaria tijolo furado	m ²	345,0	5.117.730	100	
06- Reaterro entre baldramas	m ³	66,0			
07- Estrutura (pilares, vigas)	m ³	4,08	1.045.059	100	
08- Madeiramento	m ²	220,77	2.430.280	70	1.041.548 30
09- Cobertura G.A. 6mm	m ²	220,77	3.683.846	70	1.580.933 30
10- Instalações	mb	-		-	1.800.866 100
11- Revestimento	m ²	690		-	3.104.433 100
12- Piso	m ²	220,77		-	4.585.837 100
13- Pintura (calçação)	m ²	690,0		-	1.014.333 100
TOTAL			17.263.334	56	11.127.815 44

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

- Terreno - (30 x 50) m

- Obra em andamento normal

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 15.000.000

PARCELAS (%) Cr\$ 13.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ -

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 13.000.000

Cr\$ 2.000.000

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FIS.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 171/84

MUNICÍPIO: ALTO-GARÇAS

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

DO POSTO TELEFÔNICO DE ALTO-GARÇAS - MT

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 09/10/84

TÉRMINO: 09/02/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Serviços Preliminares	m ²	400,0	200.000	100		
02- Fundação com tijolo maciço	m ³	21,92	1.618.000	100		
03- Estrutura-concreto	m ³	8,10	598.100	100		
- Estrutura-forma	m ²	111,90	814.000	100		
- Estrutura-ferragens	kg	844,00	590.800	100		
04- Alvenaria de tijolo maciço 1/2vz	m ²	136,00	2.640.000	100		
05- Contra-piso	m ²	52,57	365.000	100		
06- Inst. hid. elé. e esgoto	ud	-	900.000	100		
07- Cobertura canaleta 90	m ²	108,6	2.962.000	100		
08- Esquadrias metálicas	m ²	6,14	423.660	100		
09- Revestimento reboco	m ²	620,00	3.654.000	100		
Revestimento azulejo	m ²	17,48	270.940	100		
Revestimento cerâmica	m ²	9,18	102.816	100		
10- Piso - paviflex	m ²	34,65	763.547	100		
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA: ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$

PARCELAS (%)

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO(

PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. DISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 171/85

MUNICÍPIO: ALTO-GARÇAS

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

DO POSTO TELEFÔNICO DE ALTO-GARÇAS - MT

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 09/10/84

TÉRMINO: 09/02/85

Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
- Piso cerâmica	m ²	25,34	285.800	100		
11- Vidro tipo fantasia	m ²	1,08	27.800	100		
12- Pintura latex	m ²	287,17	971.495	100		
- Pintura esmalte	m ²	23,89	114.672	100		
13- Urbanização calçada	m ²	61,00	687.700	100		
- Urbanização muro	m ²	74,00	688.200	100		
- Urbanização Brita	m ²	230,00	331.000	100		
- Urbanização grama	m ²	83,00	224.100	100		
TOTAL			19.233.956	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA - -
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra Concluída

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 15.000.000
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 10.000.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 5.000.000

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 15.000.000

TEC. RESP. *M. Nunes*

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC. *L*

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 35/84

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - 2ª FASE

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO:

TÉRMINO:

Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Madeiramento p/ cobertura c/ telhas C.A.	m ²	235,55	2.991.013	100		
02- Coberturas c/ telhas C.A. 6mm	m ²	235,55	5.622.578	100		
03- Pratebanda	m ²	40,38	598.996	100		
04- Esquadrias de ferro tipo veneziana	m ²	46,0	3.594.348	100		
05- Esquadrias de ferro chapa dobrada	m ²	25,00	1.812.000	100		
06- Instalações	ud	-	-	-	3.800.000	100
07- Louças e aparelhos	ud	40,0	-	-	6.630.000	100
08- Pintura	m ²	1.100	-	-	6.380.000	100
TOTAL			14.618.935	46	16.810.000	54

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
 ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Obra em andamento

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$ 15.000.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATE

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO(

PARCELAS Cr\$ 13.000.000

TOTAL ACUMULADO

Cr\$ 13.000.000

TEC. REC.

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 35/84

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - 2ª FASE

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

INÍCIO:

TÉRMINO:

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Madeiramento p/ cobertura c/ telhas C.A.	m ²	235,55	2.991.013	100		
02- Coberturas c/ telhas C.A. 6mm	m ²	235,55	5.622.578	100		
03- Pratebanda	m ²	40,38	598.996	100		
04- Esquadrias de ferro tipo veneziana	m ²	46,0	3.594.348	100		
05- Esquadrias de ferro chapa dobrada	m ²	25,00	1.812.000	100		
06- Instalações	ud	-	-	-	3.800.000	100
07- Louças e aparelhos	ud	40,0	-	-	6.630.000	100
08- Pintura	m ²	1.100	-	-	6.380.000	100
TOTAL			14.618.935	46	16.810.000	54

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Obra em andamento

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 15.000.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 13.000.000

TOTAL ACOMPANHADO Cr\$ 13.000.000

SEC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 27/01/82

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA

PROJETO: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV. FREI SERVÁCIO

CONVÊNIO ADPC Nº 178/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: ENGEº EDMILSON FORTES BARRETO

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13.10.81
TÉRMINO: 13.02.82
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
D1 - Regularização e Nivelamento	m ²	1.110,05	88.882,90	50,60	86.505,00	49,40
D2 - Assentamento das Lajotas Sextavadas	m ²	1.110,05	811.197,10	50,60	789.495,00	49,40
TOTAL			900.080,00	50,60	876.000,00	49,40

ANDAMENTO DA OBRA: Esta obra está sendo executada na Avenida Frei Servácio, compreendendo os seguintes trechos:

- Entre a Rua Marechal Deodoro até 19,00m da Praça
 $13,10 \times 19,00 + 13,10 \times 2,5 = 281,65 \text{ m}^2$ - (Executado)
- Entre a Rua Marechal Deodoro
 $10,60 \times 26,50 = 280,90 \text{ m}^2$ - (Executado)
- Entre Antonio João/Ponte de Concreto
 $13,10 \times 41,80 = 547,50 \text{ m}^2$ - (Em execução)

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 13.10.81 Cr\$ 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 900.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 100.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 08/03/82

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA

PROJETO: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS


CONVÊNIO ADPC Nº 178/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/10/81
TÉRMINO: 13/02/82
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
0.1 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.110,0	175.387,00	100	-	-
0.2 - Aquisição e assentamento lajotas	m ²	1.110,0	811.197,00	53	704.495,00	47
0.3 - Acabamento geral	m ²	1.110,0	-	-	85.000,00	100
TOTAL			986.584,00	55	789.495,00	45

ANDAMENTO DA OBRA:

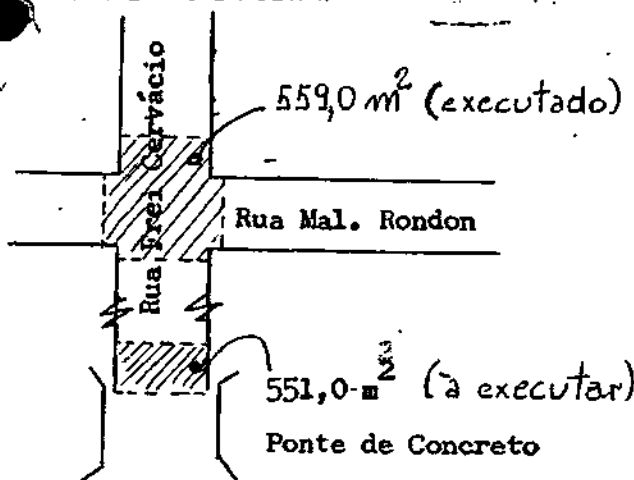

Obra paralizada (aguardando a execução de lajotas).

Executado 55 % da obra.

Aplicado 98 % do recurso do Convênio
Conforme boletim Dez/81.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 13/10/81 Cr# 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -XXXXXXXXXX-

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. N.º 1.º



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 178/81

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA / MT

RELATÓRIO Nº 881/84

PROJETO: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 25/06/84

EXECUTOR: ADM. DIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 13/10/81

TÉRMINO: 13/02/82


Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGR HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01) Preparo e marcação do leito	M2	1.110,0	175.387,00	100		
02) Aquisição e assentamento de lajotas	M2	1.110,0	1.515.692,00	100		
03) Acabamento Geral	M2	1.110,0	85.000,00	100		
TOTAL			1.776.079,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Obra concluída

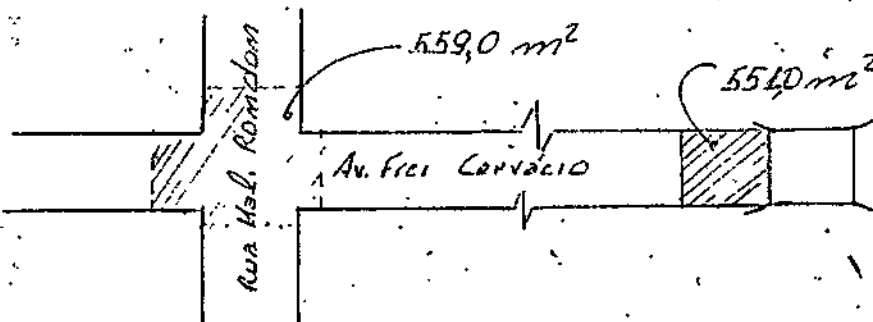

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00

PARCELAS (%) VALOR LIBERADO ATÉ 13/10/81 Cr# 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

GUIABA 05/07/84

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 178/81


OBRA: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS

Aos 25 dias do mês de Junho do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 178/81, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA / MT em 13 / 10 / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 05 de Julho de 1984


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal de Pedra Preta / MT

Diretor de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 178/81

Objetivo : CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS

Aos 13 dias do mês de Setembro do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 178/81, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA / MT em 13 / 10 / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.


Cuiabá, 19 de setembro de 1.984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA / MT

De acordo:



DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 178/81

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT.

RELATÓRIO Nº 02/84

PROJETO: CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 13/09/84


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 13/10/81
TÉRMINO: 13/02/82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.110,0	175.387,00	100		
02 - Aquisição e assentamento de lajota	m ²	1.110,0	1.515.692,00	100		
03 - Acabamento geral	m ²	1.110,0	85.000,00	100		
TOTAL			1.776.079,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, etc.

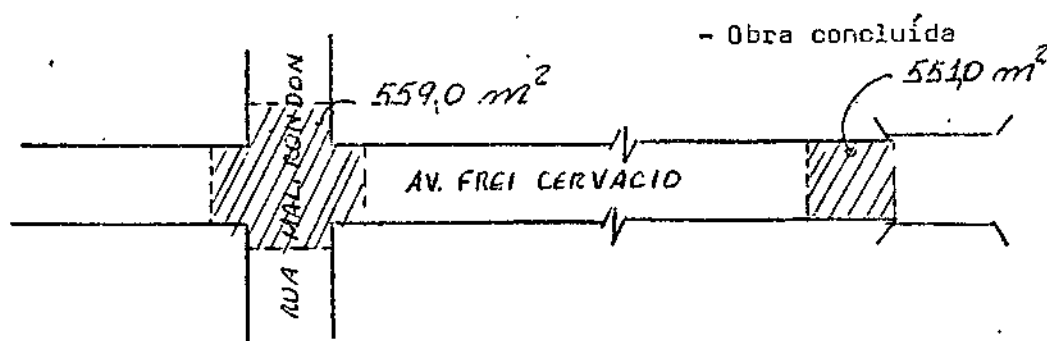

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 13/10/81 Cr# 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO Cr# -

TEC. RESR

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

19.09.84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 27/01/82

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA AV. PRESIDENTE

CONVÊNIO ADPC Nº 201/81

MÉDICI

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 07.12.81
TÉRMINO: 07.04.82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL: ENGEº EDMILSON FORTES BARRETO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr#	VALOR	Cr#	VALOR
01 - Regularização e Nivelamento (780x2,00)2	m ²	3.120,0		295.776,00	60,0	197.184,00
02 - Execução da Calçada (780x20)2	m ²	3.120,0		432.000,00	19,30	1.814.000,00
TOTAL				727.776,00	26,60	2.011.184,00

ANDAMENTO DA OBRA: Obra em andamento. Foi executado até a presente data 600m² de calçada de dimensão (300x2) e 60% da Regularização. Esta fiscalização solicitou a colocação da placa que não se encontrava no local da obra. Após esta solicitação, foi constatada que a mesma se encontra em fase de conclusão numa casa de Pintura da cidade.

Obs: Liberado Cr\$ 300.000,00 através da C.F. nº 021/82, em 10/1/82.
Saldo = Cr\$ 700.000,00.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.000.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: _____

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA AV. PRESIDENTE

CONVÊNIO ADPC Nº: 201/81

MEDICI

EXECUTOR:

FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO


INÍCIO: 07/12/81

TÉRMINO: 07/04/82

Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Regularização e nivelamento do terreno	m ²	2.620,0	410.844,00	100	-	-
0.2 - Compactação e colocação de juntas	m ²	2.620,0	273.896,00	100	-	-
0.3 - Execução de calçada	m ²	2.620,0	2.054.220,00	100	-	-
TOTAL			2.738.960,00	100	-	-

ANDAMENTO DA OBRA:



CONTACTO

Engº Claudio de Almeida C. Filho

Const. Valter M. Medeiros

Executado 100 % da obra

Aplicado 100 % dos recursos

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr\$ 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

18.02.82

Cr\$ 1.300.000,00

VALOR A SER LIBERADO:

Cr\$ 700.000,00

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 2.000.000,00


VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$ - XXXXXXXXX -

TEC. RESP.

[Signature]

[Signature]



CONVENIO ADPC Nº 76/84

RELATÓRIO Nº 001/84

DATA DA INSPEÇÃO 25/06/84

PRAZO DE EXECUÇÃO			
-------------------	--	--	--

INÍCIO: 02/05/84


TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
TOTAL						

LIBERADO	% DO RECURSO DO CONVÊNIO.	EXECUTADO	% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI		QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.	

- Aguarda Trator Esteira
- Aproximadamente 15 dias p/ início da execução

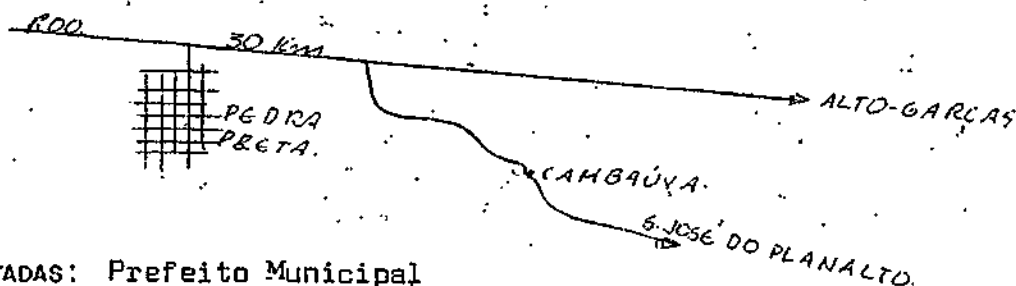

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 10.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/84 Cr\$ 4.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(____PARCELA)Cr\$_____

TOTAL ACUMULADO: Cr# 4.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:	Cr\$ 6.000.000,00
--------------------	-------------------

TEC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 05/07/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

CONVENIO ADPC Nº 182/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CONST. PONTES DE MADEIRA - CAMBAÚVA-22m ,

DATA DA INSPEÇÃO 06/12/84

PETROVINA-12m, JORIGUE- 32m, BIRRO- 16m, ÁGUA CLARA-
9m e SANTA BARBARA - 10m.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 26/10/84
TÉRMINO: 26/12/84
Nº DE DIAS: 60

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - <u>CÓRREGO CAMBAÚVA - 22,0m</u>						
1.1 - Troca de long.trav.e tesoura	m	118,00	3.068.000,	100		
1.2 - 50% do assoalho	m ²	49,50	3.762.000,	100		
1.3 - Corre mão	m	22,0	506.000,	100		
1.4 - Rodeiro	m	44,0	770.000,	100		
02 - <u>CÓRREGO PETROVINA - 12,0m</u>						
2.1 - Rec. troca de trav.e long.	m	66,0	1.716.000,	100		
2.2 - Assentamento de assoalho	m ²	54,0	4.104.000,	100		
2.3 - Rodeiro e rodapé	m	48,0	840.000,	100		
03 - <u>CÓRREGO JORIGUE - 32,0m - CONSTRUÇÃO</u>						
3.1 - Fundação com concreto	m ³	15,60	1.170.000,	100		
3.2 - Colocação de esteios, travessieiros e longarinas	m	296,00	7.696.000,	100		
TOTAL			53.776.000,			15

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 30.000.000,
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 22.500.000,

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ 7.500.000,

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 30.000.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - - -

TEC. RESR

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA: 12/12/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 182/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - Mt.

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONST. PONTES DE MADEIRA - CAMBAÚVA - 22m

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/85

PETROVINA- 12m, JORIGUE- 32m, BIRRO- 16m, ÁGUA CLARA- 9m e SANTA BARBARA - 10m.

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 26/10/84

TÉRMINO: 26/12/84

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.3 - Assentamento de assoalho	m ²	144,00	10.944.000,	100		
3.4 - Rodeiro e rodapé	m ²	128,00	2.240.000,	100		
3.5 - Caixaão de aterro	m	240,00	3.700.000,	100		
04 - Córrego BIRRO - 16m - REFORMA	m ³	8,64	1.396.200,	100		
- CONSTRUÇÃO	m ³	148,0	2.692.800,	100		
- CONSTRUÇÃO	m ³	12,0	2.692.800,	100		
05 - Córrego ÁGUA CLARA - 7,0m	m ³	64,0	897.600,	100		
5.1 - Fundação com concreto	m ³	84,0	897.600,	100		
5.2 - Colo. esteios, trav. vigamento	m	5,20	390.000,	100		
5.3 - Assentamento de assoalho	m ²	68,00	1.768.000,	100		
5.4 - Rodeiro e rodapé	m ²	31,50	2.394.000,	100		
5.5 - Caixaão de aterro	m	28,0	616.000,	100		
06 - Córrego SANTA BARBARA - 6,0m	- CONSTRUÇÃO	116,00	1.788.000,	100		
6.1 - Fundação com concreto	m ³	5,10	382.500,	100		
6.2 - Cbloc. esteios, trav. long.	m ²	56,0	1.456.000,	100		
6.3 - Assentamento de assoalho	m ²	27,0	2.052.000,	100		
6.4 - Rodeiro e rodapé	m ²	24,0	528.000,	100		
6.5 - Caixaão de aterro	m ²	84,0	1.294.000,	100		
TOTAL			62.160.500,	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 30.000.000,
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 30.600.000,

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ 7.500.000,

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 30.000.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TSC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 12/12/84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 182/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - CAMBAÚVA-22m

DATA DA INSPEÇÃO 06/12/84

PETROVINA - 12m, JORIGUE - 32m, BIRRO - 16m, ÁGUA CLARA - 9m, e SANTA BÁRBARA - 10m.

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 26/10/84

FISCAL: Enge HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

TÉRMINO: 26/12/84

Nº DE DIAS: 60

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Córrego CAMBAÚVA - 22,0 m						
1.1- Troca de long., trav., e tesoura	m	118,00	3.068.000	100		
1.2- 50% do assoalho	m ²	49,50	3.762.000	100		
1.3- Corre-mão	m	22,0	306.000	100		
1.4- Rodeiro	m	44,0	770.000	100		
02- Córrego PETROVINA - 12,0 m						
2.1- Rec. troca de trav. e long.	m	66,0	1.716.000	100		
2.2- Assentamento de assoalho	m ²	54,0	4.104.000	100		
2.3- Rodeiro e rodapé	m	48,0	840.000	100		
03- Córrego JORIGUE - 32,0m construção						
3.1- Fundação com concreto	m ³	15,60	1.170.000	100		
3.2- Colocação de est. trav. e long.	m	296,00	7.696.000	100		
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ANUAL. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$

VALOR LIBERADO, ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO:

PARCELA Cr\$

TOTAL ACUMULADO

Cr\$

TCC RESP

PREFEITO MUNICIPAL

CH 505

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 182/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONST. PONTES DE MADEIRA - CAMBAÚVA - 22m,

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/85

PETROVINA - 12m, JORIGUE - 32m, BIRRO - 16m, ÁGUA CLARA - 9m, e SANTA BÁRBARA - 10m.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/10/84

TÉRMINO: 26/12/84

Nº DE DIAS: 60

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
3.3- Assentamento de assoalho	m ²	144,00	10.944.000	100		
3.4- Rodeiro e rodapé	m	128,00	2.240.000	100		
3.5- Caixaão de aterro	m ²	240,00	3.708.000	100		
04- CORREGO BIRRO - 16m - Reforma						
4.1- Fundação com concreto	m ³	8,64	1.795.200	100		
4.2- Coloc. Esteios, trav., vig.	m	148,0	2.692.800	100		
4.3- Assentamento de assoalho	m ²	72,0	2.692.800	100		
4.4- Rodeiro, rodapé	m	64,0	897.600	100		
4.5- Caixaão de aterro	m ²	84,0	897.600	100		
05- CORREGO AGUA CLARA - 7,0 m						
5.1- Fundação com concreto	m ³	5,20	390.000	100		
5.2- Coloc. Esteios, trav. vigamento	m	68,00	1.268.000	100		
5.3- Assentamento de assoalho	m ²	31,50	2.394.000	100		
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ

Cr\$

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$

TOTAL ACUMULADO

Cr\$

TSC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 182/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - RJ

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: CONST. PONTES DE MADEIRA - CAMBAÚVA - 22 m;

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/85

PETROVINA - 12m, JORIGUE - 32m, BIRRO - 16m, ÁGUA CLARA - 9m, e SANTA BÁRBARA - 10m.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 26/10/84

TÉRMINO: 26/12/84

Nº DE DIAS: 60

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
5.4- Rodeiro e rodapé	m	28,0	616.000	100		
5.5- Caixaão de aterro	m ²	116,00	1.788.000	100		
06- CORREGO SANTA BÁRBARA - 6 m						
6.1- Fundação em concreto	m ³	5,10	382.500	100		
6.2- Coloc. esteios, trav. long.	m	56,0	1.456.000	100		
6.3- Assentamento de assoalho	m ²	27,0	2.052.000	100		
6.4- Rodeiro e rodapé	m	24,0	528.000	100		
6.5- Caixaão de aterro	m ²	84,0	1.294.000	100		
TOTAL			62.160.500	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA: ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Pontes Concluídas

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 30.000.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 30.000.000

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 30.000.000

TSC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET 0100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 141/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS - 2.500m²

DATA DA INSPEÇÃO 13/09/84


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 01/09/84
TÉRMINO: 01/09/85
Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
- Rua 14 de julho	m ²	1.890,0	1.226.988,00	10	11.042.892,00	90
- Rua Otávio Pitaluga	m ²	900,0	584.280,00	10	5.256.520,00	90
- Rua Mal Rondon	m ²	981,0	536.216,00	10	5.725.944,00	90
TOTAL			2.447.484,00	10	22.027.356,00	90

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

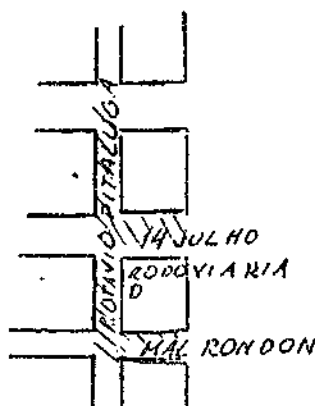

- Calçamento com brokret,
- Adquirido máquina para a fabricação do brokret
- Em fase de execução os serviços
- Foram executados 800ml de meio-fio e sarjeta
- Adquirido 300 sacas de cimento
- Adquirido 200 m³ de areia
- Adquirido 200 m³ brita

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 20.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 3.500.000,00

VALOR A SER LIBERADO Cr# 16.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 16.500.000,00

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.

18/09/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 76/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT.

RELATÓRIO Nº 03/84

PROJETO: ALARGAMENTO E MELHORAMENTO DA ESTRADA

DATA DA INSPEÇÃO 07/12/84

CAMBAÚVA COM 30, Km de extensão.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 365

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01) - Conformação da pista para revestimento em serviço de restauração	m ²	210.000,	2.142.000,	60	1.428.000,	40
02) - Patrolamento	m ²	210.000,	1.512.000,	60	1.008.000,	40
03) - Escavação, carga, transporte e espalhamento material de 1ª categoria	m ³	25.000,	17.237.500,	50	17.237.500,	50
04) - Escavação de valetas, canais e valas	m ³	2.000,	26.336.000,	50	26.336.000,	50
TOTAL			47.227.500,	51	46.009.500,	49

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Obra em andamento normal, já executados
14 Km do trecho previsto.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário da Prefeitura

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 10.000.000,
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 9.000.000,

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ 1.000.000,

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 10.000.000,

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ -

TSC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/12/84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVÊNIO ADPC Nº 76/84

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA - MT

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: ALARGAMENTO E MELHORAMENTO DA ESTRADA

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/85

CAMBAÚVA COM 30, Km DE EXTENÇÃO.

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: ENGº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Conformação d apista para revestimento em serviço de restauração.....	m ²	210.000	2.142.000	60	1.1428.000	40
0.2 - Patrolamento.....	m ²	210.000	1.512.000	60	1.008.000	40
0.3 - Escavação, carga, transporte e espalhamento material de 1ª categoria.....	m ³	25.000	17.237.500	50	17.237.500	50
0.4 - Escavação de valetas, canais e valas.....	m ³	21000	26.336.000	50	26.336.000	50
TOTAL			47.227.500	51	46.009.500	49

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA. ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

OBS: Obra já executadas 14 Km do trecho.

Obra paralizada(motivo chuvas) já foram executados 14 Km dos 30 Km previstos.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário do Prefeito

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 10.000.000

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATE Cr\$ 10.000.000

VALOR A SER LIBERADO(PARCELAS) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO Cr\$ 10.000.000

TEC RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº 2/85

MUNICÍPIO: PEDRA PRETA MT

RELATÓRIO Nº 1/85

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO MUNICÍPIO

DATA DA INSPEÇÃO 4/ /85

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 2 / 2/85

TÉRMINO: 25 / 2/85

Nº DE DIAS: 35

FISCAL: Eng.º MAURI CORRÊA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Serviços Preliminares	m2	400,00	2.000.000	100		
02 Fundação	m3	21,92	1.10.000	100		
03 Estrutura	m3	8,10	.002.800	100		
04 Alvenaria	m2	13,00	2.40.000	100		
05 Piso	m2	52,87	1.413.547	100		
06 Cobertura	m2	108,00	2.370.000	100		
07- Esquadria	m2	,14	923,600	100		
08 Revestimento	m2	654,	5.791.35	100		
09- Vidro	m2	1,08	127.800	100		
10 Pintura	m2	311,00	2.38.17	100		
11- Instalações	Vb		1.900.000	100		
12 Urbanização	m2	500,00	1.322.040	40	1.983.000	0
13- Serviços complementares	Vb	-	-		2.800.000	100
TOTAL			28.498.589		4.483.000	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- OBRA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO

PESSOAS CONTACTADAS: PREFEITO MUNICIPAL

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 30.000.000

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 15.000.000

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ 15.000.000

TOTAL ACUMULADO

CR\$ 30.000.000

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ 0.000.000

TIC. RES.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 12/06/85

DATA DA
19-06-81

(CONVENIO ADPC N° 51/81

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO	22-05-81
TÉRMINO	22-11-81
Nº DE DIAS	180

SALDO DO CONTRATO, Cdt 750.000,00

714 M1 3, P1

read + more

Figure 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

4º

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 23/11/81

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

CONVÊNIO ADPC Nº 51/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.05.81
TÉRMINO: 22.11.81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Alvenaria c/tijolos cerâmicas	m ²	91,20	108.800,00	100		
02 - Reboco paulista	m ²	182,40	77.520,00	100		
03 - Esquadrias de madeira	vb	4,00	28.000,00	100		
04 - Esquadrias de ferro	vb	4,00	32.600,00	100		
05 - Madeiramento de telhado	m ²	110,40	170.016,00	100		
06 - Subst. de telhas	m ²	110,40	120.600,00	100		
07 - Subst. do forro de madeira	m ²	110,40	176.000,00	100		
08 - Contra piso,	m ²	41,10	81.360,00	100		
09 - Pintura	m ²	201,60	357.900,00	100		
10 - Inst. Hid. elétrica, esgoto	vb	-	150.000,00	100		
11 - Serviço comp. limpeza	vb	-	200.000,00	100		
TOTAL		-	1.502.796,00	100		

ANDAMENTO DA OBRA: Executado 100% da Obra
Parcelas 50%, 40%, 10%
4º Relatório
Contato: Hélio Duarte Vilela
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 07.08.81 Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# 150.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

REC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SECT. FISC.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: _____

MUNICÍPIO: TESOURO.

PROJETO: REFORMA DO PRÉDIO

CONVENIO ADPC Nº 51/81

DA PREFEITURA

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22-05-81

TÉRMINO: 22-11-81

Nº DE DIAS: 180.

FISCAL ENRº CIVIL HELIO NUNES DE OLIVEIRA F.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. Alvenaria c/ tijolos cerâmicos	mt	91,20	108.800,00	100	—	—
02. Reboco paulista	mt	182,40	38.760,00	50	38.760,00	50
03. Esquadrias de madeira	ud	4,00	—	—	28.000,00	100
04. Esquadrias de ferro	ud	4,00	16.300,00	50	16.300,00	50
05. Madeiramento do telhado	mt	110,40	170.016,00	100	—	—
06. Substituição de telhas	mt	110,40	120.600,00	100	—	—
07. Subst. comp. ferro madeira	mt	110,40	176.000,00	100	—	—
08. Contra piso e piso	mt	41,10	67.800,00	80	13.560,00	20
09. Pintura	mt	201,60	307.000,00	86	50.900,00	14
10. Inst. hid. elet. esgoto	vb	—	—	—	150.000,00	100
11. Serv. comp., limpeza	ob	—	—	—	200.000,00	100
TOTAL			1.005.276,00	660	497.520,00	34

ANDAMENTO DA OBRA:

Aplicado 670% do valor do convênio
Executado 66% da obra

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 07/10/81 Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. G. FISC.

29

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 07.08.81

MUNICÍPIO: TELSUKO

PROJETO: Reforma do Prédio da Prefeitura

CONVÊNIO ADPC Nº 31/81

EXECUTOR: Administração Direta

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.05.81

TÉRMINO: 22.11.81

Nº DE DIAS: 180

FISCAL ENGº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
0.1 - Alvenaria c/ tijolos cerâmicos	m ²	91.20	54.400,00	30	54.400,00	30
0.2 - Reboco Paulista	m	182.40	-	-	77.520,00	100
0.3 - Esquadria de Madeira	ud	4.00	-	-	28.000,00	100
0.4 - Esquadria de Ferro	ud	4.00	-	-	32.600,00	100
0.5 - Madeira do Telhado	m ²	110.40	85.008,00	30	85.008,00	30
0.6 - Substituição de Telhas	m ²	110.40	120.500,00	100	-	-
0.7 - Substituição de Forro de Madeira	m ²	110.40	176.000,00	100	-	-
0.8 - Contra Piso e Piso	m ²	41.10	13.560,00	20	67.800,00	80
0.9 - Pintura	m	201.50	307.000,00	60	200.900,00	80
10.0 - Serv. Comp. e Limpeza	Vb	-	-	-	200.000,00	100
11 - Inst elet.	-	-	-	-	-	-
12 - " hid.	-	-	-	-	-	-
TOTAL			756.568,00	51	746.228,00	49

previsto p/ 30/11/81

ANDAMENTO DA OBRA:

{} Serviços em andamento
Contacto: Luiz da Silva
Const.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 22/05/81 Cr\$ 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 550.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 550.000,00

TÉCNICO

TÉCNICO

Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO Nº 51/81


OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Aos 23 dias do mês de Novembro do ano de 1.981, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de 51/81, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOURO em 22 / 01 / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 11 de Dezembro de 19 81


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal TESOURO

Diretor de Operações

01 IDENTIFICAÇÃO:

MUNICÍPIO:

Tesoouro-MT

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

Colçamento de Ruas

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/5/81

TERMINO: 22/11/82

Nº DE DIAS: 540

02 FONTES DE RECURSOS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
F.P.E	750	50	750				
"	600	40		600			
"	150	10					
					150		
TOTAL GERAL	1.500	100	750	600	150		

03 ORIGEM DO PROJETO: CODEMAT ☐PREFEITURA ☒OUTROS ☐

04 TERMO ADITIVO:

ALTERA:

(*)

PRAZO ☒

(**)

OBJETIVO ☒VALOR ☐

(Cr\$ 1.000,00)

FONTES	TOTAL	%	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO-PARCELAS				
			I	II	III	IV	V
TOTAL GERAL		100					

05 OBSERVAÇÕES/ALTERAÇÕES: (*); (**)

(*) Termo Aditivo alterando o prazo do Convênio + 360 dias.

(**) Altera objetivo do convênio para o calçamento de calçadas na Rua Humberto marcelio - sede com 1800 m²

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ADPC Nº 52/81

TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO -
MT.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 1.982 ,
na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrati
vo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen
to do Estado de Mato Grosso, doravante apenas denominada CODEMAT, ,
neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, OSVALDO DE OLI -
VEIRA FORTES, e pelo Diretor de Operações, MARIO GOMES MONTEIRO, e
de outro lado a Prefeitura Municipal, neste ato representada pelo ,
seu Prefeito HÉLIO DUARTE VILELA, que, estando entre si justas e
convencionadas deliberam firmar o presente Aditivo ao Convênio ADPC/
Nº 52/81, regenciado pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objetivo modificar as
Cláusulas Primeira e Quinta do Convênio ADPC Nº 52/81, que passam a
ter as seguintes redações:

"CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é o Calçamento de Calçadas
na Rua Humberto Marcílio (sede) com 1.800 m2 (um mil e oitocentos ,
metros quadrados), no Município de Tesouro-MT.

CLAUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura".

CLÁUSULA SEGUNDA

Continuam em vigor e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Convênio ADPC Nº 52/81, tal como se acham redigidas, exceto no que contrarie este documento, integrando-se a elas o presente Termo, independentemente de transcrição.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo, para um só, efeito de direito em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 24 de agosto de 1.982

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

Diretor Presidente

HELIO DUARTE VILELA

Prefeito Municipal de
Tesouro-MT

CIC Nº: 077.460.019-44

MARIO GOMES MONTEIRO

Diretor de Operações

T E S T E M U N H A S:

1. _____

2. _____

JUSTIFICATIVA

Com relação ao Convênio ADPC nº 52/81, informo, que o pedido de mudança no Objetivo se prende ao seguinte aspecto:

1. Foi executada os bloques na espessura inferior à exigida para o tráfego, 6cm e não 10cm, independente da orientação da fiscalização.
2. A pavimentação da Rua Humberto Marcellino ainda não foi iniciada.
3. Tal solicitação foi acerta entre o fiscal da área e o Sr. Prefeito Municipal.
4. Devem ser executados 1.800,0 m² de pavimentação de calçadas equivalentes ao calçamento de ruas, previsto, na época da assinatura do convênio.

Cuiabá, 23 de Agosto de 1982.


HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Téc. Resp. - Setor de Fisc.

Vistos:

OSVALDO JOSÉ DA COSTA
Chefe da Divisão de Projetos



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09-03-82

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22-05-81
TÉRMINO: 22-11-81
Nº DE DIAS: 180

FISCAL ENG. CIVIL - Humberto de Azevedo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e execução de laje	m²	1800,0	560.000,00	24,0	183.994,00	76,0
02 - Arg. arenil. de lajotas	m²	1800,0	168.000,00	15,0	992.000,00	85,0
03 - Arg. arenil. de meio fio	m²	180,0	62.000,00	7,0	108.000,00	93,0
04 - Acabamento geral	up	—	—	—	75.000,00	100
TOTAL			286.000,00	17	1.358.994,00	83

ANDAMENTO DA OBRA:

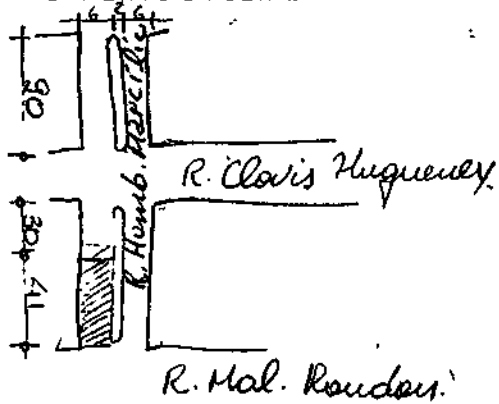

Estão em execução as
lajotas retangulares.
Foi alertado o construtor
e o P. Municipal qd a
espessura da lajota (6 cm)

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23-11-81 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ —X—

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. SET. FISC.

EXERCÍCIO D. CAUDINHA - CASCALHINO
D. Dirce - do Brasil 440 - Bairro Vento
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
240

APÓIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
RECEITA 190681

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS.

CONVÊNIO ADIC N° 52/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO 22-05-81
TÉRMINO 22-11-81
Nº DE DIAS 180

FISCAL HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cré VALOR	%	Cré VALOR	%
Pavimentação com blokrat m²		1400,0				
TOTAL						

ANDAMENTO DA OBRA:

A obra ainda não foi iniciada.
Início previsto p/ julho/81.
Deverá ser pavimentada com
blokrat a rua HUMBERTO MARCÍLIO
em frente ao prédio da prefeitura.

VALOR DO CONVÊNIO: Cré

1500000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: Cré

750000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cré

TOTAL ACUMULADO: Cré

750000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cré

750000,00

ASSINATURA

A

PRELIMINAR

COPIA PARA

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 01/12/81

MUNICÍPIO: TESOURA

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

CONVÊNIO ADPC Nº 526


EXECUTOR: ADRIANISTARÇÃO NIPETA

FISCAL: HELIO DUNES DE OLIVEIRA

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 32-05-81
TÉRMINO: 22-11-81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR
01- Preparo e marcação do leito	m²	1800,0	—	—	239.994,00
02- Adoç. e assent. de lajotas	m²	1800,0	—	—	130000,00
03- Adoç. e assent. de meio fio	m	180,0	—	—	162000,00
04- Acabamento geral	vb	—	—	—	75.000,00
TOTAL					1776.994,00

ANDAMENTO DA OBRA:

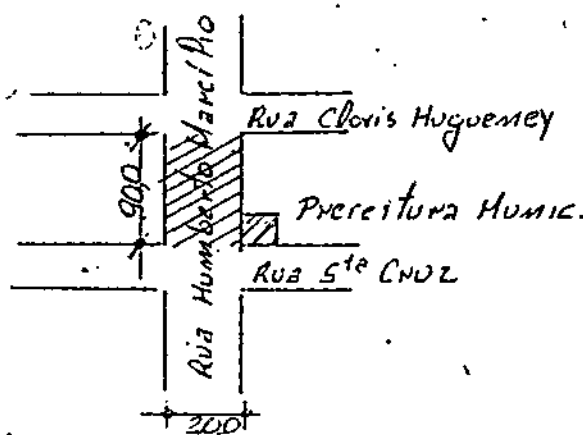

Início previsto p/ 15-08-81
Término " " 15-11-81
Calçamento = 18000 m²
Meio fio = 1800 m.
Contacto: Luiz da Silva.
Construtor.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 22/05/81 Cr\$ 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 750.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 750.000,00

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. M. T. S.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 05-10-81

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81


EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22-05-81
TÉRMINO: 22-11-81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. Preparo e marcação do leito	m²	18000	—		239.994,00	1000
02. Agris. assent. lajotas	m²	18000	140.000,00	10	1.160.000,00	900
03. Agris. assent. meio fio	ml	1800			162.000,00	1000
04. Acabamento geral	ob	—			75.000,00	1000
TOTAL			140.000,00	80	1.636.994,00	920

ANDAMENTO DA OBRA:

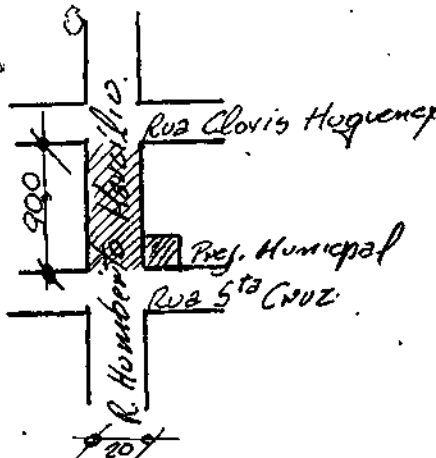

Estão sendo executadas as lajotas.
Calçamento - 18000 m²
Meio fio - 1800 ml.
Contacto: Luiz de Silva
Construtor.

PARCELAS - 50% 40% 10%

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 22/05/81 Cr\$ 750.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 750.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 750.000,00

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. GEN. FISC.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
 AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

4º

DEMONSTRAÇÃO

DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
 INSCRIÇÃO 23/11/81

MUNICÍPIO

PROJETO

DE RUAS

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81

EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL

HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
 INÍCIO: 22.05.81
 TÉRMINO: 22.11.81
 Nº DE DIAS: 180

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparação do leito	m ²	1.800,0	119.997,00	50	119.997,00	50
02 - Aquilatação de lajotas	m ²	1.800,0	650.000,00	50	650.000,00	50
03 - Aquilatação de meio-fio	m	180,0			162.000,00	100
04 - Acabamento	vb	-			75.000,00	100
TOTAL			769.997,00	71	302.000,00	29

ANDAMENTO

Executadas aproximadamente 6000 (seis mil) lajotas.

Parcelas 50%, 40%, 10%

4º Relatório

Aplicado 51% do valor do Convênio

Executado 71% da Obra

Contato: Hélio Duarte Vilela - Prefeito Municipal

VALOR DO

Cr# 1.500.000,00

VALOR LIQUIDADO

Cr# 750.000,00

VALOR A PAGAR

Cr# 600.000,00

TOTAL A PAGAR

Cr# 1.350.000,00

SALDO DEVEDOR

Cr# 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SGT. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: Calçamento de Ruas

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81


EXECUTOR: Administração Direta

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/81
TÉRMINO: 22/11/81
Nº DE DIAS: 180

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.800,0	56.000,00	24	183.994,00	76
02 - Aquisição e Assentamento de lajotas	m ²	1.800,0	168.000,00	15	992.000,00	85
03 - Aquisição e Assentamento de meio-fio	ml	1.800,00	62.000,00	7	108.000,00	93
04 - Acabamento Geral	Vb	-	-		75.000,00	100
TOTAL			286.000,00	17	1.358.994,00	83

ANDAMENTO DA OBRA:

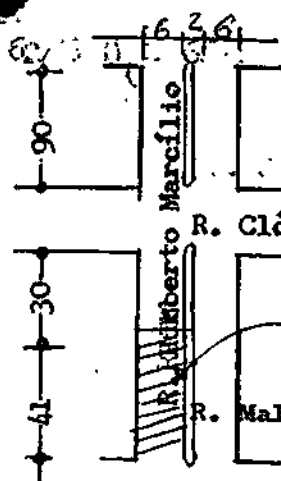

Estão em execução as lajotas sextavadas.

Foi alertado o Construtor e o Prefeito Municipal quanto à espessura da lajota (6 cm)

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81

Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO:

Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO:

Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO:

Calçamento de Ruas

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO


INÍCIO: 22/05/81

TÉRMINO: 22/11/81

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.800,0	56.000,00	24	183.994,00	76
02 - Aquisição e Assestamento de lajotas	m ²	1.800,0	168.000,00	15	992.000,00	85
03 - Aquisição e Assestamento de meio - fio	ml	1.800,00	62.000,00	7	108.000,00	93
04 - Acabamento Geral	Vb	-	-	-	75.000,00	100
TOTAL			286.000,00	17	1.358.994,00	83

ANDAMENTO DA OBRA:

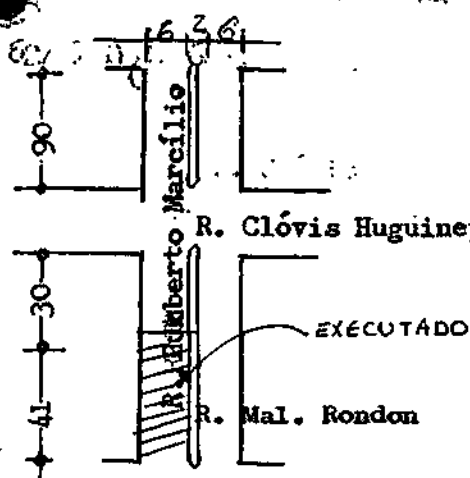

Estão em execução as lajotas sextavadas.

Foi alertado o Construtor e o Prefeito Municipal quanto à espessura da lajota (6 cm)

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr# 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81

Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO:

Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO:

Cr# 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

Cr# 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: Calçamento de Ruas

CONVÊNIO ADPC Nº 52/81


EXECUTOR: Administração Direta

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22/05/81
TÉRMINO: 22/11/81
Nº DE DIAS: 180

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação do leito	m ²	1.800,0	56.000,00	24	183.994,00	76
02 - Aquisição e Assentamento de lajotas	m ²	1.800,0	168.000,00	15	992.000,00	85
03 - Aquisição e Assentamento de meio fio	ml	1.800,00	62.000,00	7	108.000,00	93
04 - Acabamento Geral	Vb	-	-		75.000,00	100
TOTAL			286.000,00	17	1.358.994,00	83

ANDAMENTO DA OBRA:

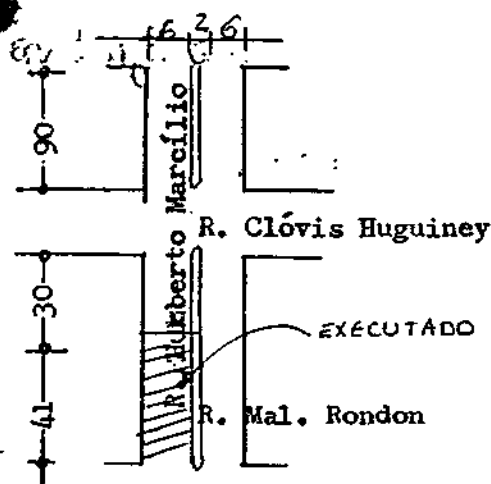

Estão em execução as lajotas sextavadas.

Foi alertado o Construtor e o Prefeito Municipal quanto à espessura da lajota (6 cm)

*Autarquia
26-05-82
Obra concluída
no terreno
atrasado da
cidade antiga*

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 1.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81 Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 03/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS PARA CALÇAMENTO DE CALÇADAS

DATA DA INSPEÇÃO 20.08.82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.05.82

TÉRMINO: 22.11.82

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 540

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo a marcação do leito	m ²	1.800,00			239.994,00	100
02 - Aquisição e assentamento de lajotas.	m ²	1.800,00			1.160.000,00	100
03 - Aquisição e a assentamento de meios-fios.	ml	1.800,00	85.000,00	50	85.000,00	50
04 - Acabamento geral	vb	1.800,00			75.000,00	100
Termo Aditivo assinado em 24.08.82 Prorrogando prazo e mudando objetivo.						
TOTAL			85.000,00	5	1.559.994,00	95

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 5 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Os blocos estão sendo retirados da rua para serem colocados nas calçadas, pois a espessura não suporta tráfego, execução da lajota, foi alertada a administração neste sentido, deverá fazer calçada na rua Humberto Marcílio.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 03.09.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 03/82

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS PARA CALÇAMENTO DE CALÇADAS

DATA DA INSPEÇÃO 20.08.82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.05.82
TÉRMINO: 22.11.82
Nº DE DIAS: 540

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

Cr\$ VALOR

%

Cr\$ VALOR

%

01 - Preparo e marcação do leito

m²

1.800,00

239.994,00

100

02 - Aquisição e assentamento de lajotas.

m²

1.800,00

1.160.000,00

100

03 - Aquisição e assentamento de meios-fios.

m1

1.800,00

85.000,00

50

85.000,00

50

04 - Acabamento geral

vb

1.800,00

75.000,00

100

Termo Aditivo assinado em 24.08.82
Prorrogando prazo e mudando objetivo.

TOTAL

85.000,00

5

1.559.994,00

95

APLICADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 5 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Os blocos estão sendo retirados da rua para serem colocados nas calçadas, pois a espessura não suporta tráfego, execução da lajota, foi alertada a administração neste sentido, deverá fazer calçada na rua Humberto Marcílio.

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RES

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC

GUIABA, 03.09.82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 04/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.05.81

TÉRMINO: 22/11/82

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

Nº DE DIAS: 540

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

EXECUTADO

A EXECUTAR

Cr\$ VALOR

%

Cr\$ VALOR

%

01 - Preparo e marcação do leito

m²

1.800,00

239.994,00

100

02 - Aquisição e assentamento de lajotas

m²

1.800,00

1.160.000,00

100

03 - Aquisição e assentamento de meios-fios

m1

1.800,00

85.000,00

50

85.000,00

50

04 - Acabamento geral

Vb

1.800,00

75.000,00

100

TOTAL

85.000,00

05

1.559.994,00

95

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 05 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
AIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Os blocos foram retirados da rua para serem colocados nas calçadas, pois espessura não suporta tráfego.

PESSOAS CONTACTADAS: Hélio Duarte Vilela - Prefeito Municipal.

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 04/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22.05.81

TÉRMINO: 22/11/82

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

Nº DE DIAS: 540

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo a marcação do leito	m ²	1.800,00			239.994,00	100
02 - Aquisição e assentamento de lajotas	m ²	1.800,00			1.160.000,00	100
03 - Aquisição e assentamento de meio-fios	ml	1.800,00	85.000,00	50	85.000,00	50
04 - Acabamento geral	Vb	1.800,00			75.000,00	100
TOTAL			85.000,00	05	1.559.994,00	95

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 05 % DA OBRA CONFE. ORÇAMENTO ACIMA.
BAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Os blocos foram retirados da rua para serem colocados nas calçadas, pois espessura não suporta tráfego.

PESSOAS CONTACTADAS: Hélio Duarte Vilela - Prefeito Municipal.

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -- X --

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 150.000,00

TEC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC. *[Assinatura]*

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 04/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS ~~REPLACAMENTO DO CALÇAMENTO~~

DATA DA INSPEÇÃO 25.04.83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.05.81
TÉRMINO: 22.11.82
Nº DE DIAS: 540

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo a marcação do leito	m ²	1.800,00			239.994,00	100
02 - Aquisição e assentamento de lajotas.	m ²	1.800,00			1.160.000,00	100
03 - Aquisição e a assentamento de meios-fios.	m1	1.800,00	85.000,00	50	85.000,00	50
04 - Acabamento geral	vb	1.800,00			75.000,00	100
Termo Aditivo assinado em 24.08.82 Prorrogando prazo e mudando objetivo.						
T O T A L			85.000,00	5	1.559.994,00	95

ABAIÇO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI

EXECUTADO 5 % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Os blocos de concreto retirados da rua para serem colocados nas calçadas, pois a espessura não suporta tráfego. ~~As placas de concreto retiradas da rua para serem colocadas nas calçadas, pois a espessura não suporta tráfego.~~

PESSOAS CONTACTADAS: HÉLIO DUARTE VILELA - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 1.500.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr\$ 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr\$ -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.350.000,00

SALDO DO CONVÊNIO Cr\$ 150.000,00

TEC RESP [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL

CH SET FIC [assinatura]

CUÍASA

27/01/83

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 05/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 28/04/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/05/81

TÉRMINO: 22/11/82

Nº DE DIAS: 540

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
Preparo e marcação do leito	m ²	1.800,0	119.997,00	50	119.997,00	50
Aquisição assent. lajotas	m ²	1.800,0	650.000,00	50	650.000,00	50
Aquisição assent. meio-fio	m ¹	180,0	-		162.000,00	100
Acabamento geral	vb	-	-		75.000,00	100
Demolição	m ²	900,0	325.000,00	100	-	
Assentamento de calçada						
- Rua Ponce de arruda - 430	m ²	30,0	21.660,00	100		
- Rua F. M. 132	m ²	22,50	16.245,00	100		
- Rua Santa Cruz	m ²	16,50	11.913,00	100		
- Rua Mal. Deodoro 140	m ²	16,00	11.552,00	100		
- Rua Mal. Deodoro 200	m ²	15,00	10.830,00	100		
- Rua Mal. Deodoro 251	m ²	28,00	20.216,00	100		
- Rua Mal. Deodoro 321	m ²	20,00	14.440,00	100		
- Rua Mal. Deodoro 206	m ²	73,50	5.415,00	100		
- Rua Humberto Marcílio	m ²	36,00	25.922,00	100		
- Rua Humberto Marcílio esq. Pres. Dutra	m ²	22,50	16.245,00	100		
- Rua Humberto Marcílio esq. Mal Rondon	m ²	78,0	56.316,00	100		
TOTAL			1.305.751,00	57	1.006.997,00	43

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Observamos que foram executados 900,0 m² de lajotas sextavadas na Rua Humberto Marcílio, e posteriormente retiradas, pois a espessura (4cm) não suportava peso de veículos.

Posteriormente foram assentadas em calçadas conforme discriminação acima.

PESSOAS CONTACTADAS: Leandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.500.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 25/01/83 Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 150.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/05/84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 05/83

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 28/04/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/05/81

TÉRMINO: 22/11/82

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Nº DE DIAS: 540

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
Preparo e marcação do leito	m ²	1.800,0	119.997,00	100	119.997,00	50
Aquisição assent. lajotas	m	1.800,0	650.000,00	100	650.000,00	50
Aquisição assent. meio-fio	m	180,0	162.000,00	100	162.000,00	100
Acabamento geral	vb	-	75.000,00	100	75.000,00	100
Demolição	m ²	900,0	325.000,00	100	-	-
Assestamento da calçada	m	30,0	21.660,00	100	-	-
- Rua Ponce de arruda - 430	m ²	22,50	16.245,00	100	-	-
- Rua F. M. 132	m ²	16,50	11.913,00	100	-	-
- Rua Santa Cruz	m ²	16,00	11.552,00	100	-	-
- Rua Mal. Deodoro 140	m ²	15,00	10.830,00	100	-	-
- Rua Mal. Deodoro 200	m ²	28,00	20.216,00	100	-	-
- Rua Mal. Deodoro 251	m ²	20,00	14.440,00	100	-	-
- Rua Mal. Deodoro 321	m ²	73,50	5.415,00	100	-	-
- Rua Mal. Deodoro 206	m ²	36,00	25.922,00	100	-	-
- Rua Humberto Marcílio	m ²	22,50	16.245,00	100	-	-
- Rua Humberto Marcílio esq. Pres. Dutra	m ²	78,0	56.316,00	100	-	-
- Rua Humberto Marcílio esq. Mal. Rondon	m					
TOTAL			1.500.000,00	52	1.806.997,00	43

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Observamos que foram executados 900,0 m² de lajotas sextavadas na Rua Humberto Marcílio, e posteriormente retiradas, pois a espessura (4cm) não suportava peso de veículos.

Posteriormente foram assentadas em calçadas conforme discriminação acima.

PESSOAS CONTACTADAS: Leandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.500.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 25/01/83 Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) Cr# 150.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 04/05/84

19/05/84

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CALÇAMENTO DE RUAS


Objetivo : CONVÊNIO ADPC Nº 52/81

Aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HÉLIO NUNES OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 52/81, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOIRO em 22 / 05 / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.


Cuiabá, 19 de Setembro de 1.984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

De acordo:



DIRETORA DE OPERAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 01/84

PROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS

DATA DA INSPEÇÃO 15/09/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/05/81

TÉRMINO: 22/11/82

Nº DE DIAS: 540

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
Preparo e marcação do leito	m ²	31.800,0	119.997,00	100		
Aquisição assentamento lajotas	m ²	1.800,0	650.000,00	100		
Aquisição assentamento meio-fio	m	180,0	162.000,00	100		
Acabamento geral	vb	-	75.000,00	100		
Emolição	m ²	900,0	320.000,00	100		
<u>Assentamento de calçada</u>						
- Rua Ponce de arruda - 430	m ²	30,0	21.660,00	100		
- Rua F. M. 132	m ²	22,50	16.245,00	100		
- Rua Santa Cruz	m ²	16,50	11.913,00	100		
- Rua Mal. Deodoro - 140	m ²	16,50	11.552,00	100		
- Rua Mal. Deodoro - 200	m ²	15,00	10.830,00	100		
- Rua Mal. Deodoro - 251	m ²	28,09	20.216,00	100		
- Rua Mal. Deodoro - 321	m ²	20,00	14.440,00	100		
- Rua Mal. Deodoro - 206	m ²	73,50	5.415,00	100		
- Rua Humberto Marcílio	m ²	36,00	25.922,00	100		
- Rua Humberto Marcílio esq. Pres. Dutra	m ²	22,50	16.245,00	100		
- Rua Humberto Marcílio esq. Mal. Rondon	m ²	78,00	56.316,00	100		
TOTAL			1.542.751,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

- Observamos que foram executados 900,0m² de lajotas sextavadas na Rua Humberto Marcílio, e posteriormente retiradas, pois a espessura (4cm) não suportava peso de veículos.

Posteriormente foram assentadas em calçadas conforme discriminação acima.

PESSOAS CONTACTADAS: Leandro Alves Feitosa - Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.350.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr# 150.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 19.09.84

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO 02-10-81

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

CONVÊNIO ADPC Nº 148/81

PRAZO DE EXECUÇÃO


INÍCIO: 11-08-81

TÉRMINO: 11-02-82

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01. Preparo e marcação da obra	m²	69,30	11.365,00	100	—	—
02. Trabalhos em terra	m³	5,60	3.450,00	100	—	—
03. Alicerces de tijolos maciços	m³	5,10	45.650,00	100	—	—
04. Alvenaria elevação 1/2 vez.	m²	101,00	56.661,00	100	—	—
05. Contrapiso e piso	m²	64,0	34.540,00	30	80.596,00	70
06. Cobertura de telhas barro	m²	168,00	101.200,00	45	120.056,00	55
07. Esquadrias de fe. e made.	un	5,0	—	—	31.900,00	100
08. Revestimentos	m²	202,0	—	—	108.676,00	100
09. Inst. hid. elet. sanit.	vb	—	36.300,00	—	18.100,00	—
10. Pintura	m²	202,0	—	—	55.550,00	100
11. Acabamento geral	vb	—	—	—	10.000,00	100
TOTAL			289.166,00	40	424.878,00	60

ANDAMENTO DA OBRA:

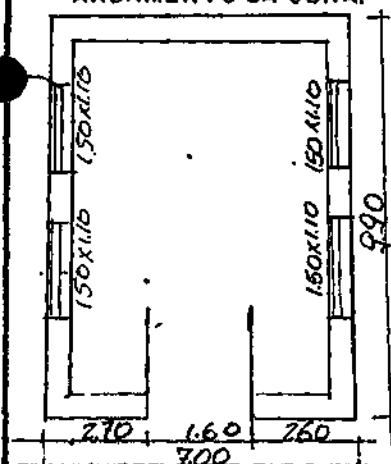

Foi solicitado ao Prefeito Municipal o
acréscimo de um banheiro no prédio
da biblioteca Municipal.

Aplicado 50% do valor do convênio
Executado 40% da obra.

PARCELAS - 50% 40% 10%

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 02/10/81 Cr\$ 250.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 200.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 450.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ 50.000,00

REC. RESP.

REC. MUN.

REC. G. E. F. E. S. E.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 23/11/81

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CONTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI-
CIPAL

CONVÊNIO ADPC Nº 148/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

PRazo DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/08/81
TÉRMINO: 11/02/82
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A. EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação da obra <i>OK</i>	m ²	69,30	11.365,00	100	-	
02 - Trabalhos em terra <i>OK</i>	m ³	5,60	3.450,00	100	-	
03 - Alicerces c/tijolos maciço <i>OK</i>	m ³	5,10	45.650,00	100	-	
04 - Alvenaria de elevação 1/2 vez <i>OK</i>	m ²	101,0	56.661,00	100	-	
05 - Contrapiso, piso <i>mo</i>	m ²	64,3	80.596,00	70	34.540,00	30
06 - Cobertura c/telhas barro <i>OK</i>	m ²	168,00	177.045,00	80	44.251,00	20
07 - Esquadrias de ferro e madeira <i>OK</i>	vb	5,00	-		31.900,00	100
08 - Revestimento <i>80%</i>	m ²	202,00	43.470,00	40	65.206,00	60
09 - Inst.Hidráulica,Elétrica e Sanit. <i>OK</i>	vb	-	36.300,00	66	18.100,00	34
10 - Pintura <i>mo</i>	m ²	202,00	-	55	55.550,00	100
11 - Acabamento geral <i>mo</i>	vb	-	-		10.000,00	100
TOTAL		-	454.537,00	63	259.547,00	37

ANDAMENTO DA OBRA:
no no prédio.

Foi solicitado ao Sr. Prefeito Municipal o acréscimo de um banhei

Aplicado 90% do recurso do Convênio.

Executado 63% da Obra.

Parcelas 50%, 40%, 10%

2º Relatório

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 02.10.81 Cr\$ 450.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ 50.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 09-03-82

MUNICÍPIO: TESOURO

PROJETO: CONST. 1ª FASE DA BIBLIOTECA

CONVENIO ADPC Nº 148/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11-08-81.
TÉRMINO: 11-02-82.
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: ANTONIL - HELIO NUN DE OLIVEIRA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Preparo e move-obra.	m ²	69,30	11.365,00	100	—	
02. Trabalhos em terra	m ³	5,60	3.450,00	100	—	
03. Alicerce c/ tij maciço 1 vez	m ³	5,10	45.650,00	100	—	
04. Alvenaria de elev. 1/2 vez	m ²	101,0	56.661,00	100	—	
05. Contra-piso, piso	m ²	64,0	80.596,00	70	34.540,00	30
06. Cob. com telhas de barro	m ²	168,0	221.296,00	100	—	
07. Esquadrias de Fe e madeira	un	5,0	31.900,00	100	—	
08. Revestimento	m ²	202,0	108.676,00	80	21.735,00	20
09. Instalações	vb	—	54.400,00	100	—	
10. Pintura	m ²	202,0	—		55.550,00	100
11. Acabamento geral	vb	—	—		10.000,00	100
TOTAL			613.994,00	81	121.825,00	19

ANDAMENTO DA OBRA:

Aplicado 100% recurso do convênio
Executado 81% da obra.
Relatório Nº 03.
Parcelas - 50% 40% 10%.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr\$ 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 23-11-81 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr\$ — X —

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ — X —

TEC. RESP.

PREF. MUN.

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA

CONVÊNIO ADPC Nº 148/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11/08/81

TÉRMINO: 11/02/82

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação da obra	m ²	69,30	11.365,00	100	-	-
02 - Trabalhos em Terra	m ³	5,60	3.450,00	100	-	-
03 - Alicerce c/ tijolo maciço 1 Vez	m ³	5,10	45.650,00	100	-	-
04 - Alvenaria de Elevação	m ²	101,00	56.661,00	100	-	-
05 - Contra - Piso, Piso	m ²	64,00	80.596,00	170	34.540,00	30
06 - Cobertura com telhas de barro	m	168,00	221.296,00	100	-	-
07 - Esquadrias de Ferro e Madeira	Ud	5,00	31.900,00	100	-	-
08 - Revestimento	m	202,00	108.626,00	80	21.735,00	20
09 - Instalações	Vb	-	54.400,00	100	-	-
10 - Pintura	m ²	202,00	-	-	55.550,00	100
11 - Acabamento Geral	Vb	-	-	-	10.000,00	100
TOTAL			613.994,00	81	121.825,00	19

ANDAMENTO DA OBRA:

Aplicado 100 % do recurso do Convênio

Executado 81 % da obra

Relatório nº 03

Parcelas - 50 % - 40 % - 10 %

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81 Cr# 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA

CONVÊNIO ADPC Nº 148/81

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11/08/81

TÉRMINO: 11/02/82

Nº DE DIAS: 180

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Hélio Nunes de Oliveira Filho

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Preparo e marcação da obra	m ²	69,30	11.365,00	100	-	-
02 - Trabalhos em Terra	m ³	5,60	3.450,00	100	-	-
03 - Alicerce c/ tijolo maciço 1 Vez	m ³	5,10	45.650,00	100	-	-
04 - Alvenaria de Elevação	m ²	101,00	56.661,00	100	-	-
05 - Contra - Piso, Piso	m ²	64,00	80.596,00	70	34.540,00	30
06 - Cobertura com telhas de barro	m ²	168,00	221.296,00	100	-	-
07 - Esquadrias de Ferro e Madeira	Ud	5,00	31.900,00	100	-	-
08 - Revestimento	m	202,00	108.626,00	80	21.735,00	20
09 - Instalações	Vb	-	54.400,00	100	-	-
10 - Pintura	m ²	202,00	-	-	55.550,00	100
11 - Acabamento Geral	Vb	-	-	-	10.000,00	100
TOTAL			613.994,00	81	121.825,00	19

ANDAMENTO DA OBRA:

25-05-82

Faltou
debe: Esquadria
Pintura
Acabamento

Aplicado 100 % do recurso do Convênio

Executado 81 % da obra

Relatório nº 03

Parcelas - 50 % - 40 % - 10 %

VALOR DO CONVÊNIO: Cr# 500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81 Cr# 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr# - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr# 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 188/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 04

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11/08/81
TÉRMINO: 11/02/82
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação da obra	m ²	69,30	11.365,00	100		
02 - Trabalhos em terra	m ³	5,60	3.450,00	100		
03 - Alicerce c/ tijolo maciço 1 vez	m ³	5,10	45.650,00	100		
04 - Alvenaria de elevação	m ²	101,00	56.661,00	100		
05 - Contra - piso, piso	m ²	64,00	115.136,00	100		
06 - Cobertura com telhas de barro	m ²	168,00	221.296,00	100		
07 - Esquadrias de ferro e madeira	Ud	5,00	31.900,00	100		
08 - Revestimento	m	202,00	130.411,00	100		
09 - Instalações	Vb	-	54.400,00	100		
10 - Pintura	m ²	202,00	55.550,00	100		
11 - Acabamento geral	Vb	-	10.000,00	100		
TOTAL			735.819,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Relatório nº 04

Parcelas - 50 % - 40 % - 10 %

Obra concluída.

Enilson Lopes dos Santos

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81 Cr\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 148/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

RELATÓRIO Nº 04

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11/08/81

TÉRMINO: 11/02/82

Nº DE DIAS: 180

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01 - Preparo e marcação da obra	m ²	69,30	11.365,00	100		
02 - Trabalhos em terra	m ³	5,60	3.450,00	100		
03 - Alicerce c/, tijolo maciço 1 vez	m ³	5,10	45.650,00	100		
04 - Alvenaria de elevação	m ²	101,00	56.661,00	100		
05 - Contra - piso, piso	m ²	64,00	115.136,00	100		
06 - Cobertura com telhas de barro	m ²	168,00	221.296,00	100		
07 - Esquadrias de ferro e madeira	Ud	5,00	31.900,00	100		
08 - Revestimento	m	202,00	130.411,00	100		
09 - Instalações	Vb	-	54.400,00	100		
10 - Pintura	m ²	202,00	55.550,00	100		
11.- Acabamento geral	Vb	-	10.000,00	100		
TOTAL			735.819,00	100		

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Relatório nº 04

Parcelas - 50 % - 40 % - 10 %

Obra concluída.

Enilson Lopes dos Santos

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 23/11/81 Cr\$ 500.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr\$ - X -

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ - X -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 27/01/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 148/81


OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA BIBLIOTECA

Aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 1983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Hélio Nunes de Oliveira Filho e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 148/81, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOURO - MT em 11 / AGOSTO / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.


Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 27 de Janeiro de 19 83



Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal de TESOURO - MT



Director de Operações

TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO VOADEIRA
Objetivo : CONVÊNIO ADPC Nº 149/81


Aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 1.984, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº HÉLIO NUNES OLIVEIRA FILHO e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 149/81, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de TESOIRO em 11 / 08 / 81.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando a execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 18 de Setembro


de 1.984.



SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO

De acordo:



DIRETORA DE OPERAÇÕES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 149/81

MUNICÍPIO: TESOURO - MT.

RELATÓRIO Nº 15/09/84

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - Córrego Voadeira

DATA DA INSPEÇÃO 01/84

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11/08/81


TÉRMINO: 11/12/81

Nº DE DIAS: 120

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
01 - Córrego Voadeira - 28,00m						
1.1 - Fundação	-	-	-	-	-	-
1.2 - Esteios	-	-	-	-	-	-
1.3 - Travesseiros e longarina	m ³	25,20 m	400.000,00	100	-	-
1.4 - Assualho, rodeiro, rodapé	m ²	153,00	400.000,00	100	-	-
1.5 - Caixão de aterro	m ²	38,00	200.000,00	100	-	-
TOTAL			1.000.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

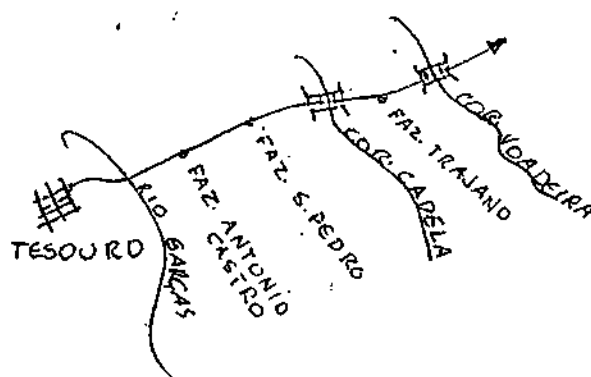

Os serviços de fundação e esteios já estavam executados, por ocasião da assinatura do convênio.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 1.000.000,00

PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ Cr# 1.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr#

TEC. RESP.

CH. SET. FISC.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 156/82

MUNICÍPIO: TESOURO

RELATÓRIO Nº 01

PROJETO: ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO
DE ESTRADAS VICINAIS

DATA DA INSPEÇÃO 25/01/83

EXECUTOR:

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 23-12-82


TÉRMINO: 23-01-83

Nº DE DIAS: 30

FISCAL: HÉLIO NOVES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Abertura Abertura de Estradas vicinais	ml	5.000,0	850.000,00	100		
02- Patrolamento de Estradas vicinais	ml	1500,0	640.000,00	1850	120.000,00	15
TOTAL			1490.000,00	940	120.000,00	96

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

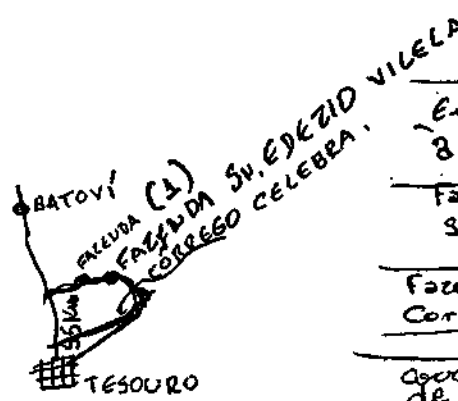 TESOURO	Entrada estrada Batovi	3000 m	Patrolamento
	8 Fazenda (d)		
	Fazenda Sr. Edezio Vilela	3000 m	Abertura e Patrolamento
	Fazenda Sr. Edezio ao Corrego Celebra	2000 m	Abertura e Patrolamento
	Corrego Celebra a estrada de Batovi	1500 m	Patrolamento

PESSOAS CONTACTADAS: CONSTRUTOR.

VALOR DO CONVÊNIO Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 23/12/82 Cr\$ 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO (3ª PARCELA) Cr\$ 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr\$ X

TEC. RESP

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA
INSPEÇÃO: 09/03/82

MUNICÍPIO: TESOURO - MT

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

CONVÊNIO ADPC Nº 204/81

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 11.12.81
TÉRMINO: 11.04.82
Nº DE DIAS: 120

FISCAL HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
<u>CÓRREGO CUIABANO - 9,0 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	108.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	108.000,00	100	-	-
0.3 - Travesseiro, longarina	-	-	108.000,00	100	-	-
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	141.750,00	87	20.250,00	13
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	-	-	54.000,00	100
<u>AFLUENTE CÔR. CUIABANO -10,0 m</u>						
0.1 - Fundação	-	-	120.000,00	100	-	-
0.2 - Esteios	-	-	120.000,00	100	-	-
0.3 - Longarina, travesseiro	-	-	120.000,00	100	-	-
0.4 - Assoalho, rodeiro, rodapé	-	-	90.000,00	50	90.000,00	50
0.5 - Caixaão de Aterro	-	-	-	-	60.000,00	100
TOTAL			915.750,00	71	224.250,00	19

ANDAMENTO DA OBRA:

Executado 71,0 % da obra

Aplicado 91,0 % do Recurso do Convênio

MONÇÃO
DOURADO.

TESOURO

VALOR DO CONVÊNIO:

Cr\$ 1.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ 18/02/82

Cr\$ 700.000,00

VALOR A SER LIBERADO:

Cr\$ 300.000,00

TOTAL ACUMULADO

Cr\$ 1.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO

Cr\$ X

TEC. RESP.

PREFEITURA

CH. SET. 1982

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 32/84

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO Nº 01/85

PROJETO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA

DATA DA INSPEÇÃO 24/01/85

DE ARTEFATOS DE CONCRETO

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO: 02/05/84

TÉRMINO: 02/05/85

Nº DE DIAS: 365

FISCAL: Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr\$ VALOR	%	Cr\$ VALOR	%
01- Mercadoria adquirida conforme nota fiscal nº 029 629 da firma Metalúrgica Ervino Menezes - Jaraguá Sul S.C.	G1	-	12.098.612			
- Comercial Senil - A.Arag. nº da N.Fiscal 0187	Gb	-	1.300.000			
- Macil - R. D. Pedro II A. Arag. N. Fiscal - nº 01	Gb	-	1.030.000			
- Encial Minas - A. Arag. N.Fiscal nº 0759	Gb	-	544.708			
- Mad. Stª Monica - A. Arag. N.Fiscal nº 01313	Gb	-	1.226.680			
- Comercial Minas - A.Arag. N.Fiscal nº 17229	Gb	-	100.000			
TOTAL						

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA COM ORÇAMENTO ACIMA ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

- Falta prestação de contas de R\$ 5.000

- Saldo será p/ const. do barracão

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral

VALOR DO CONVÊNIO

Cr\$ 25.000.000

PARCELAS (%)

Cr\$ 22.500.000

VALOR A SER LIBERADO

PARCELA Cr\$ 2.500.000

Cr\$ 25.000.000

TEC. RES

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. P. 100
