

 **CODEMAT**
PALACIO PALAQUÁS - CPA
22 AGO 15 02 89 003310

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.310/89

Nº PROCESSO: 2.787/89


DATA 22 / 08 / 89

INTERESSADO

DIRETOR DE OPERAÇÕES

ASSUNTO

SOLICITA PROVIDENCIAR LICITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
NUMA EXTENSÃO DE 11KM, NO POSTO FISCAL, DE PROPRIEDADE SEFAZ, NA MT-010, TRECHO ACORIZAL/
ROSÁRIO OESTE, CONFORME CONVÊNIO Nº01/89, SEFAZ/CODEMAT CI Nº147/89.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 01/89

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE FAZENDA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos 03 dias do mês de julho de 1.989, compareceram as partes entre si justas e convencionadas, a saber: de um lado a SECRETARIA DE FAZENDA, doravante denominada SEFAZ, neste ato representada pelo seu Secretário, Dr. FAUSTO DE SOUZA FARIA, e, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, doravante denominada CODEMAT, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. JAIR BENEDETTI, e pelo seu Diretor de Operações, Sr. EDVALDO RODRIGUES PAIVA que perante as testemunhas no final assinadas, resolvem celebrar o presente Convênio, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do Objeto

O presente Convênio visa disciplinar a concessão de Apoio Financeiro para a energização do Posto Fiscal de propriedade da SEFAZ, sito na MT-010, trecho Acorizal/Rosário Oeste, trifásica, 34,5 KV numa extensão de 11 Km, transformador trifásico e padrão tipo CEMAT.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários para atender as despesas com o presente instrumento, correrão a conta do Tesouro do Estado, dotação própria da SEFAZ.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações


I - Da SEFAZ:

- a) Acompanhar a execução Físico-Financeira do projeto;



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



- 2 -

- b) Monitorar as ações desenvolvidas, propondo modificações e reorientações sempre que necessário ao bom desempenho do projeto;
- c) Transferir a CODEMAT os recursos financeiros necessários a implantação do objeto do presente convênio, observando a seguinte programação financeira:
Ncz\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzados novos) na assinatura,
Ncz\$ 34.113,00 (trinta e quatro mil, cento e treze cruzados novos) 15 (quinze) dias após a assinatura e
Ncz\$ 20.000,00 (vinte mil cruzados novos) 30 (trinta) dias após a assinatura;
- e) Examinar, aprovar e consolidar as prestações de Contas de todos os recursos alocados do Convênio;
- f) Providenciar o registro deste instrumento na Auditoria Geral do Estado e Publicação no Diário Oficial do Estado.

II - Da CODEMAT:

- a) Adotar todas as medidas necessárias a efetiva implantação do objeto de que trata o presente Convênio;
- b) Executar o projeto relacionado neste convênio;
- c) Encaminhar a SEFAZ o Relatório de Aplicação dos Recursos para liberação da parcela subsequente;
- d) Organizar e mobilizar as comunidades que serão beneficiadas para executarem os serviços de abertura de faixas de servidão;
- e) Executar o objeto do presente instrumento em regime de mutirão.

CLÁUSULA QUARTA - Do valor

O valor do presente Convênio é de Ncz\$ 124.113,00 (cento e vinte

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- 3 -



e quatro mil, cento e treze cruzados novos)

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo

O prazo deste Convênio é de 02 (dois) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Aditivos e Alterações

O presente Convênio poderá a qualquer tempo de sua vigência ser prorrogado ou sofrer alterações mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão

Este Convênio será rescindido por inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas ou por consenso das partes apurados os haveres se houver, e expedidas as quitações que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA OITAVA - Do Foro

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Mato Grosso, para dirimir toda e qualquer questão que se fizerem necessárias.

E, por estarem assim justas e convenientes, firmam o presente Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza entre si e seus sucessores os legítimos efeitos de direito.

Cuiabá, 03 de julho de 1.989.

SEFAZ:

Fausto de Souza Faria
FAUSTO DE SOUZA FÁRIA

- Secretário -

CODEMAT:

Jair Bene detti
JAIR BENEDETTI

- Diretor Presidente -

TESTEMUNHAS:

Edvaldo Rodrigues Paiva
EDVALDO RODRIGUES PAIVA
- Diretor de Operações -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.787/89 DE 22 / 08 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao CEA/DIOP

Solicito providências para elaboração de
pasta técnica, contendo todos os dados técnicos
necessários à perfeita execução dos serviços

Após, devolver a este Grupo o presente
processo, para que possamos proceder à
licitação.

23.08.89

Rose M. de Barros
Rose M. de Barros
Presidente e Licitação

A DPR - Seef
para providenciar

23.08.89

Maurício Lúcio Nantas
Maurício Lúcio Nantas
Coordenador da Dir. Operações
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIOP	CODEMAT Protocolo N.º <u>3.310/89</u>	DATA <u>22.08.89</u>
PARA GLT	Processo N.º <u>0.787/89</u>	N.º DA C.I. <u>147/89</u>
ASSUNTO	Data <u>22.08.89</u> <u>Quineto</u> Com a presença do Sr. <u>Quineto</u> vimos solicitar a V.Sa., providenciar Licitação com o fim de implantação de rede de energia elétrica, numa extensão de 11 Km, no Posto Fiscal, de propriedade da SEFAZ, sito na MT-010, trecho Acorizal/Rosário Oeste. Os recursos, da ordem de NCz\$ 124.113,00 (Cento e vinte e quatro mil, cento e treze cruzados-novos), para atender as despesas, são provenientes da conta Tesouro do Estado, dotação própria da SEFAZ, conforme Convênio nº 01/89 - SEFAZ x CODEMAT. Atenciosamente Edvaldo Rodrigues Paiva Diretor de Operações CODEMAT	
ENVIADO POR Edvaldo R. Paiva	DESTINADO A Rose Helena P. Barros	RECEBIDA EM

CODEMAT	
Protocolo N°	5.424/90
Processo N°	
Data	28 / 11 / 90
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 5.424/90

N.º PROCESSO: 4.741/90

DATA 28 / 11 / 90

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ASSUNTO

ENCAMINHA CÓPIA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DO HORIZONTE D'OESTE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO, CONFORME OF. Nº 300/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

QUESTÕES

- ① - CONHECER A QUEM PERTENCE AS ÁREAS EM ABERTO
- ② SABER SE EXISTE ÁREA DE EXPANSÃO
- ③ SABER SE EXISTE ESCRITURA DO POSSE?
- ④ A ORGANIZAÇÃO FICARÁ POR CONTA DA PREFEITURA DE CASERES PELA PROXIMIDADE?

Revisão de
mrs de Almeida
do do projeto

Revisão
de
mrs de Almeida

Almeida
do



COD. MAT	
Protocolo N.º	5.424/90
Processo N.º	4.741/90
Data	28, 11, 90
<i>Diuranda</i>	
Serviço de Protocolo	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
OF. Nº 300/90-SOSU
Cáceres, 26 de novembro de 1990.

Exmº Sr.
Benedito Rufino
MD. Diretor Técnico da CODEMAT
Cuiabá-MT.

Prezado Senhor,

Pelo presente, enviamos a V.Excia.,
cópia do Levantamento Cadastral do Horizonte D'Oeste, para ex
ecução do Projeto de Urbanização.

Certos de podermos contar com vossa
especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Germano Bianchini
Germano Bianchini
Sec. Obras e Serv. Urbanos

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º

4.741/90 DE 28 / 11 / 90

INTERESSADO(A)


ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DPR

Para providências.


Em: 04.12.90


Benedito Rufino da Silva
Diretor de Operações
— CODEMAT —

7 SEEP

Solicitamos seja colocado o presente
projeto na agenda do SETOR

Em 4.12.90


Paulo César Boman de MeloChefe da Divisão de Projetos
CODEMAT



Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

INTERESSADO


BRAUNOR
EZEQUIAS

01-88

ASSENTO

RECEBIDO EM 22/01/88

CCB



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

TNT Air Express

LEVAR A REFEITO P/ EQUIPAR

- A FARMACIA
- COMPRA TELEVISÃO
- POSTO ODONTOLÓGICO PADRÃO
- SALA ADMINISTRATIVA
- ALUGUEIRO

400.000,00

TNT Air Express

ATIVIDADE EXTERNA.

- ARMAZEM - 600.000,00
- POCILGA - 200.000,00
- QUADRA ESQUENTE C/
PANQUE INFANTIL 400.000,00
- CAVALO C/ CHANFRA

↓ 600.000,00

TNT Air Express

CENTRO COMUNITARI
PLANTA E/ VALONES
DESTA CANGO MAT
OBRA

1.500.000,00

2429522 Curitiba

Agropecuária do Curiatã.
Demétrio ou Engenheiro do Funchal.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RASCUNHO

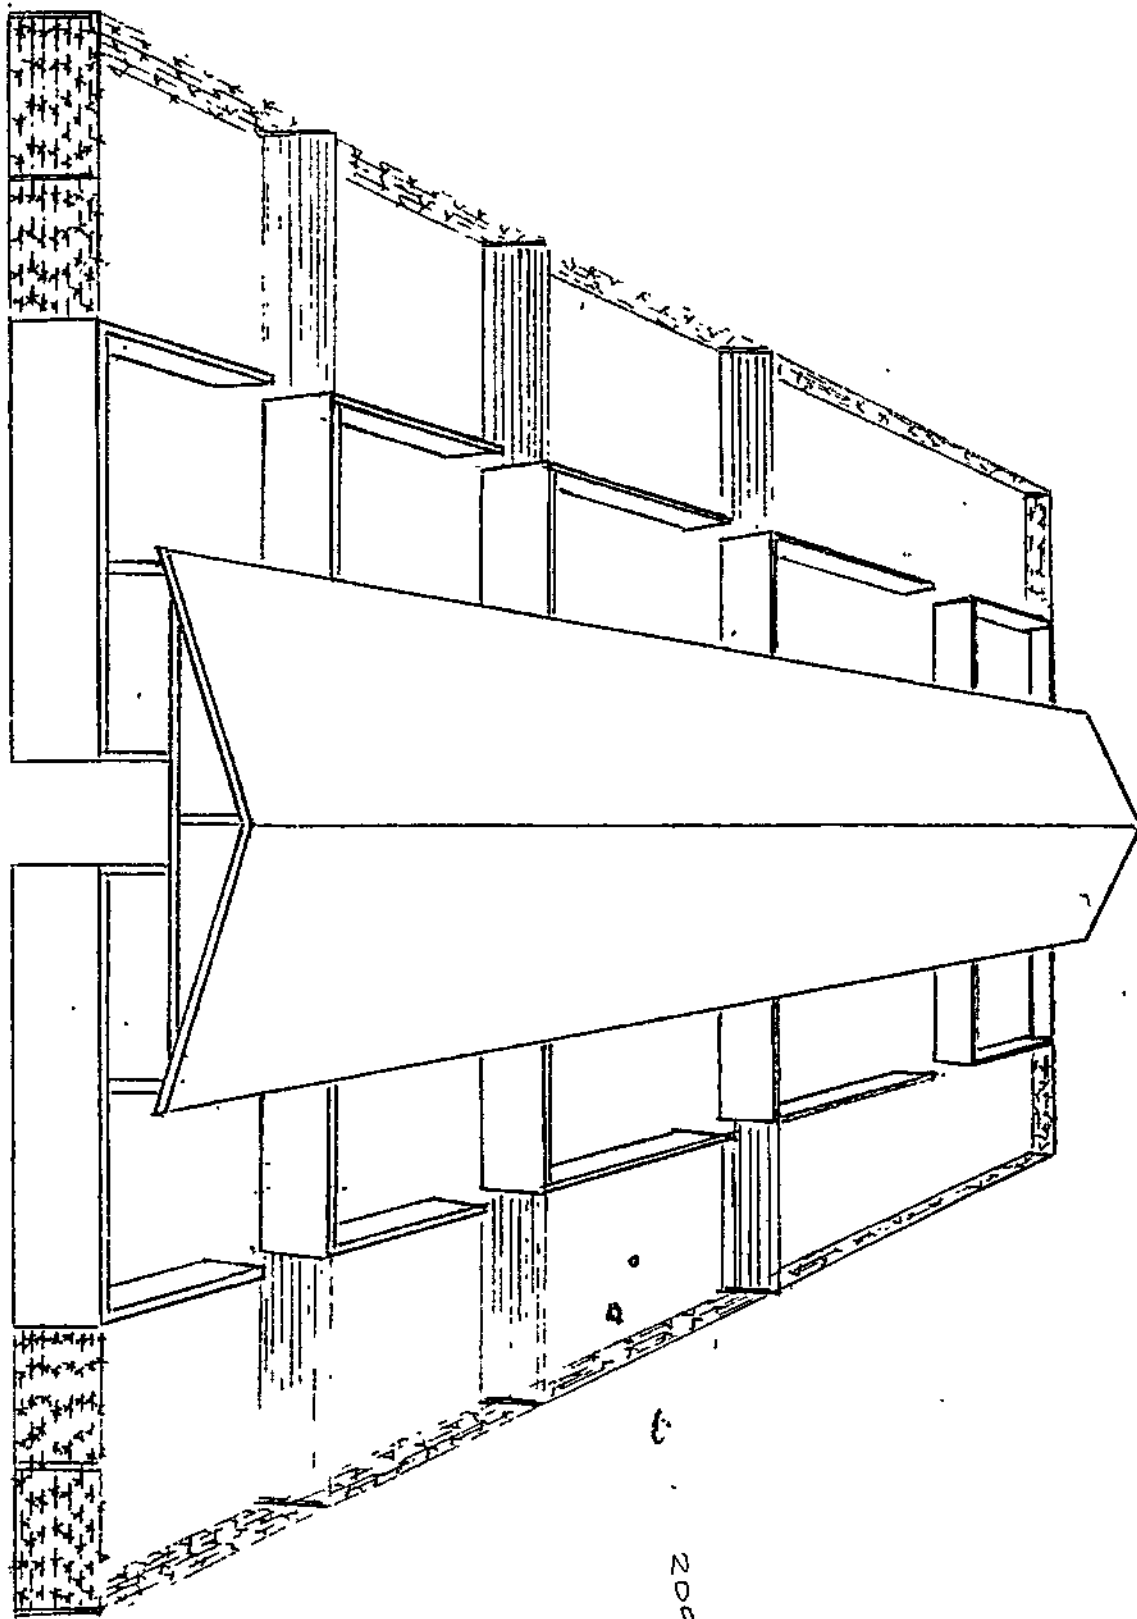
Proc. 5163/87 - DRA NORTE

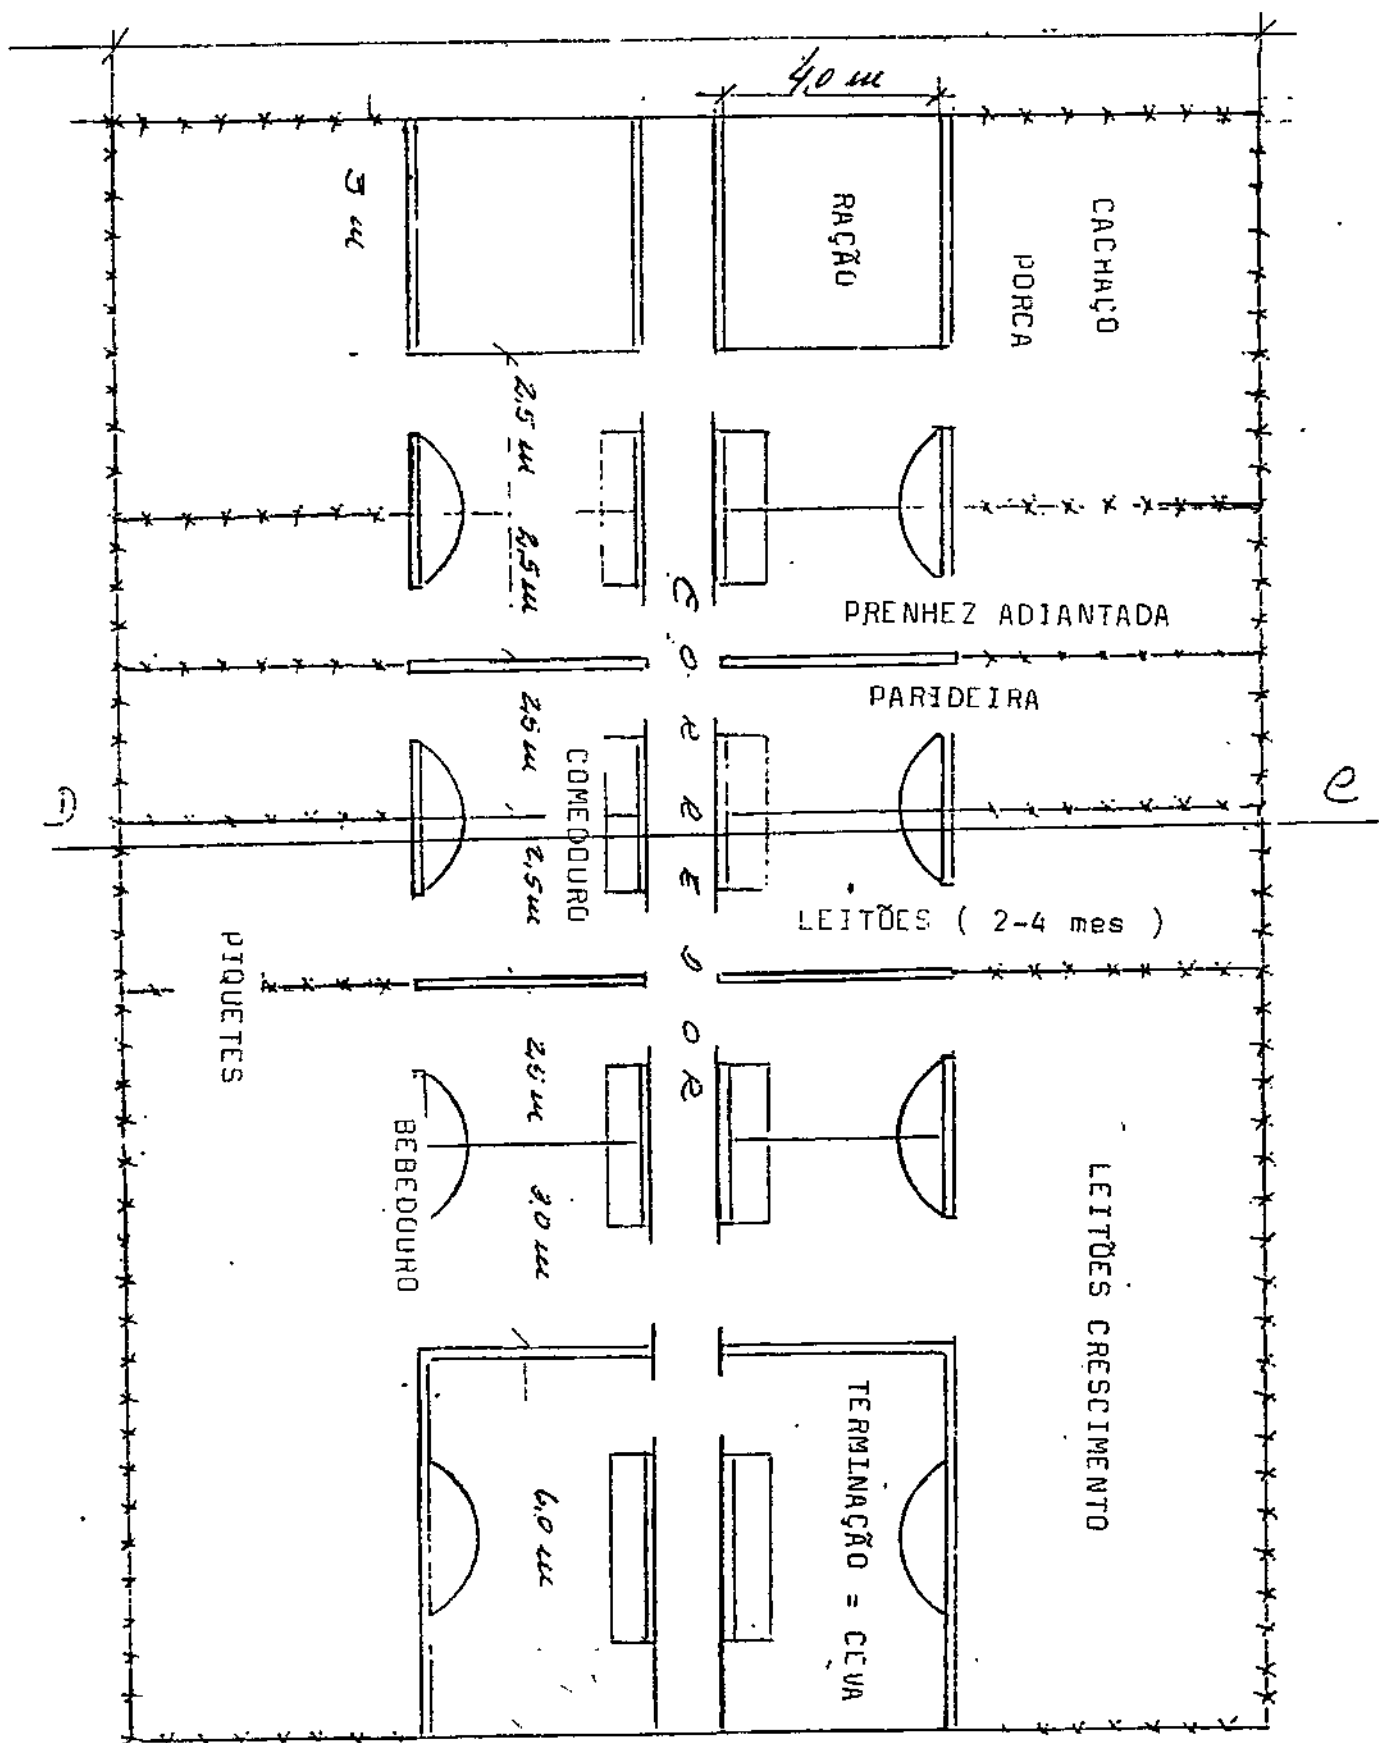
Proc 5147/87 - CASUARIETAA.

BRAS NORTE.

- 1) PLANTA DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO.
DOS LOTES. 111. E 112 DO LOTEAMENTO.
RIO DO SANGUE. ESC. 1:500 3940
- 2) DEFINIR LOCAL IDEAL PARA IMPLANTA-
ÇÃO DOS LOTES URBANIZADOS. (02,03,04
LO. 963)
 - 2.1 NO DE FAMILIAS A SER IMPLANTADA? 150
 - 2.2 VERIFICAR SE EXISTE INFRA-
ESTRUTURA PROXIMA.
 - 2.3. AREA P/ EQUIPAMENTOS URBANOS
(PRACAS) ESCOLAS,
- 3) DEFINIR OS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS
ORGAN: SANEMAT, CEMAT, TELEMAT,
- 4) TIPO DE CONSTRUÇÃO UTILIZADA
(MADEIRA, ALVENARIA, TELHA DE BARRO,
ETERNIT.)

MODELO DE POCILGA



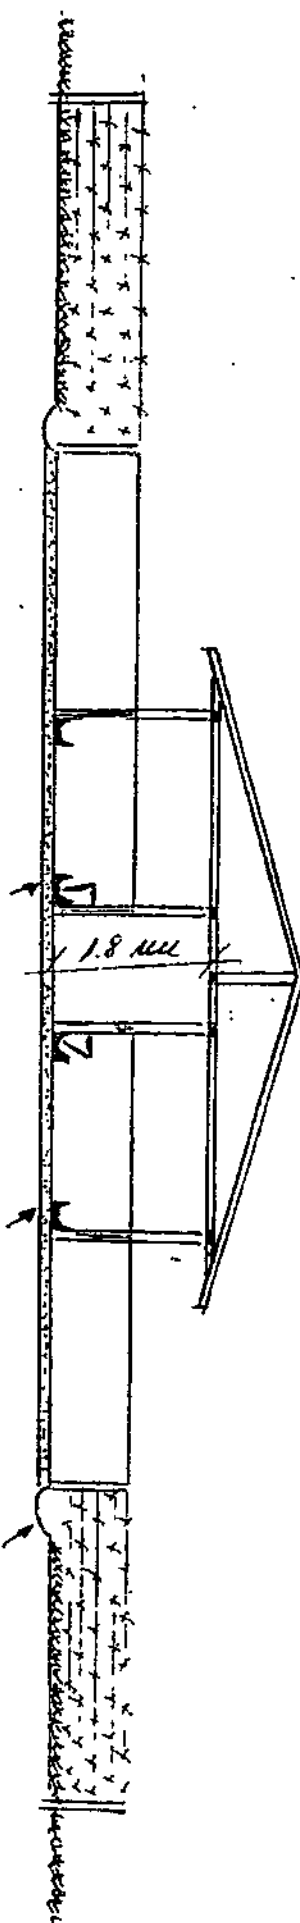


COETE C.D

00000000

00000000

ESGOTO






ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA



Of. nº 148/89-alf.

Cláudia/MT, em 27 de julho de 1.989.

Senhor Presidente,



Com o presente estamos ratificando nossa solicitação verbal formulada anteriormente, visando a elaboração de um projeto de drenagem no perímetro urbano da cidade de Cláudia, pois está se verificando um grave problema de erosão e a época das chuvas aproximam-se, devendo tal serviço ser executado com a máxima urgência.

Sendo o que nos se apresentava para o momento, certos da costumeira atenção e compreensão de V. S^a., renovamos os nossos protestos de consideração e aprêço, subcrevendo-nos.

Atenciosamente,


JOSE AUGUSTO FORMIGONI
Prefeito Municipal

Ilm^o. Sr.

JAIR BENEDETTI

DD. Diretor Presidente da Codemat

CUIABÁ/MT



PROTÓCOLO
CODENAT
P.A. N.º 02

Estado de Mato Grosso

FOLHA

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo

Apreciação do Sec. - Chefe da Casa Civil

Em

Dante Santa R. Campos
Protócolo Casa Civil

A CODEMAT para apreciação.

Em 27-7-89.

Edvaldo José da Silva
Chefe da Secretaria da Casa Civil

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.536/89 DE 28 / 07 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DOP,

para apurarmos.

Cui, 31.07.89.

Jair Benedetti
Diretor Presidente
- CODEMAT -

À D.P.R.

Para elaborar o projeto.

Em: 03.08.89

Edouardo Rodrigues Patroa
Diretor de Operações
- CODEMAT -

SEEP

VERIFICAR JUNTO À PREFEITURA DE CUIABÁ
SE HÁ LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA
A SER FEITA DRENAGEM.

Em: 04/08/89

Waltamir Augusto Bortolho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

A Cea DOP.

Conforme pedido, envio este processo.

Na oportunidade, resalto a necessidade de eu
criarmos junto a equipe de topógrafos já soli-
citada ao DDR, o novo engenheiro Carlos Edmundo
Cerveira Caldas que irá elaborar o respectivo
projeto.

em: 04-08/89


Genildo Amador de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
CODEMAT

1.º
Ao Dir. de Operações

Para autorizar a ida do engenheiro,
juntamente com o topógrafo da DPR/Est,
cuja ida já está autorizada em outro pro-
cesso.

A previsão do período necessário ao topógrafo
é de aproximadamente 10 dias e do
engenheiro 3 dias.

09.08.89



Maurício Lucio Nantes
Coordenador da Dir. Operações
- CODEMAT -

Autorizo:

A CEA/DIOP

Providenciar, juntamente com a DPR, para a
ida do Engenheiro até o referido Município,
para fazer o levantamento da área.


Em: 09.08.89.


Edvaldo Rodrigues Patro
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A DPR

para providenciar.


09.08.89


Maurício Lucio Nantes
Coordenador da Dir. Operações
- CODEMAT -

SEEP

Para as providências

Em: 09.08.90


Edvaldo Rodrigues Patro

DPR

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

18 FEB 13 42 83 000798

PROTOCOLO ESPECIAL

Nº PROTOCOLO: 598/89

Nº PROCESSO: 556/89


DATA 28 / 02 / 89

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ASSUNTO

SOLICITA ELABORAR PROJETO DE ARQUITETURA, INSTALAÇÃO E ORÇAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Haroldine~~ 16/8/84
Entre em contato com Rose

Secretaria do Procurador estadual
Siga até assim que chegar —
então em contato conosco

321-1360 Quilbo

~~Quilbo~~ 573-1328 Jélio

16/8/84

573 114.5

~~1290~~

Voluntar da prefectura
em procurador o' resp-
tivo T. 2. 2. 2.

1. J. J. J. J.
Camara municipal

PARA TIA GA-MT

entrar em contato com
o procurador e cobrar
a respectiva planta topo-
grafica.

JOSE LEITE PROCURADOR




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA



Ilmo.Sr.Dr.Jair Benedetti

M.D.Diretor Presidente da CODEMAT.

Nesta.



O Município de Paranatinga, pelo seu procura
dor infra assinado, Vem mui respeitosamente, requerer de V.S. a confecção
de um "PROJETO DE AQUITETURA, INSTALAÇÕES e ORCAMENTOS" , para constru
ção da Séde da Prefeitura e Camara Municipal,

Certo do atendimento já costumeiro, fico no
aguardo.

N.Termos

P.E.Deferimento

Paranatinga, 26 de fevereiro de 1.989

Prefeitura Municipal de Paranatinga
[Signature]
José Leite Fernandes
Procurador Geral



PREFEITO
Jaime Dias
Pereira Filho
UM FUTURO DE TRABALHO



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º

556/89


DE 28 / 02 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES


À DIOB para apuração
Cuiabá, 01.03.89


Jair Benedetti
Diretor Presidente
- CODMAT -

À DPR

Para providenciar


Em 10/3/89


José Roberto Bittencourt
Diretor Operações
CODMAT -

AO GEEP

PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE A SOLICITAÇÃO REQUER

Em 13/03/89


Walmir Augusto Boralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL

PALÁCIO PAIAGUÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Geral da Casa Civil

Palácio Paiaguás - CPA

DATA 16.05.89 ANO 89

DATA 16-05-89 HORA -

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.007.970-7

do Protocolo

INTERESSADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES

ASSUNTO

Solicita apoio financeiro, a fim de que se-
ja aplicado na construção sufra.

CODEMAT

Protocolo nº 1093-89

Processo nº 524-89

Data 17.05.89

Assinado

Sistema de Protocolo

PROTOCOLO GERAL

7 MA 1989 06:19:23

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

ANEXOS

Processo Nº

Documento Nº

DATA - 16-05-89 HORA -

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.007.970-7

PROT. COORD. 11111



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Nobres-Mt., em 28 de abril de 1989

Ao: Exm^o. Sr.

Dr. CARLOS GOMES BEZERRA

Governador do Estado de Mato Grosso

Senhor Governador,

Dada a precariedade da Estação Rodoviária do Município, e a necessidade urgente da edificação de um novo prédio, algo esperado há muito tempo pela população nobrense, os vereadores componentes da Câmara Municipal, tomaram a iniciativa de redigir a honra da presença de V.Excia., a fim de reivindicar apoio financeiro, a fim de que seja aplicado na construção supra.

Cumpre-nos informar ainda, que tal iniciativa prende-se ao fato da precariedade do prédio como foi dito e por ser este Município, tem considerado polo industrial, considerado também como celeiro agrícola.

Diante do exposto, certo de poder contar com total apoio, por parte de V.Excia., para o assunto em tela, aqui reiterei meus protestos de estima e consideração, tecendo ainda sinceros agradecimentos pela vossa honrada visita ao nosso querido Município.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL
DE NOBRES - MT.


ANTÔNIO CARLOS DA COSTA

Vereador.

Adis V. Farias
Vitor Hugo Gallo
Juvencio Oros Pedreira

Por determinação do Sr. Governador, elaborar projeto na a rodoviária de Nobres e possível ajuizar a Prefeitura financeiramente na construção da obra através de recursos do, 04/05/89

*Excm^o Sr. Carlos Gomes Bezerra
Governador do Estado de Mato Grosso*



Estado de Mato Grosso


FOLHA _____

CHEIA DA CASA CIVIL

Processo _____

À CODEMAT, para os devidos fins,
conforme despacho incluso.

Em 15-5-89


EDVALTE JOSÉ DA SILVA
Chefe da Secret. da C. Civil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.524/89 DE 17 / 05 / 89


INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIOP para apuração


Curitiba, 18.05.89


Jair Benedetti
Diretor Presidente
- CODEMAT -

A DPR

Para elaborar projeto solicitada.


Em 19/05/89


Edvaldo Rodrigues Paiva
Diretor de Operações
- CODEMAT -

AO SEEP

PARA PROVIDÊNCIAS CONFORME SOLICITAÇÃO,
URGENTE!

EM 22/05/89


Waltamir Augusto Romalho Dias
Chefe de Divisão de Projetos
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

CODEMAT

~~SECRET~~ FIVE - CPA

9 087 10 3 9 004549

DATA -07/12/84 HORA -

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLLO NUMERO 0.001.631-A

Nº do Protocolo

INTERESSADO

Dep. Hilton de Campos

ASSUNTO

Solicita autorização junto a Codemat, a fim de que forneçam os materiais constantes na relação do Ofício nº 56/88, da AMORF - Associação dos Moradores da Gleba Rio Furquim, que segue em anexo.

C O D E M A T
Protocolo N.º 4549/88
Processo N.º 3803/88
Data 09.12.88
R. Almeida
Serviço de Protocolo

ANEXOS

[illegible]

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

SETOR
SEEP

DATA 37/03/89

GOVERNO CARLOS BEZERRA
EM DIREÇÃO AO SOCIAL



PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESP. LEOPOLDO BERTHOLDO S. JUNIOR

OBRA

COBERTURA DA ESCOLA

LOCAL

ΣΟΙΝΑ

FOLHA Nº

[illegible]




ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



OF. 574/EHC/88

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 1.988



Senhor Governador,

Fazemos uso deste expediente, para sollicitar de V. Exa., autorização junto a CODEMAT, a fim de que forneçam os materiais constantes na relação do ofício nº 56/88, da AMORF - Associação dos Moradores da Gleba Rio Furquim, que segue em anexo.

Outrossim, informamos que os referidos materiais serão utilizados na cobertura e construção da Escola na Linha Paraná II, ficando a mão-de-obra, areia e pregos, por conta da comunidade.

Certos de que teremos seu apoio ao acima exposto, desde já agradecemos reafirmando os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente

HILTON DE CAMEOS
Deputado Estadual

Exmo. Sr.

Dr. CARLOS GOMES BEZERRA

DD. Governador do Estado de M. Grosso

Palácio Paiaguás - CPA

N E S T A

AMORE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA "RIO FURQUIM"

GLEBA RIO FURQUIM
JUÍNA

MUNICÍPIO DE JUÍNA

CAIXA POSTAL, 24
MATO GROSSO

OF. Nº 56/88

Ao Sr.

HILTON DE CAMPOS

DD. DEPUTADO ESTADUAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CUIABA - MT.

Estimado e Amigo Dr. HILTON

Mais uma vez, vem esta Associação, pedir seus serviços e atenção no sentido de solucionarmos nossos problemas de ensino.

Trata-se da cobertura e madeira para a construção da escola da linha Paraná II medindo 8x8 metros.

Necessitamos no total 84 telhas de bsilit, 6m² de tábuas, 12 sacos de cimento, 52 metros corridos de caibro 08x08 e meio metro cúbico de meia-tábua (12cm).

A mão de obra, areia e pregos, correm por conta da comunidade.

Sendo o que tínhamos para o momento aguardamos muito atentamente.

Filadélfia de Juína -MT- aos 28 de Setembro de 1988

"AMORE"

.....
PRESIDENTE

HONORIO MATTEI

Antonio L. Maganha
ANTONIO L. MAGANHA
Presidente da Escola

Calém 4 T

Estado de Mato Grosso

FOLHA

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo

4 Apreciação do Sec. - Chefe da Casa Civil

Em 07/12/88

[Signature]

José Carlos Rezende
Chefe da Secretaria da
Casa Civil

A Codemat, para
apreciação e parecer

Em 07/12/88.

[Signature]

Isabel Luiza Lopes
Assessora Municipal
CASA CIVIL

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO N.º 3.803/88DE 09 / 12 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIOP para apuração
Custo, 12.12.88

Eneni A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

A Cea DIOP para analisar a possibilidade no
atendimento. 12/12/88

José Maria Wilczak
Diretor Operações
CODEMAT -

A D.D.R.

Para informar se há disponibilidade de
alguns materiais, sobieitados.

18.01.89

Martelo

A CEA / DIOP

Informamos a V.Sa. que
as materias solicitadas as
que esta empresa teria con
dição de atender referem-se
as madeiras, entretanto como
não há ainda aquisições de
madeira bruta para atendi-
to as inúmeras reivindica-
ções que se encontram nets Di
visas aceditions seja inviá
vel o atendimento, s.m.f de V.Sa

Em 25.01.89

C. L. L.

CODEMAT

Engº Agº Carlos Alberto da Silva
Divisão de Desenvolvimento Nacional

À Director de Operações

Para novas deliberações, tendo em vista
o reativamento das actividades na serraria

30389

[Signature]
CEA Idibp

À DPR

Para preparar orçamento.

Em 14/03/89

[Signature]
Director de Operações.

À O SERR

PREPARAR ORÇAMENTO, CONFORME QUANTITATIVO
FORNECIDO PELO AMDEF. (FOLHA Nº 02).

Em 15/03/89

[Signature]
Waltamir Augusto Bortalho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

 **CODEMAT**
PALACIO PARAGUÁS - CPA

30 MAR 1990 002015

PROTOCOLO GER. L

N.º PROTOCOLO: 2.315/90

N.º PROCESSO: 1.951/90

DATA 30 / 05 / 90

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

ASSUNTO

SOLICITA UM ARQUITETO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO
DE UM COMPLEXO TURISTICO, CONFORME OF. Nº 082/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
GABINETE DO PREFEITO

Reserva do Cabaçal MT, aos 28 de Maio de 1.998

Ofício GP nº 082/90

Senhor Presidente,

CODEMAT
Protocolo N.º 2315/90
Processo N.º 1.951/90
Data 30.05.90
<i>Blundo</i>
Serviço de Protocolo


Em cumprimento as exigências e formalidades, valho-me do presente, para pedir de Vossa Senhoria que nos envie um Arquiteto para a Elaboração de um Projeto de um Complexo Turístico, e, enfatizamos a Vossa Senhoria que já temos a área específica e que já encontra-se em fase de Construção um centro Comunitário, mas as Obras estão paradas por falta de recursos financeiro, e que pretendemo-nos ampliar toda área com um maravilhoso Complexo Turístico, sendo que Reserva do Cabaçal é um lugar privilegiado pela sua Beleza, e que no qual estamos pretendendo investir nesta área de Turismo na Nossa Cidade, onde-se encontra uns dos mais bonitos Rios da Nossa Região, que é o Rio Cabaçal.

Diante de todos expostos solicitados esperamos de Vossa Senhoria a máxima urgência para podermos encaminhar em algum órgão Estadual ou seja até mesmo através da CODEMAT.

Sem mais para o momento, esperamos contar com total apoio e pronto atendimento, e desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Francisco Sales
Francisco de Sales
-Prefeito Municipal-

Ao Exmo Sr.
JOÉ MOACIR WITCZAK
DO PRESIDENTE DA CODEMAT
CUBABÁ-MT

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.951/90

DE 30 / 05/90 AO

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

da 2ª Região - Curitiba - PR, com o objetivo de
realizar o levantamento dos dados da população e a
OP de melhorias do sistema de transporte de passageiros

01.05.90
1. Incl **DESPACHOS E INFORMAÇÕES**

A DOP MCA Alocada

de 30/05/90

Seg. 2ª Região

Unidade

Alocada

01.05.90

01.05.90

01.05.90

Para informar a disponibilidade

01.05.90

04.06.90

José Otto Costa Sampaio
Diretor de Operações
CODMAT

A D.P.R.

Para informar, conforme despacho supra

05.06.90

Maurício Lucio Naves
Coordenador da Dir. Operações
CODMAT

7 SEEP
Conforme despacho DOP

Em 05 JUN 90

Eng. Paulo César Homem de Melo
Chefe da Divisão de Projetos
CODMAT

A DPR.

Informamos que no momento, não podemos dispor de um arquiteto para atender a solicitação. Todos os nossos arquitetos estão com acúmulo de serviço até o final de julho de 90
ass. 220690


At. Clunil.

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
- CODEMAT -

À CEA/DIOP

Informamos que estão lotados no Setor de Elaboração de Projetos 03 (três) Arquitetos que estão executando Projetos de Implantação Industrial e Hoteleira em São Antonio. Disponibilizamos um Setor de Engenharia Civil que poderia fazer levantamento do Complexo Turístico solicitado.

Em 17/07/90



CH/DPR.

À Dir. de Operações

17.07.90

Com as informações supra, para deliberação.

17.07.90



Mauricio Lucio Montes
Coordenador da Dir. Operações
- CODEMAT -

À CEA/DIOP

Para providenciar a ida de um técnico ao município.


Em: 19.07.90

A D.P.R.


Benedito Rufino da Silva
Diretor de Operações
- CODEMAT -

Para atendimento do despacho Supra

19.07.90


Mauricio Lucio Montes
Coordenador da Dir. Operações
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º 1951/90 DE 30 / 05 / 90
INTERESSADO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO SESP

*Para atender a solicitação, conforme minuta
da Diretoria de Engenharia
Em 19/07/90*

[Signature] CODEMAT

Eng.º Rêlio Nunes de Oliveira JHh
CH/BPR.

UP 20 7

1951/10

10/10/51

PROFESSOR

10/10/51

Dear Sir,
I am writing to you
to inform you that
I have received your
letter of the 10th
inst.

Yours faithfully,
[Signature]

MUNICÍPIO

BRASNORTE

OBRA

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE

ASSUNTO

PLANILHA CONTENDO REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO
DO PROJETO SOLICITADO

DATA



CODEMAT

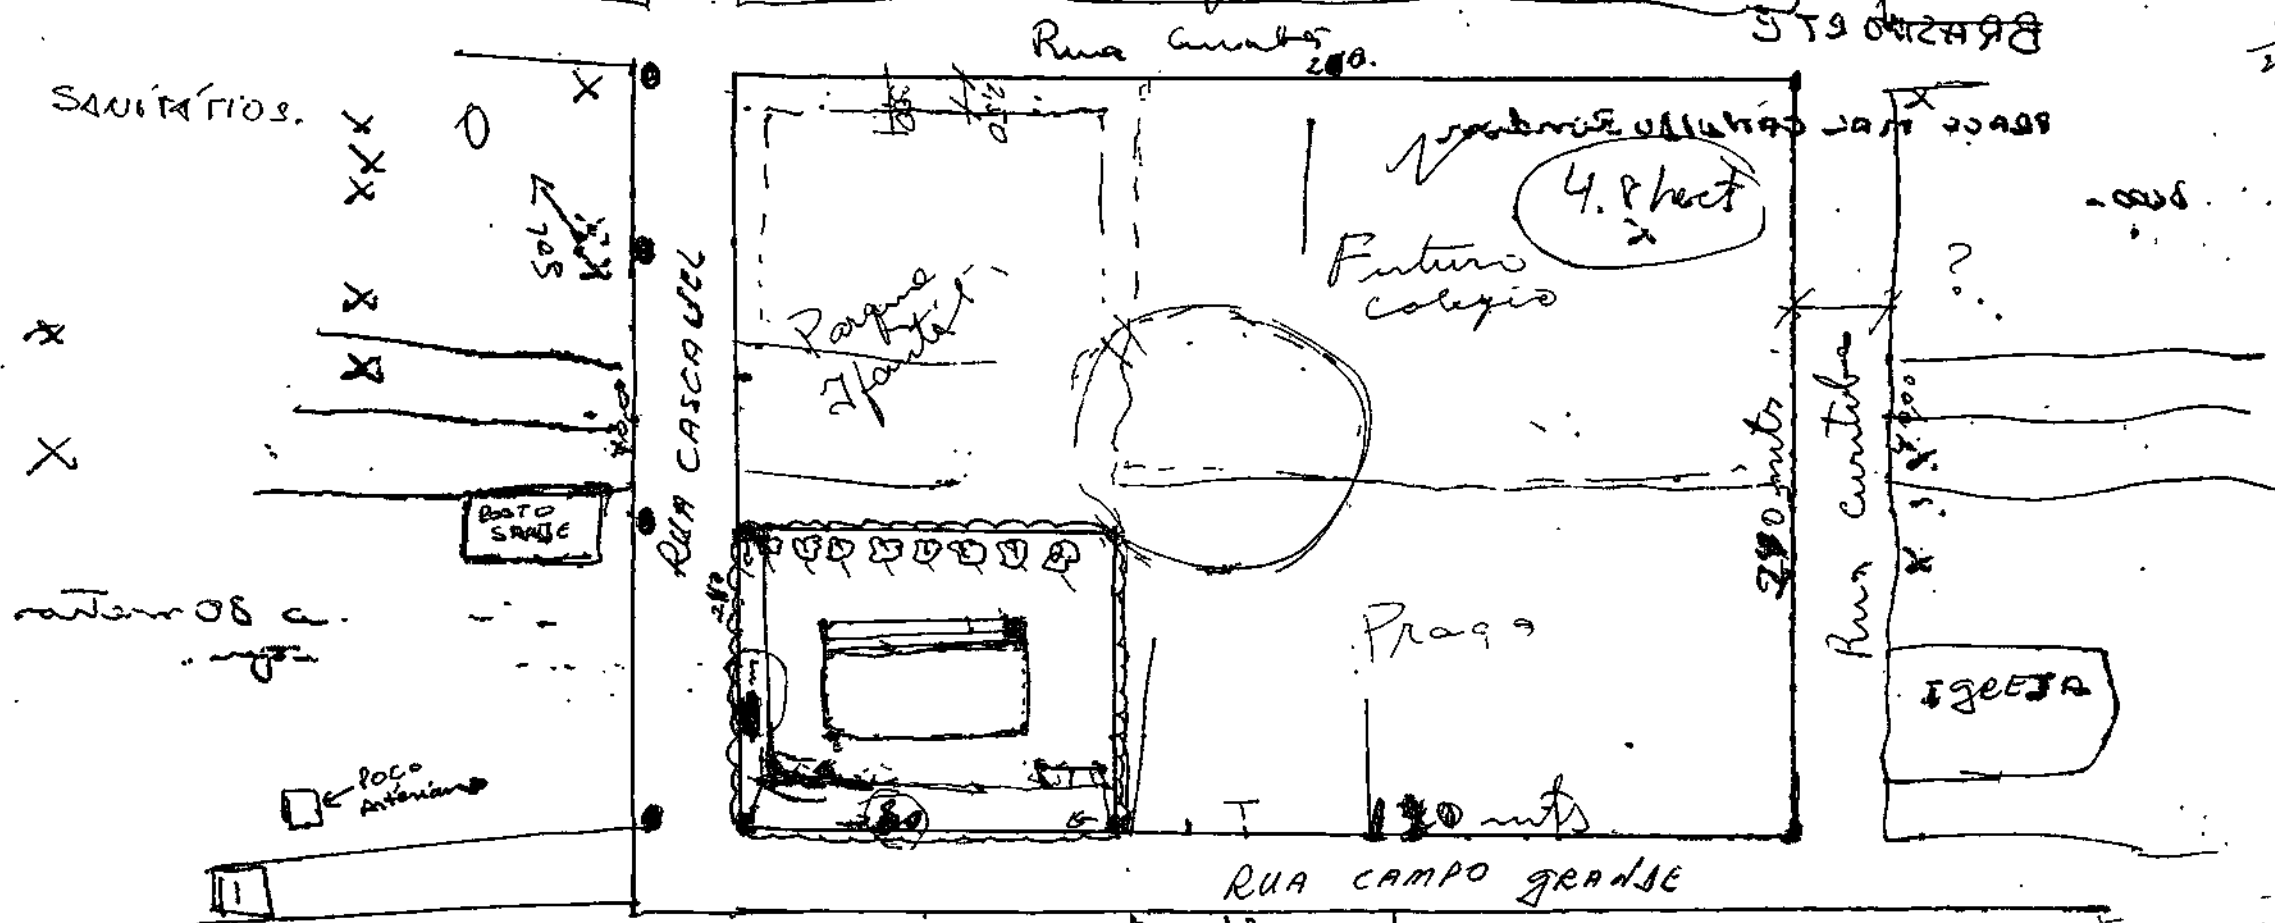
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O LEVANTAMENTO DE TERRENOS

[illegible]

Toda Infra-Estrutura existente deverá ser logada no Desenho (inclusive postes) indicar a melhor posição para ligação das
entradass de Serviço das instalações prediais as redes e sistemas das concessionárias de Serviço Público.

FAZER O CROQUI, Indicando as dimensões do terreno, sua localização em relação a quadra, orientação do sol, nome da rua de acesso e a transversal mais próxima, fazer corte esquemático indicando o sentido do desnível, local poste, melhor posição para ligações prediais, indicar árvores e construções existentes a preservar, outras informações.



1/4 = 20% = 80% Muro

16 = LUMINARIAS

mm = CERCA TELA 2,5 mts = ALTURA

→ Sol

● POSTES

□ = quadra

≡ = arborizada

Ad. PARANA.

CODEMAT	
Protocolo N.º	<u>5.194/90</u>
Processo N.º	_____
Data	<u>16</u> / <u>11</u> / <u>90</u>
<i>Almeida</i>	
Cópia up no Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 5.194/90

N.º PROCESSO: 4.541/90

DATA 16 / 11 / 90

INTERESSADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

ASSUNTO

**ENCAMINHA CÓPIA DA PLANTA BAIXA DA CÂMARA MUNICIPAL
QUE CONTÉM INFORMAÇÕES ENTÃO SOLICITADAS, CONFORME OF.
Nº 163/90.**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo



Peixoto de Azevedo (MT), em 30 de Outubro de 1.990

Ofic. C.M.P.A nº163/90

CODEMAT	
Protocolo N.º	5.394/90
Processo N.º	4.543/90
Data	16.11.90
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretor Presidente da Codemat

Em resposta ao Ofício nº 000723 de Setembro de 1.990, estamos enviando em anexo, cópia da Planta Baixa da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, que contém todas as informações em tão solicitadas.

Sem mais, aproveitamos para renovar nossas estima e apreço.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Itacir D. Longo
Secretário Administrativo



Ilmo. Sr.
João Moacir Witczak
M.D. Diretor Presidente da Codemat
Palácio Paiaguas
Cuiabá - MT


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.541/90

DE 16 / 11 / 90

INTERESSADO(A)



ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*À DIOR PARA PROVIDÊNCIAS -
20/11/90*
João E. Boagaz Witczak
Diretor Presidente
CODEMAT.


A DPR

*Para providências**Em: 21.11.90*
Benedito Rufino da Silva
Diretor de Operações
- CODEMAT -


A SEFI

*Encaminhamos o presente processo para aguardar solução**Em 21/nov/90*
Eng. Paulo Cesar Homem de Melo
Chefe da Divisão de Projetos
CODEMAT*A DPR (Eng.º Paulo C. H. de Melo):**Para as devidas providências, informo que o processo em questão, deverá ser encaminhado ao SEEP - Setor de Elaboração de Projetos (Chefe Eng.º Geraldo).**É o que tenho a informar!**Em, 22/11/90 -*
Eng.º Clail Luiz Costa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
- CODEMAT -

A SEEP

*Para aguardar solução**Em 22/nov/90*
Eng.º Paulo Cesar Homem de Melo
Chefe da Divisão de Projetos
CODEMAT

1 C1V



Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: 01

DATA 22 / 02 / 90


INTERESSADO _____

MUNICIPIO DE DOM AQUINO - MT.

ASSUNTO _____

PASTA TÉCNICA

CONSTRUÇÕES DE GALPÕES PARA EXPOSIÇÃO DE DOM AQUINO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE DOM AQUINO-MT

CONSTRUÇÃO DE 01(um) GALPÃO PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS

PASTA TÉCNICA

- 01- INTRODUÇÃO
- 02- FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO
- 03- CUSTOS

ANEXOS

- 01- PLANILHA DE ORÇAMENTO
- 02- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- 03- PROJETO - ARQUITETURA

Colm

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

01. INTRODUÇÃO

A obra a ser executada de acordo com a Pasta Técnica é a construção de um galpão para exposição de animais, no município de Dom Aquino em Mato Grosso, com 315,00m²

02. FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

A mesma será executada obedecendo as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e as especificações e projetos fornecidos pela CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

O prazo para seu término será de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do contrato de execução.

03. CUSTOS

Os custos totais importam em NCz\$ 804.258,84 (Oitocentos e quatro mil duzentos e cinquenta e oito cruzados novos e oitenta e quatro centavos)... a preços iniciais. O Reajustamento / se dará conforme fórmula abaixo, que obedecerá os índices de variação fornecidos pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, publicado pela Revista Construção (Coluna : 35)

$$R = \frac{I_i - I_o}{I_o} \cdot V$$

R = Valor do Reajustamento

I_o = Índice de preços verificados no mês do orçamento - base (janeiro 90).

I_i = Índice do mês de execução dos serviços

V = Valor de medição a ser reajustada.

Calder

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEEP

DATA

JANEIRO/90

PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESP.

ENGR. CARLOS E. CERQUEIRA CALDAS

OBRA
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO

LOCAL

DOM AQUINO - MT.

FOLHA Nº

01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</u>				
1.1	BARRACÃO DE DEPÓSITO:				
1.1.1	DEPOSITO	m ²	20,00	960,00	19.200,00
1.2.1	ALOJAMENTO E REFEITÓRIO	m ²	30,00	960,00	28.800,00
1.2	Instalação Provisória de água e esgoto	ud	1	7.488,00	7.488,00
	Instalação Provisória Luz e Força	ud	1	11.436,00	11.436,00
1.3	Placa da obra da CODEMAT conf. detalhe	ud	1	27.222,00	27.222,00
1.4	Locação da Obra com aparelho topográfico	m ²	315,00	12,00	3.780,00
	<u>2. TRABALHO DE TERRA</u>				
2.1	ABERTURA DE VALAS				
01.1	Escavação em Material de 1ª categoria, terra em geral, pizarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, c/ diametro máximo de 15 cm, inclusive remoção do material para as laterais.	m ³	20,64	90,00	1.857,60
2.2	Reaterro das Valas c/ apiloamento	m ³	6,19	60,00	371,40
2.3	Aterro entre baldrame executado em camadas de 20 cm, umedecido e fortemente apiloado, incluindo-se o transporte do material numa distância de 03 Km, além de carga, descarga e espalhamento manual	m ³	31,5	105,00	3.307,50
					5.536,50

Calder

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEEP

DATA

JANEIRO/90

PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESP.

Engº. CARLOS E. CERQUEIRA CALDAS

OBRA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA PARQUE DE EXPOSIÇÃO

LOCAL

DOM AQUINO-MT.

FOLHA Nº

02

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3. FUNDAÇÕES				
3.1	Sapatas de concreto no traço 1:2 ¹ / ₂ :3	m ³	1,94	2.370,00	4.597,80
	Forma comum de madeira incluindo desforra e gravatas obedecendo um espaçamento máximo de 40 cm	m ²	23,32	276,00	6.436,32
	Ferragem para concreto de aço CA 50	Kg	174,60	33,00	5.761,00
	Lastro de concreto magro, traço 1:3:6 cm de espessura e aumento de 10 cm em cada dimensão da sapata, lançado antes da concretagem para regularizar o fundo da mesma	m ³	0,48	1.950,00	936,00
3.2	Tubo de pilar concreto traço 1:2 ¹ / ₂ :3	m ³	1,54	2.370,00	3.649,80
	Forma	m ²	18,48	276,00	5.100,48
	Ferragem aço CA 50	Kg	138,60	33,00	4.573,80
3.3	Vigas baldrame				
	Concreto no traço 1:2 ¹ / ₂ :3	m ³	8,64	2.370,00	20.476,80
	Forma comum conf, especificado acima	m ²	103,68	276,00	28.615,68
	Ferragem Aço CA 50	Kg	777,60	33,00	25.660,80
	04. IMPERMEABILIZAÇÃO				
4.1	Impermeabilização das Vigas de fundação c/ 2 demão de neutrol 45	m ²	115,2	63,00	7.257,60
					113.066,88

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR SEEP

DATA JANEIRO/90

PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESP. ENGE. CARLOS E. CERQUEIRA CALDAS

OBRA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO S. RURAL

LOCAL DOM AQUINO - MT.

FOLHA Nº 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5. ESTRUTURA					
5.1	Pilares, e vigas em concreto armado	m ²	378,00	726,00	274.428,00
					274.428,00
6. ALVENARIA					
6.1	Alvenaria de tijolo cerâmico de 06 furos assentes com argamassa mista de cal e areia ao traço de 1:2:8, de 1 vez	m ²	103,40	420,00	43.428,00
					43.428,00
7. COBERTURA					
7.1	Cobertura com chapa ondulada de cimento amianto de 5 mm de espessura	m ²	390,32	123,00	48.009,36
					48.009,36
8. FECHAMENTO LATERAL					
8.1	Estrutura metálica ou de concreto, suporte do fechamento lateral	m ²	123,90	114,00	14.124,60
8.2	Fechamento lateral em chapa de cimento amianto de 5 mm espessura	m ²	123,90	135,00	16.726,50
					30.851,10
9. PISOS					
9.1	Preparo do contrapiso, apiloamento	m ²	315,00	48,00	15.120,00
9.2	Contrapiso e piso de concreto ao traço 1:3: 4 C/ 6 cm espessura	m ²	315,00	159,00	50.085,00
9.3	Piso em volta do prédio constituído por lastro de concreto de 200 Kg, Cím/m ³ c/ 6 cm de espessura dividido em cada 2m por ripas de peroba de 7 X 1,2 Cm impermeabilizadas formando juntas de dilatação o serviço inclui apiloamento prévio-largura da calçada de 1,00 m	m ²	72	204,00	14.688,00
					79.893,00
10. BEBEDOUROS E COMEDOUROS					
10.1	Alvenaria	vb			60.000,00

**C O D E M A T**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEEP

DATA

JANEIRO/90

PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESP.

ENGR. CARLOS E. CERQUEIRA CALDAS

3RA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE EXPOSIÇÃO DO S. RURAL

LOCAL

DOM AQUINO - MT.

FOLHA Nº

04

EM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>11. PINTURA</u>				
1.1	Pintura em estrutura metálica, incluindo-se limpeza c/ escova de aço e 02 demãos de zarcão	m ²	315,00	48,00	15.120,00
	Instalação elétrica -	vb			15.000,00
	Instalação hidráulica e sanitária -	vb			21.000,00
	TOTAL.....				NCZ \$ 804.258,84
	(C Dito centos e quatro mil duzentos e cinquenta e oito cruzados novos e oitenta e quatro centavos)				

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICIPIO:

DOM AQUINO - MT

SETOR:

SEEP

DATA:

JANEIRO/90

PROJETO:

GALPÃO PARA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS (EXPO-AGRO)

EXECUTOR:

FOLHA Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90			
01	Serviços Preliminares	—			97.926,00		
02	Trabalhos em terra	—			5.536,50		
03	Estrutura- fundação impermeabilização	—			113.066,88		
04	Estrutura de cobertura		—		274.428,00		
05	Alvenaria		—		103.428,00		
06	Cobertura/fechamentos laterais		—		78.860,46		
07	Pisos-Pavimentações			—	79.893,00		
08	Instalação Elétricas (BT)			—	15.000,00		
09	Instalação Hidro-Sanitárias		—		21.000,00		
10	Pintura (est. metálica)			—	15.120,00		
	(%)	19,90	57,76	22,34	100,00		
	SUB-TOTAL	159.995,94	464.604,54	179.658,36			
	TOTAL GERAL				804.258,84		

OBSERVAÇÃO :

CUIABÁ - MATO GROSSO 18 / janeiro / 1.990

Ncz\$ 268.086,28 (Duzentos e sessenta e oito mil oitenta seis
cruzados novos e vinte oito centavos).

CODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - CPA

140588 000829

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 829/89

Nº PROCESSO: 569/89


DATA 01 / 03 / 89

INTERESSADO

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB DE DOM AQUINO

ASSUNTO

SOLICITA PROVIDENCIAS DESTA CIA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA
O SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB

CEP 78.630

DOM AQUINO

MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	829/89
Processo N°	569/89
Data	01.03.189
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

Dom Aquino, 01 de março de 1989

Senhor Presidente:

O Diretório Municipal do PMDB de Dom Aquino, vem apresentar os seguintes esclarecimentos:

1) - O Diretório testemunhou um acordo verbal realizado em outubro de 1987, no qual o Sr.: Wilson Furtado de Mendonça - doaria ao Estado (CODEMAT) uma área de Terra para a criação do Cinturão Verde do Rio Mutum, ao mesmo tempo o Governador prometeu que a CODEMAT construiria 02 (dois) Galpões Baías no Parque de Exposições de propriedade do Sindicato Rural de Dom Aquino;

2) - Há poucos dias o Diretório foi procurado pelo Sr.: Wilson Furtado de Mendonça que é o Presidente do Sindicato Rural de Dom Aquino, pedindo informações com relação ao acordo supracitado.

Diante do exposto vimos mui respeitosamente, solicitar:

- a) - Em que pé anda o referido acordo e
- b) - Caso na CODEMAT não conste tal solicitação (acordo), pedimos ao Sr.: Presidente que entre em contato com o Sr.: Governador do Estado, no sentido de providenciar a construção dos dois Galpões do Sindicato Rural de Dom Aquino.

Certos de sermos compreendidos e atendidos em nossas solicitações, subscrevemo-nos:

[Assinatura]
DIOCELIANO FELIPE OLIVEIRA - PRESIDENTE

[Assinatura]
JOSE BEZERRA ARAUJO - SECRETÁRIO

[Assinatura]
JOÃO ALBINO FILHO - TESOUREIRO

Obs.: Seguem fotocópias dos Mapas dos Galpões e do orçamento feito em 10/87

Exmo. Dr.:

JAIR BENEDITTI
MD. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: Parque de Exposições (Galpões)

LOCAL: Dom Aquino-Mt.

Complementação da Planilha de Orçamento

MARÇO/89

Atualização do orçamento de 07/10/87 da firma CANAET

TI JR - Engenharia e Construções Ltda

A - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS

DESCRIÇÃO	VALOR NCz\$
01. Alojamento	2.374,92
02. Limpeza do terreno	120,93
03. Locação da obra	424,27
04. Escavações	482,39
05. Apiloamento	86,89
06. Mão de obra de carpinteiro	682,91
07. Desmoldagem de formas	51,43
08. Mão de obra de armador	903,33
09. Alimentação	958,98
10. Salário do mestre de obras	697,44
	<u>697,44</u>
SOMA	NCz\$ 6.783,49

B - DESPESAS INDIRETAS

Projetos	414,10
Taxas	179,00
Cópias heliográficas	70,47
Viagens e fiscalização	531,80
	<u>531,80</u>
SOMA	NCz\$ 1.195,37


C - TRANSPORTE DE MATERIAL

NCz\$ 3.132,00

R E S U M O

01. Material (planilha)	47.586,69
02. Mão de obra	6.783,49
03. Despesas indiretas	1.195,37
04. Transporte	3.132,00
05. Administração da obra (7%)	4.108,79
	<u>4.108,79</u>
TOTAL	NCz\$ 62.806,34

NCz\$ 62.806,34 (Sessenta e dois mil, oitocentos e seis cruzados novos e trinta e quatro centavos)

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**SETOR
SEEPDATA
MAR/89**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO****EM DIREÇÃO AO SOCIAL****PLANILHA DE ORÇAMENTO**RESP.
Engº. Carlos Edmundo Caldas

OBRA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SINDICATO RURAL


LOCAL

DOM AQUINO

FOLHA Nº

01/4

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
A.	<u>ALOJAMENTO DOS OEPERARIOS</u>				
A.1.	- Telha de fibrocimento (0,50 x 2,44 m)	un	85	14,90	1.266,50
A.2.	- Chapa de compensado pinho com 6,mm espessura 2,20 x 1,60 m	un	120	9,15	1.098,00
A.3.	- Madeiramento para construção e mobiliario	m3	03	300,00	900,00
A.4.	- Utensilios de cozinha	cj	1	-	20,00
A.5.	- Colchões para operarios	un	15	10,00	150,00
A.6.	- Inst. Elétrica, Hidráulica Sanitária	cj	1	20,00	20,00
A.7.	- Cimento, areia, e brita para piso	m3	06	80,00	480,00
B.	<u>LOCAÇÃO DA OBRA</u>				
B.1.	- Madeiramento (ripões) e caibros)	m3	01	392,60	392,60
B.2.	- Linha de nylon e pregos	cj	01	-	20,00
C.	<u>MADEIRAMENTO PARA FORMAS</u>				
C.1.	- Tocos de Pilares	m2	44	6,98	307,12
C.2.	- Vigas baldrames	un	195	6,98	1.361,10
C.3.	- Pilares	un	45	6,98	314,10
C.4.	- Cinta de amarração	un	72	6,98	502,56
C.5.	- Pilaretes de amarração	un	34	6,98	237,32
C.6.	- Bebedouros e comedouros	un	168	6,98	1.172,64
C.7.	- Pregos 18 x 24	kg	112	6,98	781,76
	-				
	Total.....				9.023,70

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**SETOR
SEEPDATA
MAR/89**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RESP.

OBRA
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SINDICATO RURALLOCAL
DOM AQUINOFOLHA Nº
02/04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
D.	- Aço para Construção CA 50/60 "B"	kg	5.690	0,69	3.926,10
	- Arame recozido	kg	170	0,90	153,00
E.	- Concreto Estrutural com FCK = 150 - kg F	m3	70	93,72	6.560,40
	- Concreto magro FCK 100 kgf/cm2 (112)	m3	46	87,00	4.002,00
F.	- <u>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</u>				
F.	- Tijolo furado	milh.	9,5	100,00	950,00
G.	- <u>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</u>				
G.1.	- Quadro de distribuição para 04 disjuntores	un	1	7,00	7,00
G.2.	- Disjuntores termo magnéticos 20A monopolar 110/220	un	3	5,90	17,70
G.3.	- Fiação condutor a 2,5mm2 atichama - 750V	mm	250	0,32	80,00
G.4.	- Eletroduto de alimentação conduit PVC rígido atichama 19 mm	un	150	8,45	1.267,50
G.5.	- Luminária metálica com plafonier para lampada 250 W	un	30	19,00	570,00
G.6.	- Lampadas mistas de 250 Wtts	un	30	7,00	210,00
G.7.	- Caixas de passagem octognal de fundo movei 100x100	un	33	2,50	82,50
TOTAL.....					26.849,90

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR SEEP

DATA
MAR/89

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RESP.

OBRA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SINDICATO RURAL

LOCAL

DOM AQUINO

FOLHA Nº 03/04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
H.	<u>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</u>				
H.	- Tubo de PVC rígido 3/4" EB ÷ 892/ABNT (água) soldável	br	12	5,77	69,24
H2.	- Registro de pressão de 3/4"	un	2	22,00	44,00
H.3	- Conexão de PVC de 3/4"	un	52	0,50	26,00
H.4	- Torneira de 3/4"	un	2	1,15	2,30
I.	<u>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</u>				
I.1	- Tubos de PVC Ø 2" água (soldável)	br	12	20,60	247,20
I.2	- Registro de gaveta galvanizado 2"	un	2	32,00	64,00
I.3	- Ralos simples com tampa de PVC 10x10	un	50	1,80	90,00
I.4	- Tees de PVC de 2"	un	50	5,20	260,00
J.	<u>SUMIDOURO</u>				
J.1.	- Tijolos maciços	milh.	1,00	70,00	70,00
J.2.	- Tubo de PVC Ø 2" EB 608/ABNT Esgoto	br	19	11,55	219,45
J.3.	- Conexões de PVC Ø 2"	un	8	0,50	4,00
J.4.	- Aço de construção	kg	30	0,69	20,70
J.5.	- Concreto FCK 135 kgf/cm2	m3	1	90,50	90,50
TOTAL.....					28.057,29

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEEP

DATA

MAR/89

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RESP.

Engº. Carlos Edmundo Caldas

OBRA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SINDICATO RURAL

LOCAL

DOM AQUINO

FOLHA Nº

04/04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
K.	<u>IMPERMEABILIZAÇÃO</u>				
K.1	- Neutrol (18 litros)	Lt	06	29,90	179,40
K.2	- Vedacit (massa de assentamento) lata 18 litros	Lt	2	13,00	26,00
L.	<u>PINTURA DE ACABAMENTO</u>				
L.1	- Verniz de alvenaria (3,6 lt)	gl	35	14,00	490,00
L.2	- Cal (sacos de 8kg)	un	25	1,80	45,00
L.3	- Tinta anti-ferugem (zarcão)	gl	23	18,00	414,00
M.	<u>COBERTURA METÁLICA</u>				
M.1	- Telhas de aço galvanizado	m2	525	35,00	18.375
M.2	- Estrutura metálica com 6 tesouras completas	m2	525		
TOTAL.....					47.586,69

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9559
CBC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
LOCAL.....: DOM AQUINO
DATA.....: 07/10/87

PROPOSTA ORCAMENTARIA

ATT. : DR. WILSON FURTADO DE MENDONCA

Prezados senhores,

Vimos pela presente submeter a vossa apreciação, nossa proposta para execução dos galpões baixos com dimensões de 15,00 x 35,00 metros de área construída, conforme projeto que nos foi apresentado. Os projetos de cálculo estrutural, instalações elétricas e hidráulicas serão desenvolvidos por nós, ficando incluídas as responsabilidades técnicas sobre os mesmos. Em anexo segue além das considerações iniciais uma descrição da obra, quantificação dos materiais utilizados, resumo da obra orçada e fotografias ilustrativas de galpão idêntico ao pretendido por V.Sas. localizado no Parque de Exposições de Cuiabá. Informamos que dispomos de equipamentos apropriados e pessoal especializado para iniciarmos a obra de imediato. Comunicamos também que nosso trabalho é semanalmente fiscalizado por engenheiro responsável.

Sendo o que tínhamos para a oportunidade ficamos na expectativa de vossa atenção para o exposto.

Atenciosamente,


Euclides Canhetti Junior
CANHETTI JR. - Eng. e Const. Ltda.



CANHETTI JR.
engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9359
 CGC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. EXECUCAO DOS SERVICOS:

A execucao dos servicos obedecera' rigorosamente todas as normas constantes da presente especificacao e normas de servicos da ABNT. A mao-de-obra e o material a empresar serao de 1. qualidade e o acabamento esmerado.

2. PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO:

A obra sera' executada em total observancia das indicacoes constantes nos projetos construtivos por nos recebidos: arquitetônico e esgoto. Sera' desenvolvido por nos os projetos complementares dos esforços nas estruturas de concreto armado e cobertura metalica, bem como o dimensionamento da instalacao eletrica.

3. INSTALACOES PROVISORIAS E LOCACAO:

As instalacoes provisórias compreendem: alojamento, barracoes de servico, instalacoes preliminares de agua e luz, que darao perfeitas condicoes e funcionalidade ao trabalho.

A locacao da obra sera' rigorosa observando os alinhamentos com as demais edificacoes, referencias de divisa e executada por topografo qualificado.

4. TRABALHO EM TERRA:

A limpeza do terreno sera' completa, oferecendo a area totalmente livre a construçao e circulação. O movimento de terra sera' adequado para se obter o perfil da superficie exigido pelo projeto de construçao, devendo o mesmo ser entregue pela contratante executado.

5. FUNDACOES:

As fundações em sapatas diretas, armadas, profundidade e dimensoes para atender as cargas previstas e taxa admissivel do solo especificados em calculo estrutural.

6. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:

A estrutura sera' em concreto armado $f_{ck}=150 \text{ kgf/cm}^2$, todas as pecas serao bem alinhadas e apuradas tomando cuidado especial com a confeccao das formas, mantendo boa uniformidade. A execucao da ferragem seguira' rigorosamente os detalhes estruturais, sendo utilizado o aco especial CA 50/60 tipo "B" isenta de residuos graxos, oleosos, oxidos ou qualquer outros corpos estranhos que prejudiquem a aderência. Nenhuma concretagem sera' realizada sem a aprovacao previa dos servicos de armação e formas por parte do responsavel tecnico.



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9559
 CGC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

7. ALVENARIA:

As paredes divisorias serão de tijolos furados, assentes com argamassa de cimento e areia no traço recomendado, regularmente colocados, com juntas alternadas de modo a obter-se boa amarração, perfeitamente niveladas e apuradas nos alinhamentos e dimensões indicadas nos projetos e detalhes arquitetônicos.

As paredes serão executadas com espessuras de 20 centímetros, ou seja, de 1 vez ou chato, consumindo um total de 50 tijolos cada metro quadrado.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO:

As vigas baldrame, tocos de pilares, bases das alvenarias, bebedouros e demais peças em contato com o meio agressivo receberão tratamento apropriado com impermeabilizantes específicos recomendáveis pelos fabricantes, como o neutrol-45, sika-1 e vedacit.

9. CONTRAPISO E PISO CIMENTADO:

Será executada uma compactação em todo o terreno que receberá o contrapiso. O apiloamento será realizado com boa técnica e umidade adequada. O contrapiso de concreto terá espessura de 8 centímetros, e sem descontinuidade, sarrafeado de modo a cobrir inteiramente a superfície especificada.

O piso cimentado liso queimado será executado na cor natural do cimento, com junta de sarrafo de madeira seca a cada 1,50 metros, e a argamassa utilizada será no traço de 1:3 de cimento e areia.

A calçada externa lateral será executada também em concreto desempenado com espessura de 5 centímetros e largura de 70 centímetros.

10. COMEDOUROS E BEBEDOUROS:

A execução dos comedouros e bebedouros seguirá criteriosamente as dimensões e espaçamentos conforme os detalhes do projeto arquitetônico. Serão também obedecidas as declividades apropriadas para sua utilização.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações de luz seguirão a partir do quadro de distribuição com chave de disjuntores termo-magnéticos. Seguirão ramais de alimentação obedecendo o projeto elétrico, as normas da CEMAT e as prescrições gerais da NB-3.

Os eletrodutos de alimentação terão diâmetro mínimo de 1/2" e os condutores bitola mínima de 1,5 mm² serão do tipo anti-chama, marca Pirelli ou Siemens. Toda a tubulação ficará aparente e pendurada nas treliças metálicas distribuídas em série pelo galpão. As luminárias serão tipo industrial metálica, pendentes fixadas de forma a não formar sombra em zonas altamente iluminadas sendo a lâmpada mista de 250 watts.



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construcoes Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiaba'/MT. - fone: (065) 321-9559
 CGC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

12. ABASTECIMENTO DE AGUA:

Todo o abastecimento de agua seguira' a partir da entrada de cada galpao, sera' direta e ramificada conforme a localizacao dos bebedouros, sendo que, para cada lateral ou serie de 25 bebedouros se instalara' um registro de pressao que irrigara' os mesmos simultaneamente. A canalizacao de distribuicao utilizada sera' de PVC, com bitolas e conexoes especificadas em projeto hidraulico e ficara' totalmente embutida.

13. LIMPEZA E ESGOTO:

Sera' executada a limpeza atraves de ralos simples colocados no fundo de cada bebedouro, ligados entre si atraves de tubulacao de PVC com diametro de 2" e declividade apropriada para escoamento. Atraves de registro de gaveta em cada serie de bebedouros mantem-se o nivel de agua ou faz-se o escoamento para a limpeza. Esta tubulacao seguira' juntamente com a dos outros galpoes para um sumidouro executado em tijolos macicos crivados.

14. COBERTURA METALICA:

A cobertura metalica sera' executada com tesouras de aço em cantoneiras de abas iguais com perfil laminado em "L" duplo, constituida de montantes e diagonais com beiral, mao-francesa e srau de inclinacao conforme projeto arquitetônico. A telha aplicada sera' a de aço zincado em chapas devidamente presas atraves de pinos com rosca e vanchos de fixacao montados com conjunto de vedacao elastico.

15. ACABAMENTO E PINTURA:

Os galpoes baias terao um acabamento simples, restringindo-se a pinturas nos pilares e nas visas de amarracao, demao de verniz nas alvenarias aparentes e um tratamento anti-corrosivo na estrutura metalica da cobertura. Toda a obra sera' entregue devidamente limpa e livre de entulhos e restos de materiais.

obs: A opcao em se adotar pilares de concreto armado fora em virtude da sua conveniencia em relacao a madeira e ao aço, por estes serem de resistencia inferior a acao agressiva das urinas animais, e seu custo ser equivalente.



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9559
 CGC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

QUANTIFICACAO DOS MATERIAIS EMPREGADOS:

Apresentamos abaixo uma relacao dos materiais utilizados para a confeccao de uma unidade de galpao baia, devendo as unidades serem multiplicadas por 4 (quatro) para se obter a totalidade dos materiais gastos na obra completa, exceto os empregados para mais de um galpao, como e' o caso do alojamento, sumidouro e madeira para formas cujo aproveitamento possibilita uma utilizacao em todos os galpoes se usada com bastante cuidado.

A). ALOJAMENTO PARA OS OPERARIOS:

-telhas de fibrocimento (0.5x2.44)..... 85 un
 -chapas de compensado (6.0 mm).....120 un
 -madeiramento para sustentacao e mobiliarios..... 03 m3
 -utensilios de cozinha..... 01 cj
 -colchoes para operarios..... 15 un
 -instalacao eletrica, hidraulica e sanitaria..... 01 cj
 -cimento, areia e brita para piso..... 06 m3

B). LOCACAO DA OBRA:

-madeiramento (ripos e caibros)..... 01 m3
 -linha de nylon e pregos..... 01 cj

C). MADEIRAMENTO PARA FORMAS:

-tocos de pilares..... 44 m2
 -vigas baldrame.....195 m2
 -pilares..... 45 m2
 -cintas de amarracao..... 72 m2
 -pilaretes de amarracao..... 34 m2
 -bebedouros e comedouros.....168 m2

obs: perfaz-se um total de 14 m3 de madeira.
 pregos aproximadamente: 112 kg (18x24)



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9559
 CGC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

D). AÇO DE CONSTRUÇÃO CA-50/60 "B":

-sapatas centradas (12 un).....	408 kg
-blocos de fundação (24 un).....	432 kg
-tocos de pilares (36 un).....	540 kg
-pilares (12 un).....	46 kg
-vigas baldrame (216 metros).....	1944 kg
-pilaretes de amarração (56 un).....	504 kg
-cintas de amarração (143 metros).....	715 kg
-bebedouros e comedouros (50 un).....	595 kg

obs: perfaz-se um total de 5.690 kg de aço.
 arame recozido: 170 kg.

5.184 kg

E). CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=150 KGF/CM2:

-sapatas centradas	11 m3
-blocos de fundação	9 m3
-tocos de pilares	3 m3
-pilares	3 m3
-vigas baldrame	20 m3
-cintas de amarração	8 m3
-pilaretes de amarração	4 m3
-bebedouros e comedouros	12 m3

70 m3

. CONCRETO MAGRO COM FCK=100 KGF/CM2:

-contrapiso com 525 m2	42 m3
-calçada com 72 m2	4 m3

46 m3

obs: consumo de materiais por m3: .cimento340 kg
 .areia0,64 m3
 .brita 10,26 m3
 .brita 20,62 m3

F). ALVENARIA DE ELEVACAO:

-mureta com altura de 95 cm	67 m2
-mureta com altura de 115 cm	83 m2
-respaldo dos bebedouros e comedouros	35 m2

obs: o consumo total e' de 9.500 tijolos furados.

185 m2



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construções Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-9559
 CBC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

G). INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

-quadro de distribuição 01 un
 -disjuntores termo-magnético 03 un
 -fiação condutora 250 mt
 -eletroduto de alimentação 150 mt
 -luminárias metálicas com plafonier 30 un
 -lâmpadas mistas com 250 watts 30 un
 -caixa de passagem 33 un

H). INSTALAÇÃO HIDRAULICA:

-canos de pvc de 3/4" 12 br
 -registros de pressão em pvc de 3/4" 02 un
 -conexões de pvc de 3/4" 52 un
 -torneiras 02 un

I). INSTALAÇÃO SANITARIA:

-tubos de pvc de 2" 12 br
 -registros de gaveta galvanizado de 2" 02 un
 -ralos simples com tampa de pvc 50 un
 -tees de pvc de 2" 50 un

J). SUMIDOURO:

-tijolos maciços 1000 un
 -tubos de pvc de 2" 19 br
 -conexões de pvc de 2" 08 un
 -aço de construção 30 kg
 -concreto fck=135 kgf/cm² 1 m³

K). IMPERMEABILIZAÇÃO:

-neutrol (18 litros) 06 lt
 -vedacit (massa de assentamento) 30 kg



CANHETTI JR.
 engenharia e construções ltda.

CANHETTI JR. - Engenharia e Construcoes Ltda.

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiaba'/MT. - fone: (065) 321-9559
CNC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
LOCAL.....: DOM AQUINO
DATA.....: 07/10/87

L). PINTURA DE ACABAMENTO:

-verniz de alvenaria (3,6 litros)..... 35 lt
-cal (saco de 8 kg)..... 25 un
-tinta anti-ferrugem zarcão..... 80 lt

M). COBERTURA METALICA:

-telhas de aço galvanizado 525 m2
-estrutura metalica (tesouras completas)..... 06 un

PROPOSTA ORCAMENTARIA

Todos os materiais a serem empregados, bem como seus transportes para o Parque de Exposicao estão inclusos na presente proposta orçamentaria, assim como as demais despesas com a permanencia e alimentacao dos operarios. Caso haja interesse do contratante no fornecimento de alguns dos materiais, retira-se do valor total o custo dos mesmos e apresenta-se nova proposta.

O prazo para entrega dos servicos sera' de 90 dias a partir do contrato para a execucao da obra.

Abaixo apresentamos o orçamento para a execucao de 01 (um) galpão, sendo que os demais terão seus custos amenizados em consequencia do reaproveitamento de alguns materiais.

O valor da proposta apresentada tem com base as Obrigações do Tesouro Nacional (OTN's), que nesta data, corresponde a Cz\$ 424,51.

As condições de pagamento serão em parcelas mensais conforme o andamento da obra, como abaixo discriminamos:

- ENTRADA NA ASSINATURA DO CONTRATO: 1.945,9739 OTN's
- 30 DIAS APOS: 1.945,9739 OTN's
- 60 DIAS APOS: 1.945,9739 OTN's
- APOS O TERMINO DA OBRA: 648,6582 OTN's

Valor total da obra: 6.486,5799 OTN's. que nesta data corresponde a Cz\$ 2.753.618,00 (Dois milhoes, setecentos e cinquenta e tres mil, seiscentos e dezoito cruzados).



CANHETTI JR.
engenharia e construções ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construcoes Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiaba'/MT. - fone: (065) 321-9559
 CBC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.946-5.

=====

OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

Apresentamos abaixo uma relacao dos custos que levaram ao total referido. Nesta relacao discriminam-se os materiais e mao-de-obra:

- projeto estrutural, hidraulico e eletrico.....	Cz\$ 28.500,00 ✓
- taxas de ART, CREA e ISS	Cz\$ 12.325,00 ✓
- copias heliograficas.....	Cz\$ 4.850,00 ✓
- alojamento de obra	Cz\$ 163.450,00 ✓
- maquinas e ferramentas	Cz\$ 47.355,00 ✓
- limpeza do terreno	Cz\$ 8.323,00 ✓
- locacao dos eixos para demarcacao	Cz\$ 29.200,00 ✓
- gabarito com cavaletes de madeira.....	Cz\$ 5.836,00 ✓
- escavacoes das sapatas, blocos e vigas baldrame.....	Cz\$ 33.205,00 ✓
- apiloamento de fundo das valas.....	Cz\$ 5.987,00 ✓
- madeira para formas	Cz\$ 81.233,00
- pregos 18x24	Cz\$ 9.280,00
- mao-de-obra com carpinteiro.....	Cz\$ 47.061,00 ✓
- desmoldante para formas.....	Cz\$ 3.544,00 ✓
- fornecimento aco CA 50/60-B.....	Cz\$ 258.050,00
- arame recozido	Cz\$ 15.470,00
- mao-de-obra com armador.....	Cz\$ 62.169,00 ✓
- preparo e lancamento concreto fck=150 kgf/cm2.....	Cz\$ 294.112,35
- preparo e lancamento concreto fck=100 kgf/cm2.....	Cz\$ 181.261,00
- impermeabilizacoes.....	Cz\$ 14.597,00
- movimentacao e compactacao de terra contrapiso.....	Cz\$ 5.328,00
- cimentado desempenado.....	Cz\$ 8.994,00
- calçada ao redor	Cz\$ 4.262,00
- alvenaria de elevacao.....	Cz\$ 75.555,15
- instalacoes eletricas.....	Cz\$ 91.258,55
- instalacoes hidraulicas.....	Cz\$ 15.662,00
- instalacoes sanitarias e limpeza.....	Cz\$ 17.210,00
- sumidouro e instalacoes.....	Cz\$ 31.880,00
- despesas alimentares para 90 dias.....	Cz\$ 66.000,00
- salario com mestre-de-obras.....	Cz\$ 48.000,00 ✓
- despesas com viagens e fiscalizacao.....	Cz\$ 36.600,00 ✓
- cobertura metalica.....	Cz\$ 643.500,00

obs: O custo da estrutura metalica fora cotado na firma :
 Vertice Estruturas Metalicas Ltda - Varzea Grande, estan-
 do incluso a montagem e transporte.



CANHETTI JR.
 engenharia e construções Ltda.

=====

CANHETTI JR. - Engenharia e Construcões Ltda.

=====

Rua Rui Barbosa, 165/A - centro - Cuiabá/MT. - fone: (065) 321-2577
 CEC. 03.235.298/0001-07 INSC. EST. 13.053.944-3

=====

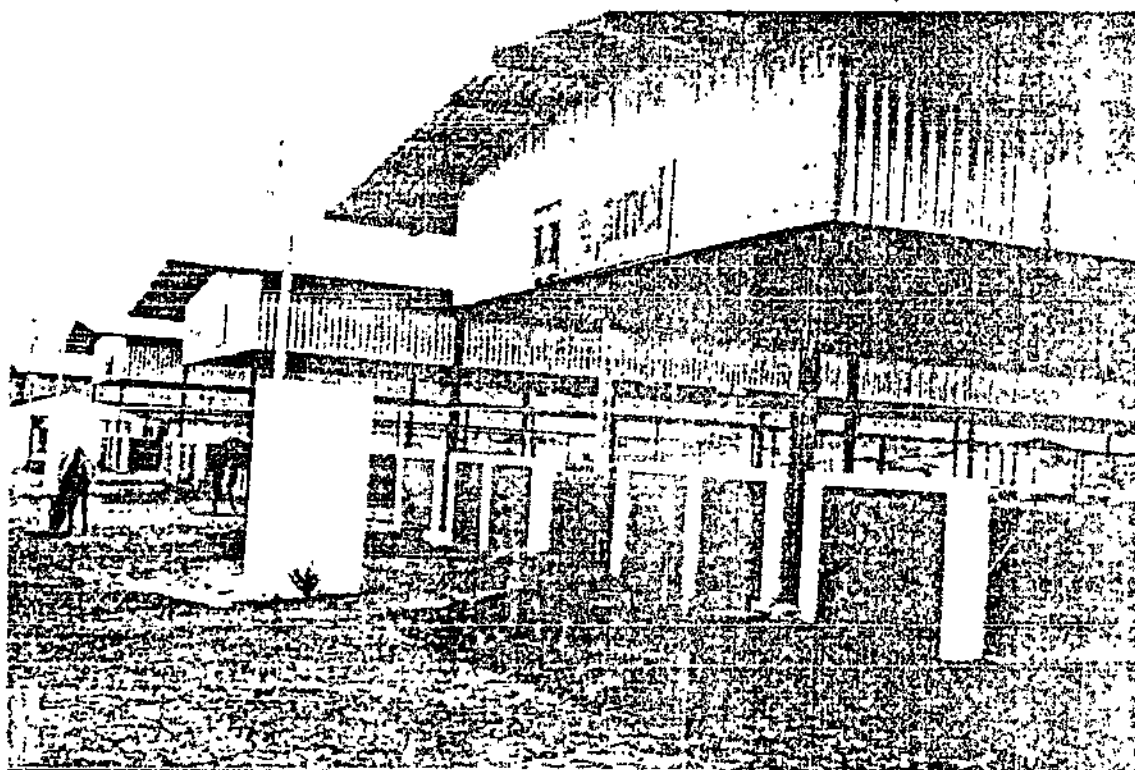
OBRA.....: PARQUE DE EXPOSICOES
 PROP.....: SÍNDICATO RURAL DE DOM AQUINO-MT.
 LOCAL.....: DOM AQUINO
 DATA.....: 07/10/87

- transportes de materiais:


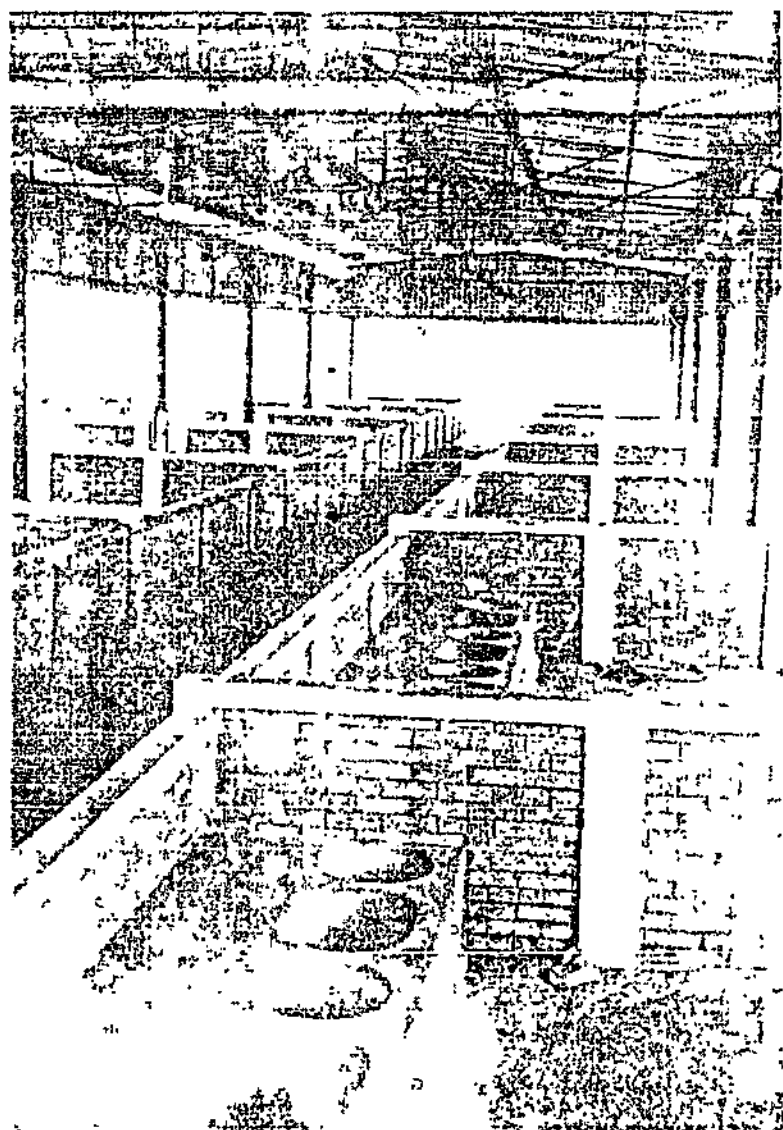
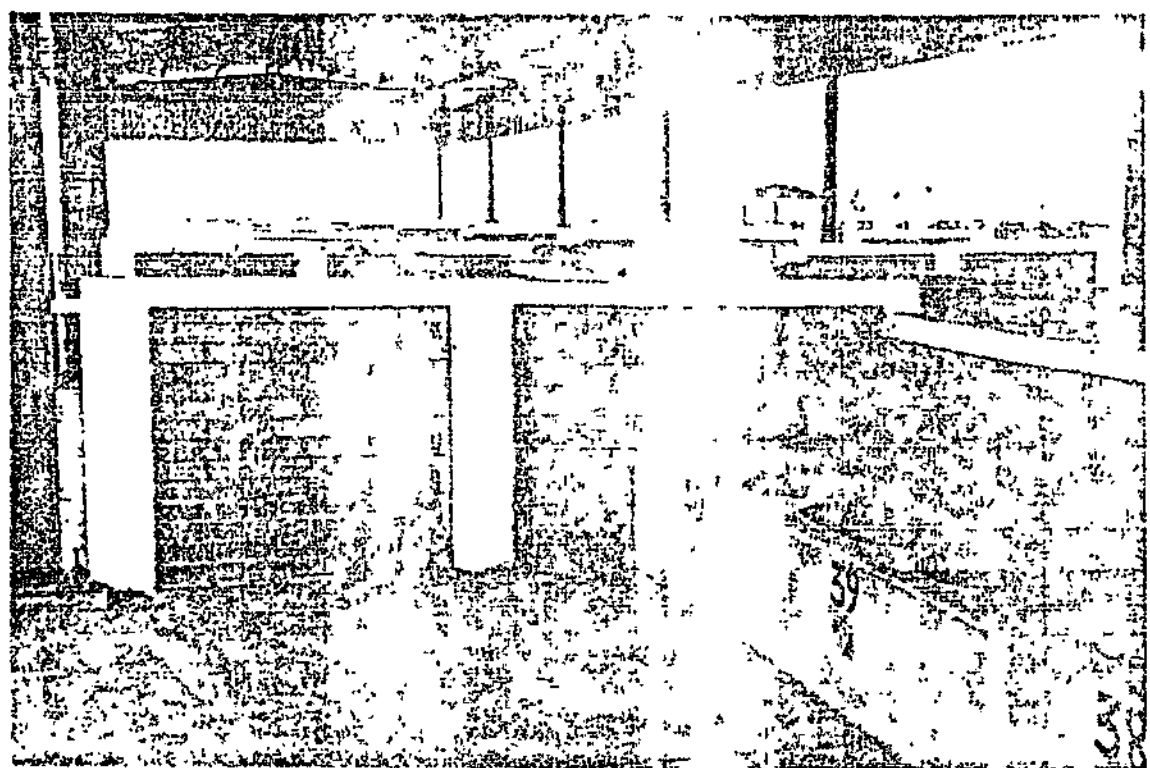
. equipamentos.....	Cz\$ 10.000,00
. cimento.....	Cz\$ 30.000,00
. areia.....	Cz\$ 25.000,00
. brita.....	Cz\$ 90.000,00
. tijolos.....	Cz\$ 30.000,00
. madeiramento.....	Cz\$ 5.000,00
. aço de construção.....	Cz\$ 6.000,00
- descargas de caminhões (19 viagens).....	Cz\$ 19.560,00
- administração da obra	Cz\$ 188.000,00

215.560,00

Seque na pagina seguinte ilustracoes fotograficas que melhorarao o entendimento dos detalhes da obra concluida.



CANHETTI JR.
 engenharia e construçoes ltda.



CANHETTI JR.
engenharia e construções ltda

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º 569/89


DE 01 / 03 / 89

INTERESSADO(A)


ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIOP para apuração
Cuiabá, 02.03.89


Jair Benedetti
Diretor Presidente
- CODMAT -


A "Cia DIOP" para informar se há algum pedido em andamento nesse sentido, após informar à DIOP.
13/03/89


José Moacyr Dilezah
Diretor Operações
- CODMAT -

À Dir. de Operações


Informamos que não há nenhum pedido e nada consta que tenha transitado nesta coordenação, sobre o assunto, apartir da data mencionada.

06.03.89


M. M. M. M.
Cia DIOP

À DIOP para conhecimento.

13/03/89


José Moacyr Dilezah
Diretor Operações
- CODMAT -

A DIOP para atualizar o documento.


13/03/89


Jair Benedetti
Diretor Presidente

À DPR

Para preparar orçamento.

Em. 14/03/89


Diretor de Operações.

AO SEEP.

PARA ATUALIZAR O ORÇAMENTO, CONFORME
PLANILHAS DE QUANTIFICAÇÃO E CÓPIAS DO PROJETO ADEQUATE-
TORICO EM ANEXO (02) DUAS PLANILHAS.

EM. 15/03/89


Waltemir Augusto Borralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

À DPR.

encaminhamos a atualização do orçamento
como solicitado, informamos também que por falta
de maiores informações sobre o projeto, seguimos
na íntegra a planilha com os respectivos quantita-
tivos

CM. 05-04-89




Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
- CODEMAT -

A CEA/DIOP.

SEGUER EM ANEXO, PLANILHA DE ORÇA-
MENTO REF. DOS GALPÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
DE D. AQUINO-MT, CONFORME PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO
E CÓPIAS DE PROJETOS FORNECIDAS PELO INTERESSADO.

EM. 06/04/89


Waltemir Augusto Borralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____/_____/____

INTERESSADO(A) _____


ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Dir. de Operações

Com o documento subscrito

07.04.89



Affonso Lufo Nantes

Coordenador da Dir. Operações

- CODEMAT -

Ao DIPR

Para deliberação do Colegiado de Diretores.

Em 19/04/89



Diretor de Operações

- CODEMAT -


A DIRETORIA COLEGIADA

Não consta do presente processo qualquer indicação de acordo citado na correspondência do Interm. Municipal de FMDR.

As contas da Prefeitura pleiteada se elevariam hoje para R\$ 100.000,00 (cem mil cruzados novescentos e noventa e nove mil e quinhentos e noventa e nove).

Sugiro que se informe a Prefeitura que desobedece o termo do Acordo citado e que no momento a Companhia não dispõe de recursos para atender o pedido.

22.07.89



Diretor Superintendente

CODEMAT

Em TEMPO:

Considerando que o Soader da área Sr Wilton Turtado de Mendonça veio a falecer, sugerimos seja feito inventário com o inventariante de seu espólio para que a CODEMAT se habilite no inventário. Posteriormente deve ser feita negociação para pagamento da área em transação de compra e venda.

02.08.89

Chupel

José Otto Costa Sampato
Diretor Superintendente
- CODEMAT -

A CEA/DIOP

Para redimensionar reduzindo a área, quantificar e orçar.

Em: 10.11.89

~~Edoaldo Rodrigues Pativa~~
Diretor de Operações
- CODEMAT -

A D.P.R.

Para atendimento do despacho de pres, diminuindo o tamanho do projeto, mantendo as fronteiras.

13.11.89

Maurício
Maurício Queto Almeida
Coordenador de Dir. Operações
- CODEMAT -

AO SEEP.

PARA PROVIDÊNCIAS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CEA/DIOP E PROJETO EM ANEXO.

Em: 26/11/89

[Assinatura]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Comunicação Interna

DE	Gerencia de Juína	DATA	22.12.88
PARA	DDR	N.º DA CLC	455/88
ASSUNTO	Reiteramos termos CI 001/88 de 05.01.88 da necessi- dade de aquisição de material elétrico para instalação de Padrão Proprio, tendo em vista a energia da Marcenaria está ligada no padrão da Prefeitura Municipal.		
Outrossim informamos que devida a mudança de pre- feito este poderá efetuar o corte, pois esta onerando os co- fres da Prefeitura.			
A CEA-MOT		Atenciosamente, Juares Antônio Marinho GERENTE CODEMAT JUÍNA	
TAMEGOO		CODEMAT	
Enviado em 20/12/88		Destinado a	
Enviado por		Recebida em	
Juares F. Marinho		Maurício L. Naves	

- TAMEGOO -

- CODEMAT -

Ao Dir. de Operações
para autorizar aquisição
05.01.89

Off. Maurício
CEA / DIOP.

A DPA para providenciar o
procurement 13/01/89

Off. Manoel Ditozaki
Diretor Operações
- CODEMAT -

9 SEEP

Conforme solicitação
Em 16/01/89

Off. Valmir Augusto Bonilha Dias
Chefe da Divisão de Projetos
= CODEMAT =

A DPR.

encaminhamos o organograma
conforme solicitação, e informo
que os preços apresentados no
plano de execução, sujeitos
a modificação a partir do
25/01/89.

Atenciosamente
18.1.89

Off. Geraldo

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Elaboração de Projetos
- CODEMAT -

2. GEA/DIOP

Conforme solicitação

Off. Valmir Augusto Bonilha Dias
Chefe da Divisão de Projetos
= CODEMAT =

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____


DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

Gerencia de Juína

ASSUNTO _____

Orçamento para instalação do Padrão
inclusive transformador na marcenaria de Juína.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELACÃO DE MATERIAL
QUANTIDADE

1) Um trafego de 45 KVA 13800/220/127 Volts	
2) Caixa Medição e de Demanda	
3) Caixa TCS	
4) Isolador de Pino 15 KVA	06
5) Jogo de Isolador disco 15 KVA	06
6) Parafuso Duplo passante 5/8 x 500 ml	06
7) Parafuso Maq 5/8 X 500 ml	04
8) Placa Quadrada 57 ml X11/16	20
9) Chave Francesa 710 ml	08
10) Parafuso 3/8 X115 ml	08
11) Alça Preformada para Cabo Aluminio 16 ml	06
12) Cabo de Aluminio 16mm ²	240 mts
13) Cabo de Cobre 95 mm ²	25 mts
14) Chave Blindada 200 A X 3	01
15) Chave A. T. 50 A com fusivel 15 KVA	03
16) Para Raio Distribuição 15 KVA	03
17) Fio 16 mm ² Nu de Cobre	10 mts
18) Conector BI para Cabo 2	12
19) Conector terminal p/ 95 mm ²	09
20) Curva 90º X 2 ferro	02
21) Poste de Madeira 11 mts	01
22) Cruzeta de Itauba 9X11X240 mts	04

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEEP

DATA

JANEIRO

**GOVERNO CARLOS BEZERRA
EM DIREÇÃO AO SOCIAL****PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RESP.

LEOPLDO B. JUNIOR

OBRA

MARCENARIA

LOCAL

MUNICIPA/MT

FOLHA Nº

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	- Transformador 45 KVA 13800/220/127 volts	pç	01	2.100,00	2.100,00
02.	- Caixa de Medição de demanda	pç	01	55,75	55,75
03.	- Caixa TCS	pç	01	49,34	49,34
04.	- Isolador de pino 15 KVA	pç	06	1,47	8,82
05.	- Jogo de isolador disco 15 KVA	pç	06	17,73	106,38
06.	- Parafuso duplo passante 5/8 x 500ml	ml	06	2,86	17,16
07.	- Parafuso maq. 5/8 x 500ml	pç	04	2,15	8,60
08.	- Arruela quadrada 57 ml x 11/16	pç	20	0,35	7,00
09.	- Mão francesa 710 ml	ml	08	2,77	22,16
10.	- Parafuso 3/8 x 115 ml	ml	08	0,50	4,00
11.	- Alça preformada para cabo aluminio 16 mm2	ml	06	1,74	10,44
12.	- Cabo de aluminio 16 mm2	pç	240	1,07	256,80
13.	- Cabo de cobre 95 mm2	pç	25	12,71	317,75
14.	- Chave blindada 200 A x 3	pç	01	278,71	278,71
15.	- Chave A.T. 50 A com fusível 15 KVA	pç	03	111,72	335,16
16.	- Para raio destribuição 15 KVA	pç	03	54,20	162,60
17.	- Fio 16 mm2 nu de cobre	ml	10	17,36	173,60

Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Geraldo Antonio Gomes de Almeida
Elaboração de Projetos
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

**GOVERNO CARLOS BEZERRA
EM DIREÇÃO AO SOCIAL****PLANILHA DE ORÇAMENTO**

OBRA

LOCAL

FOLHA Nº

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18.	- Conector BI para cabo 2	pç	12	4,06	48,72
19.	- Conector terminal para 95 mm2	pç	09	13,67	123,03
20.	- Curva 90º X 2 ferro	pç	02	8,82	17,64
21.	- Poste de madeira 11 mts	pç	01	77,02	77,02
22.	- Cruzeta de itauba 9 x 11 x 240 mts	pç	04	6,00	24,00
TOTAL					4.204,68
Importa o presente Orçamento em NCZ\$ 4.204,68 (Quatro mil duzentos e quatro cruzados novos e sessenta e oito centavos).					
OBS.: Os itens nºs 09, 21 e 22 podem ser conseguidos no local da obra a custo zero (0).					
 Geraldo Antonio Gomes de Almeida Chefe do Setor de Elaboração de Projetos CODEMAT					



CODMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____/_____/____

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Dir. de Operações

Para o orçamento solicitado, para os devidos fins.

190189

[Signature]
CEA/DIDOP.

A CEA/DIDOP.

Para atualizar o orçamento.

Em 14/03/89.

[Signature]
Diretor de Operações

À D.P.R.

Para atender o despacho Supra.

1603-89

[Signature]
Sr. Lucio Naves
Chefe da Dir. Operações
CODMAT

AO SEEP.

Para ORÇAR CONFORME QUANTITATIVO DOS
MATERIAIS EM ANEXO.

Em 20/03/89

[Signature]
Wiliams Augusto Borralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
CODMAT

A DPR

Conforme solicitado encaminhamos a V.ª o custo do material para a execução de instalação elétrica.

Em 21-03-89
Atenciosamente

pp Roberto
Ronaldo Antonio o. e. a. Almeida
Chefe do Setor de Projetos
CODENAT

A CEA/DIOP

ENCAMINHAMOS EM ANEXO, PLANILHA
ORÇAMENTO DEF. DE MATERIAIS ELÉTRICOS
FORNECIDOS PELA GERÊNCIA TÉCNICA DE JUINA, PARA A
MANUTENÇÃO DESTA CIA EM JUINA.

EM, 21/03/89

Waltamir Augusto Borralho Dias
Waltamir Augusto Borralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
CODENAT

RECEBIMOS
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

31 MAI 16 58 3 002161

PROT. 002161

Nº PROTOCOLO: 2.161/89

Nº PROCESSO: 1.741/89


DATA 31 / 05 / 89

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

ASSUNTO

SÓLICITA ELABORAR PROJETO PADRÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, ACOMPANHADO DE MEMORIAL DESCRITIVO FINANCEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA CIDADE. CONFORME OFÍCIO Nº 113/89.




CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º


1.741/89 DE 31 / 05 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES


A DIOP para providências
Curitiba, 31.05.89


Jayr Benedetti
Diretor Presidente
- CODEMAT -

A DPR

Para elaborar o projeto solicitado.


Em. 01/06/89


Edvaldo Rodrigues Paiva
Diretor de Operações
- CODEMAT -

AO SEEP

PARA PROVIDÊNCIAS QUE A SOLICITAÇÃO REQUER

Em. 01/06/89


Waltamir Augusto Borralho Dias
Chefe da Divisão de Projetos
- CODEMAT -

Definir local terrenos

fica definido que o projeto solicitado será
do terminal rodoviário tipo I - em contato com
o 1º prefeito municipal - em 26.07/89 - que envia
rá o respectivo terreno



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA



Of. nº 113/89-alf.

Cláudia/MT, em 30 de maio/1989.

Senhor Presidente,

CODEMAT
Protocolo N° 2161/89
Processo N° 741/89
Data 31, 05, 89
<i>Almeida</i>
Serviço de Protocolo

Com o presente estamos solicitando dessa Companhia, o fornecimento de um projeto padrão de Ginásio de Esportes, acompanhado de memorial descritivo e orçamento quantitativo e financeiro, além da confecção de um projeto completo para construção de uma praça na cidade de Cláudia.

Nossa solicitação prende-se ao fato de que existem possibilidades de viabilização dos recursos necessários junto ao governo federal, entretanto, nosso Município recém instalado, não possui condições financeiras para mandar elaborar os referidos projetos.

Sendo o que nos se apresentava para o momento, certos da costumeira atenção de Vossa Senhoria, renovamos os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jose Augusto Formigoni
JOSE AUGUSTO FORMIGONI
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.

JAIR BENEDETTI

MD. Presidente da CODEMAT

CUIABÁ/MT



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA

DATA: AGOSTO/86

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<u>QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA</u>				
0.1	CÔNSTRUÇÃO DA QUADRA COM ARQUIBANCADA				1.668.498,42
0.2	QUADRA (PISO E ELEMENTOS) :				<u>52.278,20</u>
	T O T A L				1.720.776,62



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA: JULHO/86

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	RESUMO:				
01	CONSTRUÇÃO CIVIL				1.213.133,31
02	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA				42.314,51
03	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				28.012,50
	TOTAL PARCIAL I.....				1.283.460,32
	BDI - 30%.....				385.038,10
	TOTAL PARCIAL II;;;.....				1.668.498,42



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

1

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>				
1.1	Barracão para depósito e escritório	m ²	20,00	965,81	19.316,20
1.2	Instalação provisória de água e esgoto	ud	01	2.993,20	2.993,20
1.3	Instalação provisória de luz e força	ud	01	1.312,20	1.312,20
1.4	Placa da obra	ud	01	4.480,00	4.480,00
1.5	Locação da obra com aparelho topográfico	m ²	<u>1.252,80</u>	3,16	3.958,84
02	<u>TRABALHO EM TERRA</u>				
2.1	Escavação manual em material de 1ª categoria para valas e cavas de fundação	m ³	182,03	35,20	6.407,45
2.2	Reaterro de valas com próprio material escavado	m ³	141,62	14,97	2.120,05
2.3	Aterro entre baldrames	m ³	49,50	36,28	1.795,86
2.4	Apiloamento dos fundos das valas	m ²	113,60	16,01	1.818,73
03	<u>FUNDAÇÕES</u>				
3.1	Concreto fck 150 kg/cm ²	m ³	19,61	719,31	14.105,66
3.2	Concreto ciclópico	m ³	20,80	542,91	11.292,52
3.3	Forma comum inclusive desforma	m ²	272,96	72,76	19.860,56
3.4	Ferragem para concreto Aço CA-50 e CA-60	Kg.	1.870,00	9,76	18.251,20
04	<u>ESTRUTURA</u>				
4.1	Concreto fck 150 kg/cm ²	m ³	131,40	817,59	107.431,32
4.2	Forma inclusive desforma (12 m ² /m ³)	m ²	1.576,80	115,70	182.435,76



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

2

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.3	Ferragem para concreto Aço CA-50 e CA-60	Kg	12.750,00	9,76	124.440,00
05	<u>IMPERMEABILIZAÇÃO</u>				
5.1	Impermeabilização com argamassa de cimento e areia com adição de Vedacit	m ²	123,75	34,58	4.279,27
5.2	Pintura com neutrol/45	m ²	65,00	13,24	860,60
06	<u>ALVENARIA</u>				
6.1	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico de 8 furos meia vez	m ²	309,40	54,05	16.723,07
6.2	Divisória em granilite	m ²	53,60	378,00	20.260,80
07	<u>COBERTURA</u>				
7.1	Estrutura metálica para cobertura em arco com telhas de alumínio inclusive cobertura em telhas de alumínio inclusive ferragens	m ²	1.474,20	263,10	387.862,02
08	<u>ESQUADRIAS</u>				
8.1	Esquadria metálica				
	- Porta de abrir em chapa dobrada tipo PF-1 (2,00 x 2,50)	cj	02	2.046,38	4.092,76
	- Porta de enrolar em chapas raiadas tipo PF-2 (4,00 x 2,20)	cj	01	2.860,00	2.860,00
	- Janela basculante em chapa dobrada	m ²	14,52	350,00	5.082,00
8.2	Esquadria de madeira				
	- Porta tipo solidor completo	ud	06	238,00	1.428,00
	- Tipo P.1 (0,80 x 2,10)	ud	15	198,00	2.970,00
	- Tipo P.2 (0,60 x 1,80)				



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

3

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA: LOCAL: RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	<u>REVESTIMENTO</u>				
9.1	Chapisco de aderência	m ²	618,80	6,40	3.960,32
	Reboco paulista	m ²	512,20	26,28	13.460,61
	Azulejos brancos	m ²	103,60	123,49	12.793,56
10	<u>PISOS, RODAPEIS, SOLEIRA e PEITORIS</u>				
10.1	Lastro de concreto traço 1:4:8	m ²	858,15	43,34	37.192,22
10.2	Cimento liso queimado	m ²	1.171,50	30,50	35.730,75
10.3	Piso nas 02 (duas) laterais da quadra em lastro de concreto desempenado	m ²	48,96	43,34	2.121,92
10.4	Cerâmica vermelha (7,5 x 16cm)	m ²	70,38	91,50	6.439,77
10.5	Rodapés de cimento altura 10cm	m	162,70	12,89	2.097,20
10.6	Rodapés de cerâmica vermelha	m	97,50	15,04	1.466,40
10.7	Soleira externa de cerâmica vermelha	m	4,80	19,76	94,84
10.8	Peitoris externo de cerâmica vermelha	m	33,50	18,20	609,70
11	<u>VIDROS</u>				
11.1	Vidros cancelados	m ²	14,52	70,44	1.022,78
12	<u>PINTURAS</u>				
12.1	Ciação em paredes e tetos	m ²	512,20	5,48	2.806,85
12.2	Óleo em esquadria de madeira sem massa	m ²	78,40	16,71	1.310,06
12.3	Grafite em esquadria metálica	m ²	42,12	34,46	1.451,45



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA: -

LOCAL: -

RESPONSÁVEL: -

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.4	Pintura com nata de cimento em concreto aparente	M2	737,10	13,63	2.675,67
12.5	Pintura em estrutura metálica com grafite	M2	1.474 m20	15,65	23.071,23
12.6					
13	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>				
13.1	Fornecimento e colocação de letreiros para portas em ⁰⁴ crílico	ud	07	19,33	135,31
13.2	Banco de concreto armado (4,00x0,50x0,40)	ud	02	530,10	1.060,20
13.3	Alambrado com ferro chato 3/4 x 1/8 fixado em estrutura de tubos de ferro galvanizado 2 1/2	M2	324,00	150,00	48.600,00
13.4	Guarda corpo em gradil de ferro	M2	250,00	130,00	32.500,00
13.5	Portão em cano galvanizado Ø 2" com tela galvanizada malha 2 cm (1,20x2,00)	ud	06	880,00	5.280,00
13.6	Banco em granilite fundido na obra espessura 5 cm (4,00x0,50)	ud	02	907,20	1.814,40
13.7	Placa de inauguração da obra em alumínio conf. detalhe	ud	01	2.300,00	2.300,00
14	<u>LIMPEZA GERAL</u>	Vb	-	4.700,00	4.700,00
Total Geral.....					1.213.133,31



Governo

Marcelo Pires

Estado de Mato Grosso. O presente tem futuro



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

1

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<u>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</u>				
1.1	Água Fria				
	Tubos PVC Rígido com juntas soldadas em barra de 6m				
	- Ø 3/4"	br	18	29,00	522,00
	- Ø 1"	br	04	55,00	220,00
	- Ø 1 1/4"	br	05	90,00	450,00
	- Ø 2"	br	02	140,00	280,00
1.2	Cotovelo 90º				
	- Ø 3/4"	ud	45	1,50	67,50
	- Ø 1"	ud	12	4,0	48,00
	- Ø 1 1/4"	br	06	9,0	54,00
	- Ø 2"	ud	05	28,0	140,00
1.3	Tee				
	- Ø 3/4"	ud	12	2,0	24,00
	- Ø 1"	ud	07	6,0	42,00
	- Ø 1 1/4"	ud	05	14,0	70,00
	- Ø 2"	ud	03	45,0	135,00
1.4	Tee de Redução				
	- Ø 1" x 3/4" com buchas	ud	04	9,00	36,00
	- Ø 2" x 1" com buchas	ud	03	61,00	183,00



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

2

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCA DA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	- Ø 2" x 1 1/4" com buchas	ud	06	61,00	366,00
02	<u>Métals</u>				
	Registro de gaveta acabamento bruto Ø 2"	ud	03	200,00	600,00
	Registro de gaveta com canopla cromada liso Ø 3/4" DECA	ud	04	80,00	320,00
	Registro de pressão cromada liso com canopla Ø 3/4"	ud	11	80,00	880,00
	Válvula para pia 1x2"	ud	01	25,00	25,00
	Válvula para lavatório Tigre PVC	ud	12	8,00	96,00
	Válvula Hydra 1 1/2"	ud	09	270,00	2.430,00
	Torneira de pressão para pia DECA	ud	01	130,00	130,00
	Torneira de pressão para lavatório DECA	ud	12	135,00	1.620,00
	Torneira para Jardim	ud	04	40,00	160,00
03	<u>Aparelhos Sanitários</u>				
	Bacia sanitária louça branca	ud	09	221,84	1.996,56
	Lavatório louça branca médio	ud	12	90,00	1.080,00
	Mictório louça branca	ud	05	146,00	730,00
	Cuba de aço inoxidável 50 x 40 x 20	ud	01	380,29	380,29
	Porta papel de louça branca	ud	09	24,00	216,00
	Saboneteira de louça branca	ud	12	20,00	240,00
	Porta toalha tipo gancho	ud	20	12,00	240,00
	Porta toalha com barra redonda	ud	08	30,00	240,00
	Espelho para lavatório 0,40x0,60	ud	12	390,00	4.680,00

Governo
do Estado

Mário Peres

Estado de Mato Grosso. O presente tem futuro



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCA DA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	<u>Caixa D'Água</u>				
	Caixa d'água fibra cimento Brasilit de 1.000 litros inclusive acessórios	cj	03	650,00	1.950,00
	Entrada de água (cavalete)	cj	01	600,00	600,00
	<u>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</u>				
	<u>Esgoto</u>				
01	Tubos de PVC Rígido Tigre para esgoto				
	- Ø 100mm	m	120,0	14,50	1.740,00
	- Ø 50mm	m	30,0	8,66	259,80
	- Ø 40mm	m	25,0	6,66	166,50
1.1	Curva 90º				
	- Ø 100mm	ud	14	12,00	168,00
	- Ø 50mm	ud	18	4,00	72,00
1.2	Junção Simples				
	- Ø 100 x 100mm	ud	04	27,00	108,00
	- Ø 100 x 50mm	ud	10	27,00	270,00
1.3	Ligação para saída de vaso sanitário tubo cromado com canopla	ud	09	50,00	450,00
1.4	Caixa sifonada PVC com grelha cromada 150x150x50mm	ud	03	80,00	240,00
1.5	Caixa seca com grelha cromada	ud	02	58,57	117,14
1.6	Sifão PVC Tigre lavatório e pia	ud	13	28,00	364,00



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

4

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCA DA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.7	Caixa de inspeção e passagem de alvenaria com tampa de concreto 50x50x40cm	ud	08	200,54	1.604,32
1.8	Caixa de gorduras de PVC	ud	01	120,00	120,00
02	Fossa Séptica	ud	01	2.570,90	2.570,90
03	Sumidouro	ud	01	1.612,50	1.612,50
04	Mão de obra para serviços de hidráulica e sanitária	Vb	-	11.200,00	11.200,00
TOTAL GERAL					42.314,51



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUITRANCADA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<u>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</u>				
1.1	Fios				
	Fios de cobre nú com isolamento para 750 volts				
	- 1,5 mm ²	m	495,00	1,35	668,25
	- 2,5 mm ²	m	108,00	2,00	216,00
	- 4 mm ²	m	45,00	2,85	128,25
	- 2 mm ²	m	50,00	4,40	220,00
02	<u>Eletrodutos</u>				
2.1	Eletroduto de ferro tipo pesado em barra de 3m				
	- 3/4"	br	14	34,00	476,00
	- 1"	br	12	65,00	540,00
2.2	Eletroduto de PVC Rígido tipo leve em barra de metros				
	- 3/4"	br	41	15,00	615,00
	- 1"	br	15	26,00	390,00
03	<u>Luminárias</u>				
3.1	Luminária tipo globo leitoso para plafonier e lâmpada incandescente 10x23cm	qj	06	55,00	330,00



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

02

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA

DATA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.2	Luminária tipo calha com lâmpada fluorescente, reatores e demais acessórios da PETERCO ou Similar para 250/24	cj	12	240,00	2.880,00
3.3	Luminária tipo HDK 451 com lâmpada mista MLL de 500W x 220V da PHILIPS ou Similar.	cj	20	400,00	8.000,00
04	<u>Tomadas Interruptores</u>				
4.1	Tomada universal 127 V	cj	12	9,00	108,00
4.2	Interruptor universal 1 alavanca	cj	10	9,00	90,00
4.3	Interruptor universal 2 alavancas	cj	02	15,00	30,00
05	<u>Caixas e fitas isolante</u>				
5.1	Caixa octagonal de ferro 4x4x2"	ud	24	3,50	84,00
5.2	Conduletes	ud	25	27,00	675,00
5.3	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 30x30	ud	02	75,00	150,00
06	<u>Quadro de Distribuição com Disjuntores</u>	ud	01	220,00	220,00
07	<u>Padrão CEMAT</u>	ud	01	932,00	932,00
08	Mão de obra para serviços de Instalação Elétrica	Vb	-	11.260,00	11.260,00
	TOTAL				28.012,50



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

OBRA:

QUADRA POLIVALENTE

DATA:

JULHO/86

LOCAL:

RESPONSÁVEL:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<u>PISO</u>				
1.1	Laçtro de concreto no traço 1:4:8 com 8 cm de espessura formando quadros de 2,0x2,0 m com ripas de 6x1,5, desempenado, liso, queimado a colher (concreto em forma de damas) e com 2% de declividade para as laterais	M2	540	58,00	31.320,00
02	<u>ELEMENTOS</u>				
2.1	Fornecimento e colocação de trave para futebol de salão incluindo pintura e rede nylon	cj	1	1.620,00	1.620,00
2.2	Fornecimento e colocação de suporte para voley em cano galvanizado Ø3" inclusive pintura, redes e demais pertences (2 postes)	cj	1	810,00	810,00
2.3	Fornecimento e colocação de suporte para tabela de madeira para basquete em treliçado de perfil simples, inclusive pilares de concreto armado (aparente), fundação, pintura e cesta de nylon, conf. detalhe	cj	1	3.080,00	3.080,00
03	<u>PINTURA</u>				
3.1	Marcação da quadra com tinta especial conf. especificação da CDB, de 5 cm de largura conf. especificação de projeto	ml	376	9,00	3.384,00
	TOTAL PARCIAL.....				40.214,00
	BDI - 30%.....				12.064,20
	TOTAL				52.278,20

CLAUDIA

V INICIO DE SINOP COMARCA DE CUIABÁ IV



COLONIZADORA SINOP S.A.

FUNDIÇÃO DA CIDADE 05/08/70

CODIGO DA PLANTA

ESCALA

0-5-C-0-0

1 2500

ESTATÍSTICAS

ÁREA EM m2

Nº LOTES

DE COMERCIAIS E RESIDENCIAIS	2 116 198,00 m2	3.613
E INDUSTRIAIS	258.286,70 m2	140
"F"	801.524,96 m2	24
"F"	3 620,57 m2	4
FAV. E AVENIDAS	117.18,87 m2	
TOTAL DO LOTEAMENTO	4 400 980,00 m2	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PROJETO URBANÍSTICO

ROBERTO BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 16 - M. HECIAC

ALFREDO CLODOLDO DE OLIVEIRA NETO
ARQUITETO URBANISTA
CREA Nº 47 76 D - 103 - V - MT

SADAL WATARI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 9678-D - 79 RL - MT

COLONIZADORA SINOP S.A.

JOÃO PEDRO M. DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

COLONIZADORA SINOP S.A.

COLONIZADORA SINOP S.A.

ALFREDO CLODOLDO DE OLIVEIRA NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CREA: N.º 47.176/D - 6.ª Região
N.º 2.463/V - 7.ª Região
N.º 1.835/V - MT
RESPONSÁVEL TÉCNICO

14-5-85

Nº PROTOCOLO: 9.033/84

Nº PROCESSO: 8.589/84

DATA 21 / 12 / 84

INTERESSADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - MS

ASSUNTO

ENCAMINHA FOTOCÓPIA DA ESCRITURA PÚBLICA, REFERENTE TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO, CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTIVO NO OFÍCIO Nº. 1 909/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Campo Grande, 11 de dezembro de 1984

OF/PGE/Nº 1909/84

CODEMAT	
Protocolo Nº	9.023/84
Processo Nº	8569/84
Data	9/12/84
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente.


Atendendo solicitação de V.Exa., via telefônica, remeto-lhe cópia da escritura pública lavrada nas Notas do Cartório do 3º Ofício desta Capital, em 27 de junho de 1983, pela qual a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso - CODEMAT transfere ao Estado de Mato Grosso do Sul, vários imóveis neste Estado.

Anexo também, cópia do Termo de Distribuição de Patrimônio firmado pelos, então, Governadores Marcelo Miranda Soares e Frederico Carlos Soares Campos e pelos membros da Comissão de Divisão, onde constatamos que passariam ao domínio do Estado de Mato Grosso do Sul os imóveis "A" e "B" situados nas imediações da Vila Rosa, nesta Capital, e, com base em tal documento, lavrou-se a escritura pública constando lotes "A" e "B".

Entretanto, por ocasião da matrícula da escritura no Registro de Imóveis desta Capital, constatou-se que os imóveis transferidos seriam "A" e "D", ficando, portanto, errada tal escritura pública, que deve ser re-ratificada pelas partes, nesse particular.

Assim, solicito a V.Exa. a vinda a esta Capital de um representante da CODEMAT para assinar em nome da Empresa a escritura pública de re-ratificação necessária.

Aproveito a oportunidade para externar-lhe meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.


JOILCE DE ARAUJO
PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Exmº. Sr.

Gustavo Arruda

DD. Diretor Presidente da CODEMAT

CUIABÁ/MT

LT.

REPÚBLICA FEDERATIVA




Comarca de CAMPO GRANDE - Estado de MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedra
TABELIÃO

Francisco Pedra
SUBSTITUTO

TERCEIRO TABELIÃO E
OFICIAL DOS PROTESTOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS



Livro Nº 225.

Fls. Nº 98v.


Trasado: primeiro E/M.

Escritura Pública

== DE DOAÇÃO ==



DOADORA :- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
DONATARIA :- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
V A L O R :- NIHIL.

SAIBAM quantos esta pública escritura virem
que aos vinte e sete (27) dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e tres (1983) nesta cidade de Campo Gran
de, Estado de Mato Grosso do Sul, em meu Cartório à Rua 13
de Maio nº2.515, perante mim Tabelião compareceram partes en
tre si justas e contratadas, a saber: de um lado como outor
gente doadora: a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO (CODEMAT). Inscrita no CGC./MF. sob o nº03.474.053/
0001-32, representada por Procurador com poderes específicos
Sr. ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIAS, brasileiro, casado,
funcionario público Estadual exercendo o cargo de chefe do se
tor de patrimônio da Codemat, residente e domiciliado na Aveni
da Ipiranga 2.557, na cidade de Cuiaba MT, portador do RG.



fls. 02.

ao Sul com a Rua São Paulo, cujo imóvel foi adquirido pela transcrição nº 45.022 fls. 85 do Livro 3AP, em 14-6-59, do Registro de Imóveis desta Comarca, ainda se encontrando em nome da extinta comissão de Planejamento de Produção (CPP) sucedida por disposição legal pela outorgante doadora, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT); b) Uma área de terras na zona suburbana da cidade de Campo Grande, parte da Fazenda Cerradinho com 11.555,30 metros Quadrados, desmembrados da área maior e compreendidos dentro das seguintes metragens e confrontações: Começa no marco 3, cravado junto ao leito da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, daí no rumo 48º e 25' SE na distância de 22 metros, atinge o marco nº 4, colocando na divisa da Vila Dorisa, daí no rumo 35º 40' NE na distância de 27,8 metros atinge seu marco nº 5, sempre dividindo com a Vila Dorisa, daí numa linha de 20 metros, 60º 55' NW atinge o marco nº 6, dividindo com a Vila Jardim Petrópolis daí no rumo de 24º 15' NW na distância de 194 metros, sempre dividindo com o Jardim Petrópolis, daí no rumo de 46º 07' NE na distância de 97,40 metros, dividindo com o lote 2, do mesmo desmembramento, daí no rumo de 46º 55' SE, na distância de 181, metros atinge-se o marco nº 3 ponto de partida, limitando-se: ao Norte com a Gleba A, ao Sul com a Vila Dorisa, ao Nascente com a Vila Petrópolis e ao Poente com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Foi medido ainda pela outorgante doadora, na presença do outorgado donatário e do representante do Exmo. Sr. GOVERNADOR do Estado que sendo legítimo proprietário dos imóveis onde se localizam as torres do Sistema de Retransmissão de Repetição de TV,



FLS:02.

Pelo outorgado donatário me foi dito que aceitava esta escritura em todos os seus expressos termos, como nela se contem e declara. Esta escritura é isenta de Tributação do I.T.B.I. nos termos do Art. 3º Inciso I do Dec. Lei nº66 de 27-04-79, E de como assim disseram, outorgaram e assinam conjuntamente com o representante do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, e dispensando as testemunhas conforme Provimento nº1/82 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso do Sul. Eu, Luiza T. Kanashiro Escrivente Compromissada, a esdrevi. EU, PEDRO PEDRA, Tabelião a subscrevo. (aa) ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS// JOILCE VIEGAS DE ARAÚJO// APARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR.// Trasladada em seguida. Eu, TABELIÃO, que a fiz datilografar, subscrevo e assino em público e lraso.

EM TESTE "2" DA VERDADE

O 3º TABELIÃO

Processo n. 360 82
Data 09/11/82
Rubrica

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO


Protocolo
n.º 05


Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de um mil novecentos e setenta e nove, às 15:00 horas, numa das dependências da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, estando presentes as autoridades adiante nomeadas: Governador do Estado de Mato Grosso do Sul - Marcelo Miranda Soares, Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul - Hugo José Bomfim, Governador do Estado de Mato Grosso - Frederico Carlos Soares Campos, Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso e Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Osvaldo de Oliveira Fortes, dando cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, especificamente nos seus artigos 20, 21 e 22 e parágrafos, resolvem celebrar o presente Termo de Distribuição de Patrimônio, mediante os itens seguintes: I - Passam ao Governo de Mato Grosso do Sul os seguintes imóveis, cuja transferência da propriedade será oportunamente efetivada, através das competentes escrituras públicas: (A) uma parte de terras na Fazenda Ban- deira, situada no município de Campo Grande, com área de 7.229 m², tendo a de- nominação de lotes 1 e 2 da quadra 1 da planta particular denominado Jardim América, limitando-se a área em apreço, ao Norte, com a quadra nº 15, ao Sul, com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e com a propriedade do Sindicato dos Criadores do Sul de Mato Grosso, ao Nascente com a quadra 22 e ao Poente com um ramal da EFN08. Dita propriedade foi transferida ao Estado de Mato Grosso, con- forme transcrição do Livro 3-S, fls. 06, número de ordem 13.309, em data de 02 de agosto de 1944, R.G.I. de Campo Grande - Mato Grosso do Sul, imóvel este co- nhecido por Usina de Beneficiamento de Algodão. Esta propriedade ainda se en- contra registrada em nome do Estado de Mato Grosso, embora tenha sido, transfe- rida à CODEMAT para integralização do capital subscrito pelo Estado, conforme artigo 2º, item I, alínea b, nº 1, da Lei 2.933, de 10 de junho de 1969. (B) 2 (dois) lotes de terrenos determinados letras 1 e 2 da planta de desmembra- mento de 30/06/59, aprovada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, situados nas imediações da Vila Rosa, descritos da seguinte forma: lote "A", medindo 12 metros de frente para a Rua Rio Grande do Sul, por 30 ditos de frente aos fun- dos e área total de 360 m², limitando, ao Norte, com terreno de João Batista da Rosa; ao Sul com o lote "B"; ao Nascente com a rua referida, e, ao Poente, com o lote "D"; Lote "D", medindo 12 metros de frente para a rua São Paulo, por 40


metros ditos, de frente aos fundos e área total de 480 m². Limitando ao Norte a Poente com terrenos de João Batista da Rosa; ao Nascente, com os lotes "A", "B" e "C", e ao Sul, com a rua São Paulo, transcrito no livro de Transmissão de Imóveis sob nº AP, às fls. 85, número de Ordem 45.022, em 14/07/1959, ainda se encontrando em nome de ~~João Batista da Rosa~~, desmembrado da área maior e compreendidas dentro das seguintes metragem e confrontações: começa no marco nº 3, cravado junto ao leito da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, daí no rumo 48º25' SE na distância de 22 metros, atinge-se o marco nº 4, colocado na divisa da Vila Dorisa, daí no rumo 35º40' NE, na distância de 27,8 metros, atinge-se o marco nº 5, sempre dividindo com a Vila Dorisa, daí numa linha de 20 metros, 60º55' NW, atinge-se o marco nº 6, dividindo com a Vila Jardim Petrópolis, daí no rumo de 24º15' NW, na distância de 194 metros, sempre dividindo com o Jardim Petrópolis, daí no rumo 46º07' NE, na distância de 97,40 metros, dividindo com o lote A, do mesmo desmembramento, daí no rumo de 46º55' SE, na distância de 181 metros, atinge-se o marco nº 3, parte ponto de partida, limitando ao Norte com a gleba A, Sul com a Vila Dorisa, Nascente com a Vila Petrópolis e Poente com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. X - O Estado de Mato Grosso transfere ao Estado de Mato Grosso do Sul todas as torres ali implantadas do sistema de retransmissão de repetição de TV, cujas obras foram executadas pela firma Televisão Morena Ltda., localizadas nos seguintes municípios: Rio Brilhante, Iguatemi, Aquidauana, Maracaju, Dourados (Piuva), Ponta Porã (Para Pedro, Nioaque), Guia Lopes da Laguna, Fátima do Sul, Bela Vista, Antônio João, Bonito, Amambai, Glória de Dourados, Rio Verde, Rio Negro, Coxim, Camapuã, inclusive o sistema de transmissão a cores na TV Morena, localizada na Cidade de Campo Grande. III - São transferidos ao Estado de Mato Grosso do Sul os direitos relativos aos financiamentos feitos às seguintes Prefeituras: Bonito, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Nova Andradina, Terenos, Antônio João, Bela Vista, Cassilândia, Aquidauana, Aparecida do Tabuaçu, Bataiporã, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Jaraguari. IV - Fica transferida ao Estado de Mato Grosso do Sul a propriedade relativa aos grupos geradores com Motor Deurtz A 62 - 211 4R - refrigerado a ar, 6 cilindros, 104 HP - DIN, 1800 RPM, gerador trifásico 80 KVA, 60 ciclos e seus acessórios, bem como transferidos ficam os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de comodato assinados entre a CODEMAT e as Prefeituras de Sidrolândia, Iguatemi, Ponta Porã, Rio Negro, Pedro Gomes, Jaraguari, Inocência, Lagoa Bonita, Dourados, Miranda, Jateí, Coxim, Forte Coimbra, Corguinho e Dourados. V - Quanto aos tratores importados da Romênia, deixam de ser objetos de transferência, uma vez que quase a totalidade dos seus adquirentes se fez inadimplente, sob a


alegação de que essas máquinas não satisfizeram o mínimo de rendimento, dada as condições climáticas e a anormal fragilidade proveniente de sua fabricação. Em consequência, deixam também de ser arrolados, neste termo, os títulos provenientes da venda destas máquinas, uma vez que a CODEMAT se encontra em luta judicial para que os devedores satisfaçam os seus débitos. VI - Com relação ao Projeto de Iluminação do Estádio de Dourados, apesar de figurar no Balanço de 1978 a importância de Cr\$ 80.000,00, o mesmo já foi elaborado e, portanto, incorporado ao patrimônio da referida Cidade. VII - Referentemente ao Projeto de Eletrificação do Estádio de Mato Grosso, compreendendo também Mato Grosso do Sul, cujo projeto deixou de ser executado em virtude da não efetivação do financiamento previsto, por ter encontrado óbice na própria Lei Complementar nº 31/77, continua em aberto, sendo que as despesas já efetuadas nos dois Estados serão suportadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso. E por estarem justas e acertadas, as partes antes discriminadas concordam em assinar o presente instrumento, o qual já foi submetido à audiência da Comissão Especial de Divisão, ficando acordado também que quaisquer outros bens móveis ou imóveis, direitos ou encargos porventura ainda existentes e não mencionados neste termo, serão futuramente transferidos ao Estado de Mato Grosso do Sul pelos meios próprios. Campo Grande - Mato Grosso do Sul, em 29 de agosto de 1979.


MARCELO MIRANDA SOARES
Governador do Estado de
Mato Grosso do Sul


FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Governador do Estado de
Mato Grosso


HUGO JOSÉ BOMFIM
Secretário de Planejamento do
Estado de Mato Grosso do Sul


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Secretário de Planejamento do
Estado de Mato Grosso e Pre-
sidente da CODEMAT.


WAGNER BERTOLI
Diretor-Presidente da IDESUL

C O D E M A T
CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 60.727
NO CARTÓRIO P. DE REG. IM. 03.10.9.19
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

218.27-01

ANEXO AO PROCESSO Nº 8.569/84

DE 21 / 12 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria Jurídica // informar

26.12.84

Senhor Presidente:

Tendo em vista a solicitação da d. Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, esta Assessoria manifesta favorável a re-ratificação solicitada, vez que constatou-se erro na Matrícula da escritura dos imóveis transferidos, devendo lavrar-se outra escritura, para tanto é de ser designado por V. Sa, um representante da CODEMAT, com poderes expressos para em nome da Empresa, assinar a escritura pública de re-ratificação necessária a concluir a transferência.

E' o nosso parecer S.M.J.

Pba. 28/12/84

// Chefe da Asses. Jurídica.

Ao DAF.

Designo o Sr. Antonio de Pádua dos Santos Farid para assinar a Escritura solicitada, providencie a procuração da Diretoria.

Em, 15/01/85

Amorim

A' Assessoria Jurídica para preparar procuração p/ Del. Fin. Cem 15/01/85



CODEMAT -

Benedito
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



Nº

076

Neste Atto Representado
TABELIA
Nezill Asvolinsque
SUBSTITUTA
TABELIA DO 7º OFÍCIO
AL NO REGISTRO

República Federativa do Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO

CARTÓRIO DO 7.º OFÍCIO

RUA CÂNDIDO MARIANO, 380

Tabelia de Notas: Nizete Asvolinsque Cavallaro
Tabelia Substituta: Nezill Asvolinsque

Livro N.º 199

Fls 078

1º TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ E ASSINA ABAIXO DECLARADO

SAIBAM quantos este Público Instrumento virem que no ano de mil novecentos e oitenta e cinco (05) aos Dezessete (17) dias do mês de Janeiro (01) nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim comparece como outorgante

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
CGC-034 74530/0001-32, neste ato representado pelo Diretor Presidente Dr: GUSTAVO ARRUDA, brasileiro, casado, Arquiteto, residente á Rua Mario Mota nº351 Varzea Grande-MT, portador da RG-000 047 SSP-MT, e CPF-023 216 457 68, D. Superintendente, MOYSES FELTRIN, brasileiro, casado, Empresário, residente á Rua 1 casa 139 Conjunto Santorini Coxipó, Cuiabá-MT, portador da RG-41.625 SSP-MT, e CPF-023 041 551 20, D. de Operações, MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, brasileira, solteria, advogada, residente á Rua dos Bandeirantes nº89 Cuiabá-MT, portadora da RG-38.127 / SSP-MT, e CPF-001 726 341 72. XX

reconhecido pelo próprio de mim tabelia abaixo assinada, do que dou fé, me foi dito que, por este instrumento nomeava e constituia seu bastante procurador ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS PARRA, brasileiro, casado, Funcionário Público, residente á Av. Ipiranga nº2.957, portador da RG-032 529 exp. em Cuiabá-MT, em 22 12 76 e CPF-046 123 531 53, á quem confere poderes / especiais para assinar todas e qualquer escritura que se fizer necessária junto ao Estado de Mato Grosso do Sul, o contratos, com relação aos lotes e áreas: Um parte de terras na Fazenda / Bandeira, situada no município de Campo Grande-MS, com área de 9.291, m2, tendo a denominação do lotes 1 a 18 da Quadra 21, no local denominado Jardim America, transcrito no RGI- de Campo / Grande-MS, livro 3-S fls 06 em data de 02 08 44; dois lotes de terreno determinados pelas letras "A" e "D", situado nas imedia-

Assim o disse — do que do fé, e me pediu — este instru-
mento que lhe(s) é lido em voz alta e clara que aceita(am) e assina(ã).

E eu _____ que a datilografei.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 1985. Foram pagos os emolumentos no valor de Cr\$ 29.760,00.

Em test.º da verdade. E eu Vilmar Staur
Tabelião do Cartório do Setimo Ofício que a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Nelza Lucr Asdolinsque Garin
ESCREVENTE AUTORIZADA
CARTÓRIO 1.º OFÍCIO

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____


DATA _____ / _____ / _____

INTESSADO _____

JUINA (SERRARIA CODEMAT)

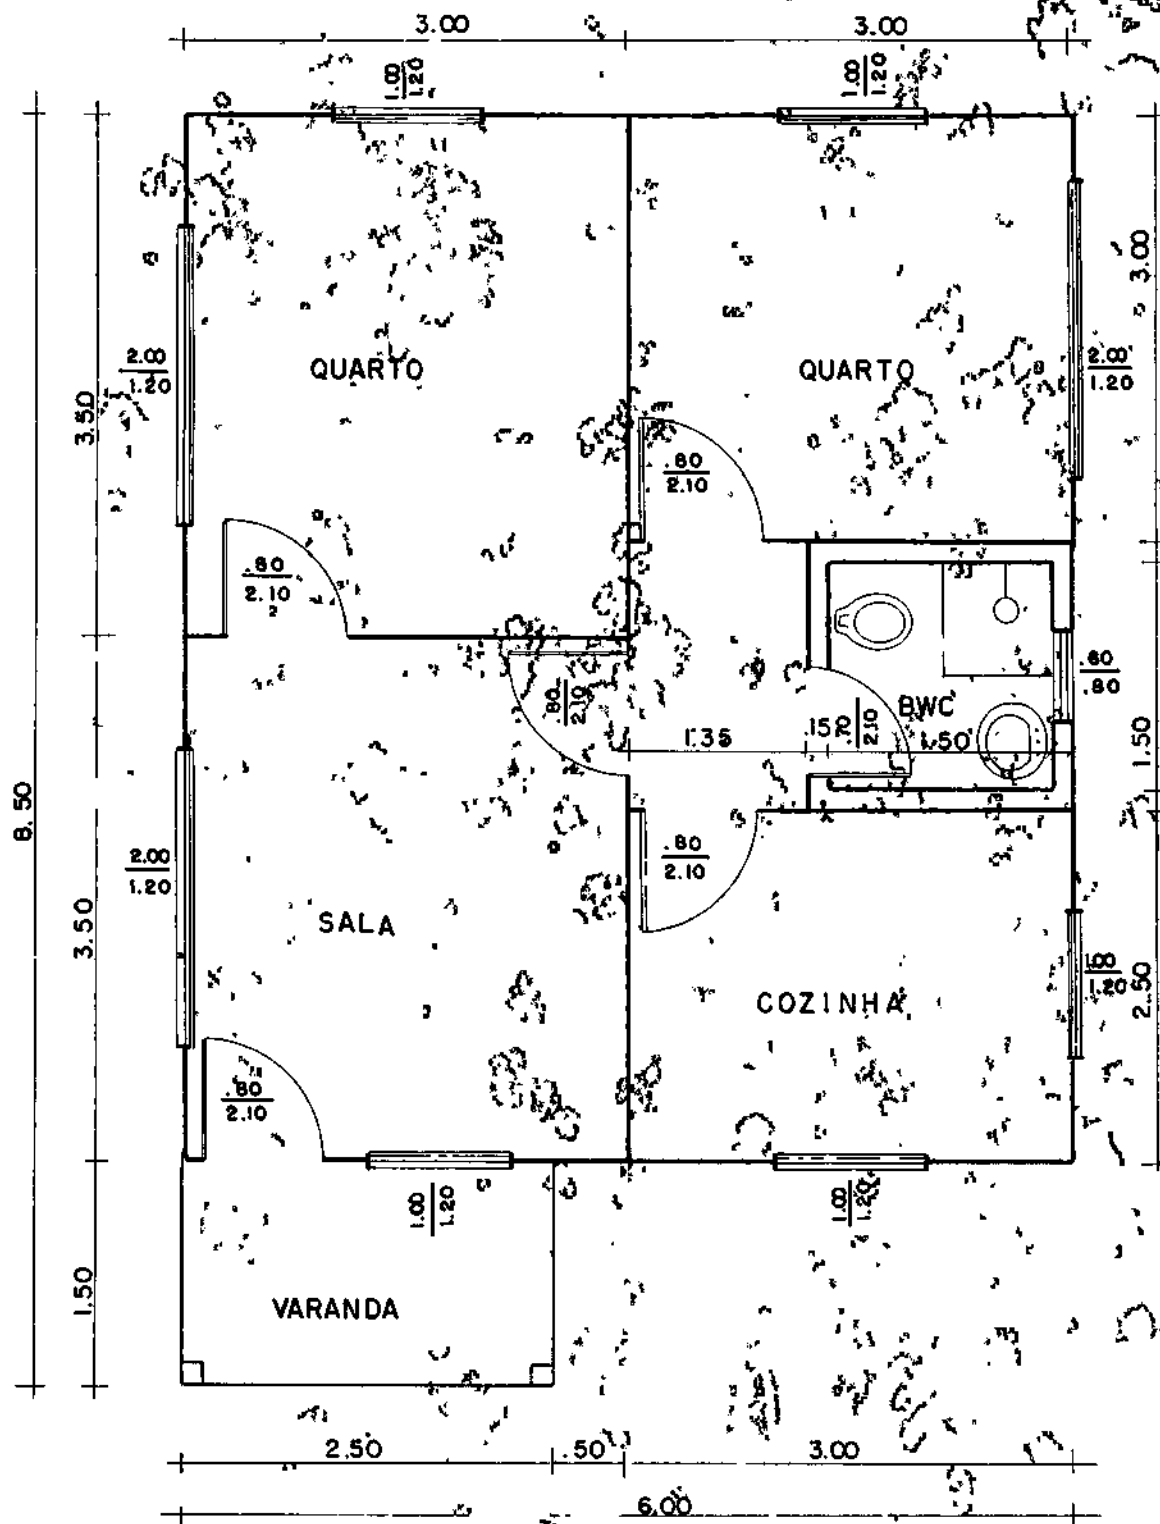
ASSUNTO _____

CASA DE MADEIRA



CODEMAT

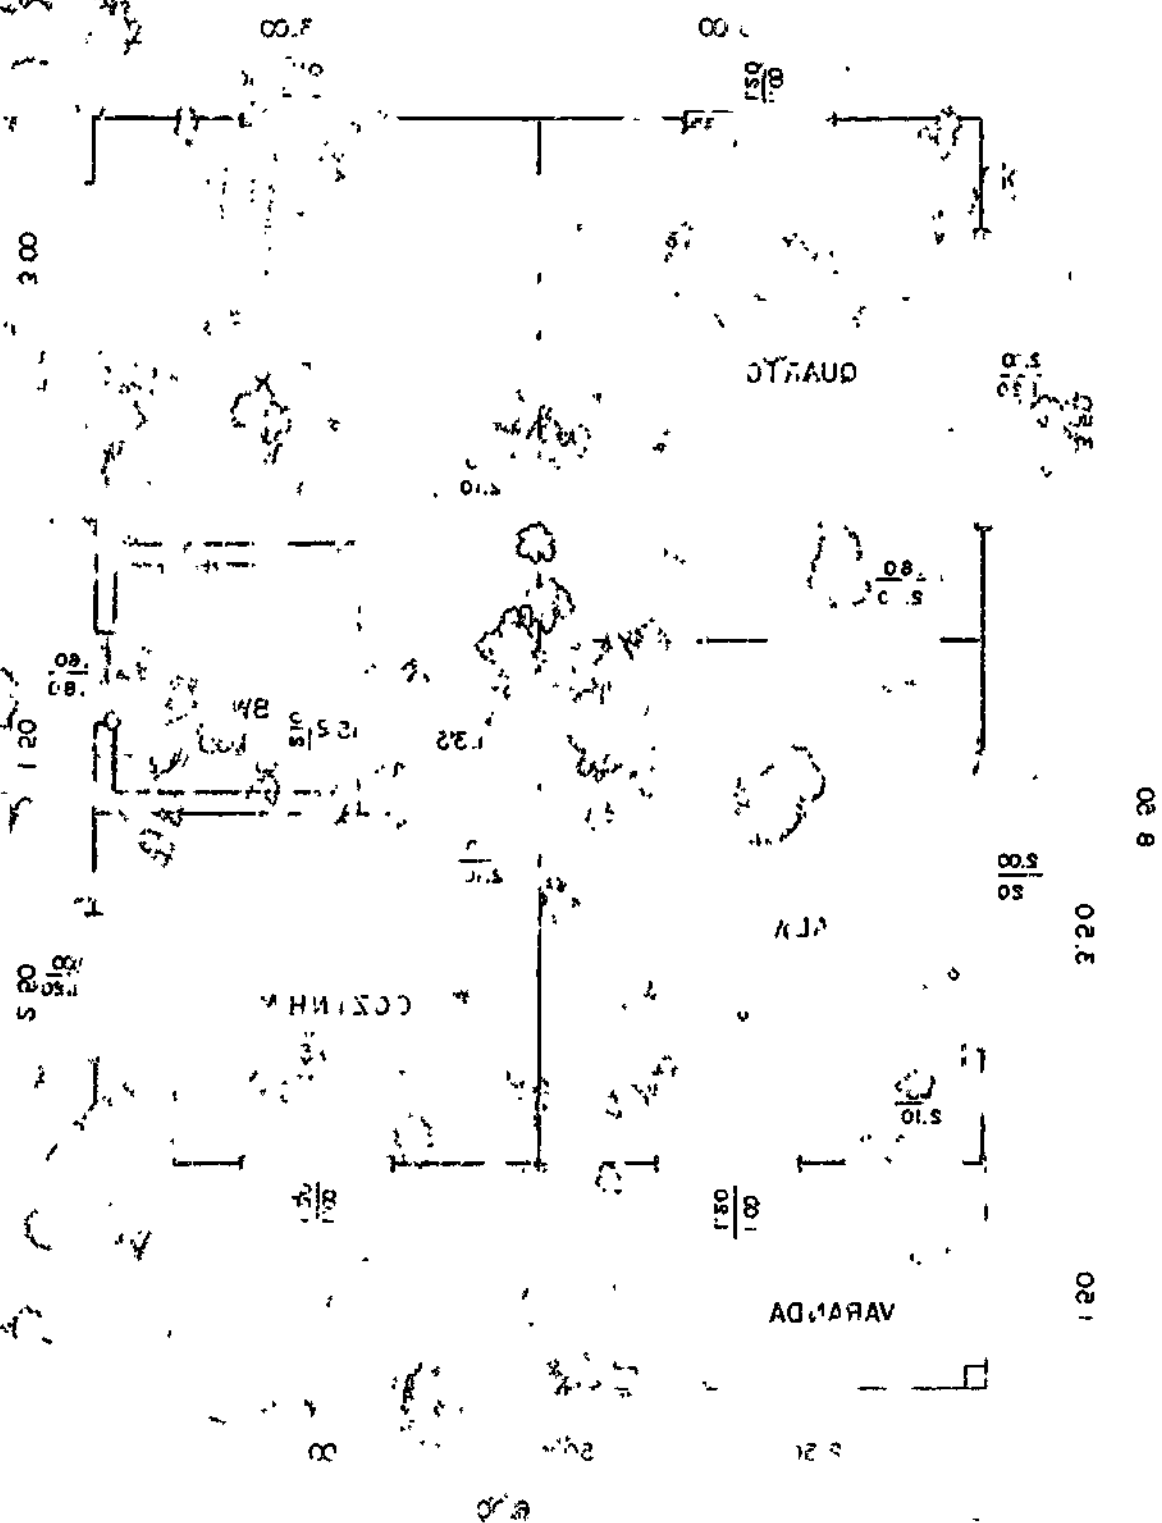
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

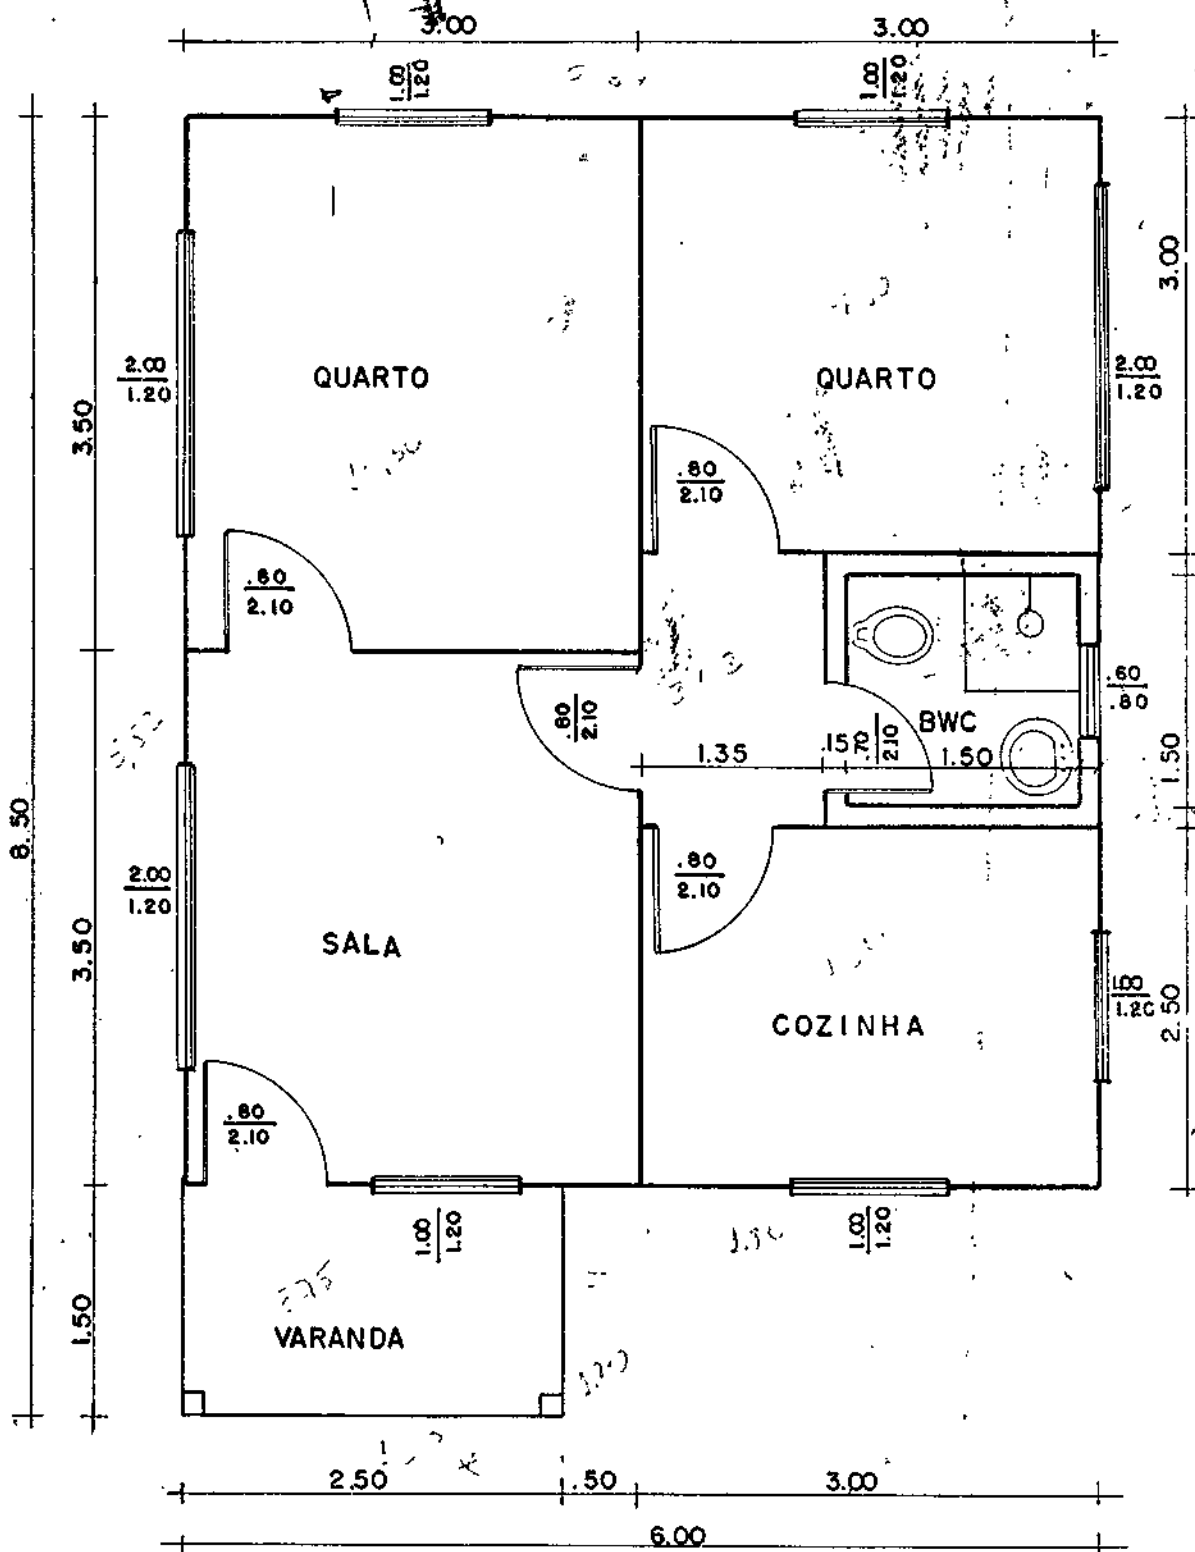


PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

ALICE





PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50



ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

0296

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - EPA

DATA - 24.02.89 HORA 27:15:52 808772

CCV - SISTEMA DE PROTOCOLO

PROTOCOLO NUMERO 0.005.702-9

Nº de Protocolo

INTERESSADO

Prefeitura Municipal de Juina-MT.

ASSUNTO

Solicita abertura de ruas e avenidas e construções de praças, terminal rodoviário e área para expansão para a cidade de Juina.

CODEMAT

Protocolo Nº 112/89

Processo Nº 536/89

Data 27.02.89

R. Durães

Serviço de Protocolo

Paruier

ANEXOS

Processo Nº

Documento Nº



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Ofício nº 55/89.

Juina, 10 de fevereiro de 1.989.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Protocolo Geral da Casa Civil	
Palácio Palaguás - CPA	
DIA 14/02/89	ANO 89
HORA _____ hs.	Proc. nº 5.702-9

Excelentíssimo Senhor Governador:

Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Excelência, objetivando demonstrar a situação sócio-econômica em que encontramos o Município de Juina, ao assumirmos a Prefeitura Municipal a 1º de Janeiro de 1.989.

Procuraremos ser objetivos, relatando somente as necessidades prementes, para não tornarmos o precioso tempo de Vossa Excelência, que sabemos, é escasso para administrar tão imenso Estado.

Número de habitantes do Município: estimado pelo IBGE em 80.000, assim distribuídos: 30.000 na sede municipal, 10.000 em garimpos diversos e 40.000 na zona rural.

NECESSIDADES NA SEDE MUNICIPAL

Água Potável-

- A rede existente está servindo, precariamente, a 1/5 dos habitantes, com racionamento de 4 dias para cada setor da Cidade. A área industrial não possui rede, nem tampouco os módulos mais afastados.

Energia Elétrica

- Gerada por usina termelétrica, é deficitária no que tange à iluminação pública, pois existem algumas luminárias na parte central da Cidade. Na área industrial e bairros, nem rede existe.

Ruas e Avenidas ✓

- Sem nenhuma infra-estrutura. A cada chuva, a - breem-se valetas enormes, causando sérios transtornos ao tráfego e dispêndios vultosos para os Cofres Públicos Municipais.

Praças ✓

- Existem várias áreas destinadas para tal fim,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Of. nº 55/89-GP(Cont.)

Escolas

mas, apenas uma se encontra iniciada, com 50% dos serviços concluídos.

- As existentes são insuficientes para atenderem à demanda de novas matrículas. Para este ano letivo, registra-se um déficit de 800 vagas, aproximadamente. Contamos, também, com uma Escola Agrícola, ~~constituída e equipada, mas sem recursos financeiros~~ para funcionar.

Áreas para Expansão.

- Não possuímos áreas para dar incentivo à instalação de novas indústrias, nem tampouco para a construção de moradias de baixo custo para a população carente.

Setor de Esportes

- A Sede Municipal não possui um estádio para a prática de futebol, ginásio de esportes ou cancha coberta, tampouco quadras polivalentes.

Terminal Rodoviário *

- A Sede Municipal conta com uma rodoviária em estado precário, aquém das necessidades dos usuários, a qual foi construída por uma empresa de transportes coletivos, estando a cargo da mesma sua exploração e manutenção.

Assistência Médica Gratuita-Inexiste, apesar de contarmos com um hospital para tal fim e um Posto de Saúde. Os médicos responsáveis não efetuam tal atendimento, alegando falta de pagamento por parte dos órgãos governamentais.

NECESSIDADES NA ZONA RURAL

Escolas

- Sob responsabilidade do Município, existem 110 escolas rurais, com 150 turmas e 3.560 alunos matriculados. Tais estabelecimentos são todos de madeira, em sua maioria em péssimo estado de conservação. Outras, instaladas, precariamente, em pequenas casas ou barracas cobertas com lona.



Of. nº 55/89-GP- (constin.)

Esportes

- Nenhuma quadra polivalente para a prática das diversas modalidades.

Estradas Municipais

- A malha rodoviária sob responsabilidade do Município é de aproximadamente 1.600,00 Km, implantada na sua totalidade pela CODEMAT, entre 1.977 e 1.980 e, poucas vezes, foram rea-

~~lizados serviços de conservação das mesmas,~~

encontrando-se, atualmente, intransitáveis. É

do conhecimento de Vossa Excelência que nosso Município foi colonizado pela CODEMAT, com assentamento de colonos em pequenas áreas (mini e pequenos produtores), sistema típico da reforma agrária. O povo trabalhou, produziu e Juína cresceu. Mas, hoje, face às precárias condições de escoamento das safras agrícolas, vislumbra-se o risco de tais colonos, desestimulados, virem a vender ou abandonar suas áreas e engrossarem as fileiras dos favelados na Sede Municipal.

Parque Mecanizado da Prefeitura

- 2 Patrôlas Fiat-Allys ano 88 (90% a pagar)
- 2 Patrôlas Caterpillar (sucateadas)
- 1 Trator de esteiras Fiat-A-D7 ano 1.985
- 1 Trator de esteiras FD9-88 (90% a pagar)
- 1 Trator de esteiras D-6 (em reforma)
- 1 Pá carregadeira Fiat-Allys 88-(90% a pagar)
- 1 Pá carregadeira Caterpillar(sem funcionar c/ condições de recuperação)
- 1 Caminhão basculante VW-85 (func. precar.)
- 1 Caminhão Ford 1.980
- 3 Caminhões basc. Mercedes-Benz 1.976



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Of. nº 55/89-GP-(contin.)

Para darmos condições de tráfego às estradas municipais, será necessário triplicarmos tais equipamentos, o que, somente será possível, com a ajuda do Governo do Estado, e só assim abreviaremos este estado de calamidade pública. Portanto, dentre todas as reivindicações, esta deverá receber atenção prioritária por parte de Vossa Excelência.

Senhor Governador, o quadro que se nos apresenta, sem exageros, é dantescó. Estamos perfeitamente conscientes de que não será possível a Vossa Excelência atender a todos os nossos pedidos, prontamente, pela escassez de recursos.

Todavia, o povo juinense e seus representantes políticos confiam plenamente que Vossa Excelência sempre terá os olhos voltados para esta comunidade laboriosa a qual, apesar dos percalços, jamais se deixou desanimar diante das dificuldades e, tampouco, de confiar na capacidade administrativa de Vossa Excelência e no seu alto espírito de compreensão e discernimento.

Ao ensejo, e no aguardo das providências necessárias, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada consideração e apreço.

Cordialmente,

LICEU ALBERTO VERONESE
Prefeito Municipal:

Ao

Exmo, Senhor

CARLOS GOMES BEZERRA

DD. Governador do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ-MT-

Estado de Mato Grosso

FOLHA _____

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo _____

A Apreciação do Sec. - Chefe da Casa Civil

Em 23/02/89

[Assinatura]
José Carlos Rezende
Chefe da Secretaria da
Casa Civil

A CODEMAT para
apreciação
Em 23/02/89

[Assinatura]
Salvador S. Pinto
Assessor Técnico
Casa Civil

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º

536/89

DE 27 / 02 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Diol*
*Para análise**Oba, 27/02/89**[Assinatura]*
Julz Benedetti
Diretor-Presidente
- CODMAT -

A DPR

Para fazer levantamento de custos dos itens:

a) Ruas e avenidas

b) Pmms

c) Terminal Rodoviário

Em 14/03/89.

[Assinatura]
Diretor de Operações.

AO SEEP.

Para as providências, conforme os itens supra mencionados para Diol, verificar junto ao SEEP, SEZOR e a DDR, se existe planta urbana da cidade de Juína, caso positivo, solicitar à Prefeitura Local, para que indique na planta as ruas e bairros existentes, bem como, localizar na mesma as áreas destinadas às praças e ao terminal rodoviário. Com relação ao terminal rodoviário, essa Cia tem projetos de terminais rodoviários padrão. Ver com a Prefeitura quais dos projetos ela considera satisfatório. Para atender estas solicitações, designar um técnico do SEZOR para ir até Juína e fazer esses levantamentos.

Em 15/03/89

[Assinatura]
Waltair Augusto Borralho Dias
Chefe de Divisão de Projetos
- CODMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO DE COLONIZAÇÃO

JUINA

ARIPUANÃ - MT

SUB PROJETO Nº 02/81

**CONSTRUÇÃO DE HORTA
COMUNITÁRIA**

JULHO/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO Nº 02/81
=====

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA
PARÁ: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO
DE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
CIDADE: DISTRITO DE JUÍNA - ARIPUANÃ-MT
DATA: 11/07/81
SOLICITANTE: IRAÍDES MARIA DE JESUS GRESPAN
ASSISTENTE SOCIAL - CRAS: 781

CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

JUÍNA - ARIPUANÃ-MT

1. INTRODUÇÃO
2. JUSTIFICATIVA
3. DIMENSIONAMENTO
4. MEIOS
 - 4.1. Técnicos
 - 4.2. Instrutores
5. RECURSOS
 - 5.1. Recursos Materiais existentes
 - 5.2. Recursos Humanos existentes
 - 5.3. Recursos Materiais em falta
 - 5.4. Recursos Financeiros
6. ANEXOS
 - 6.1. Cronograma das Culturas a serem cultivadas
 - 6.2. Planta de Localização.

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS

- . IRAÍDES MARIA DE JESUS GRESPAN
Ass. Social - CRAS 781
- . JOSÉ CLAUDEMIR FABRI
Téc. Agrícola - CREA 1.680

JUÍNA - Julho de 1981

1. INTRODUÇÃO

O DISTRITO DE JUÍNA, é consequência de um projeto de colnização executado pela CODEMAT, tendo seu início de ocupação em maio de 1978, cujo objetivo sócio-político, foi minimizar um clima de tensão social, surgido com o fluxo migratório espontâneo e desordenado, causado pela saturação de certas comunidades rurais do sul e leste do País. Portanto, a implantação do Projeto Juína, veio minimizar este problema, criando e desenvolvendo comunidade rural e urbana com toda infraestrutura econômica e social que assegura à população, condições dignas de vida; fixando as famílias dos trabalhadores rurais em chácaras e lotes agrícolas, assegurando-lhes situação econômica definida; instalando empresas agro-pecuárias, agro-pecuárias, agro-florestais e agro-industriais, no sentido de garantir e consolidar a economia nacional e, manter ofertas de empregos diretos, seja pela utilização da mão de obra assalariada; promover o homem rural, proporcionando-lhe reais oportunidades de trabalho; organização de comunidade; assistências sociais e economicas.

2. JUSTIFICATIVA

Em consequência do desenvolvimento progressivo do Projeto Juína, Distrito do Município de Aripuanã, hoje, contamos com aproximadamente 10.000 (dez mil) habitantes; sendo 6.182, na área rural, 3.818 na área urbana. Nesta última, contamos com 15,25% de famílias carentes; são os residentes na chamada "VILA S. JOSÉ

OPERÁRIO", que influenciados pela propaganda de que as terras de Juína - Aripuanã, são prósperas e produtivas, para cá vieram, em busca de melhores condições de vida; mas em virtude do baixo nível educacional e financeiro de cada um e, o alto preço dos produtos de primeira necessidade, torna-se impossível para aqueles chefes de famílias, encontrarem estabilidade emocional, social e financeira. Outrossim, 90% dos chefes de família ali residentes, trabalham como diaristas, oferecendo somente mão de obra primária; tais como: derrubada, roçada, abertura de picadas e outros.

Portanto, a implantação deste projeto, prende-se à necessidade de promover aqueles indivíduos, no sentido de aumentar o seu potencial de saúde e econômico; assim como promovê-los para o trabalho em conjunto, buscando assim a minimização de doenças constantes na classe infantil daquela comunidade em virtude da carente alimentação.

Cabe lembrar que, através deste projeto, pretendemos levar a comunidade a um trabalho benéfico, visando seu bem estar sanitário e também fazer com que adquiram experiências e interesse quanto ao plantio da olericultura, o que posteriormente, além de consumirem o produto, poderão vendê-lo e comprar alimentos de 1ª necessidade, assim como: vestes e remédios. Queremos ressaltar que estamos planejando montar uma mini-cooperativa, com o lucro da produção.

3. DIMENSIONAMENTO

. Nº de alunos a serem atingidos

diretamente:	- 57 (cinquenta e sete aproximadamente)
. Nº de pessoas atingidas indiretamente:	- 83 (oitenta e três aproximadamente)
. Nível econômico:	- baixa renda
. Faixa de idade na qual se situam:	- 08 a 53 anos
. Nível de escolaridade:	- 20% alfabetizados - 40% analfabetos - 13% 1º grau incompleto - 27% em escolarização
TOTAL:	100%

4. MEIOS

4.1. Técnicos

Para execução deste projeto, serão utilizados as seguintes técnicas: trabalho de conscientização de base, através de palestras; reuniões semanais no sentido de orientação, quanto à horticultura; cartazes expositivos, referentes as motivações para o plantio da horta.

4.2. Instrutores

Estão envolvidos no desenvolvimento deste projeto: Técnicos Agrícolas, Engenheiros Agrônomos, todos com experiências no ramo, portadores dos diplomas e certificados.

5. RECURSOS

5.1. Recursos Materiais Existentes

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, se dispõe do seguinte material:

- . cedendo por empréstimo, 1 (uma) moto serra - 03 (três) foices - óleo lubrificante
- . 150 x 80m de área de terra
- . 3.680m de arame farpado

A comunidade se dispõe na complementação do material solicitado pela LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA), assim como, na aplicação de mão de obra, para o plantio da horta;

- . fornecimento de panfletos, assistência técnica, através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER).

5.2. Recursos Humanos Existentes

A equipe executora deste projeto, compõe-se de:

- . 2 médicos - 01 assistente social - 01 técnico agrícola - 01 engenheiro agrônomo - 01 topógrafo - 01 líder da comunidade em referência
- . alunos voluntários da Escola Dr. Guilherme F. de Abreu Lima

5.3. Recursos Materiais em Falta

- . 500m de mangueira - para regar o plantio
- . sementes, inseticidas - adubos - 05 regadores
- . ferramentas; tais como: 08 enxadões - 08 machados - 08 enxadas - 08 foices - 08 facões - 08 rastelos - 08 mar


telos - 08 limas de amolar ferramentas.

5.4. Recursos Financeiros

Contribuição da CODEMAT	R\$ 100.000,00
Contribuição de outras entidades: Sub-prefeitura, banco Financeiro, Escritório Contábil	R\$ 20.000,00
Contribuição da comunidade	R\$ 8.000,00
Importância solicitada da LBA:	<u>R\$ 100.000,00</u>
TOTAL DO CUSTO DO PROJETO	R\$ 228.000,00

Juína - ARIPUANÁ-MT, 11 de Julho de 1981


IRAÍDES MARIA DE JESUS GRESPAN
As. Social - resp. pela exe-
cução do Projeto

Visto: 

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente

6. ANEXOS

6.1. CRONOGRAMA DAS CULTURAS A SEREM CULTIVADAS

1. OLERÍCOLAS TRANSPLANTADAS

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	ESPAÇAMENTO DOS SULCOS NO CANTEIRO	QTIDADE DE SEMENTES POR m ²	ÉPOCA DO TRANSPLANTE	ESPAÇAMENTO DEFINITIVO EM m	INÍCIO DA COLHEITA EM DIAS DA SEMEADURA	QUANTIDADE EM GRAMAS	PRODUÇÃO ESTIMADA
01	ALFACE	10 cm	03 grs	4 - 5 Fls	0,3 x 0,3	90	750	405.000 pés
02	BERINGELA	15 cm	06 grs	4 - 5 Fls	1,0 a 1,5 x 1,0	100	500	78.000 kg
03	BROCOLO	15 cm	03 grs	5 - 6 Fls	0,8 x 0,4	80	500	60.000 kg
04	CEBOLA	10 cm	05 grs	40 dias	0,4 x 0,10	120	250	45.000 cab.
05	CEBOLINHA	10 cm	02 grs	40 dias	0,25 x 0,25	60	250	60.000 pés
06	CHICÓRIA	10 cm	03 grs	4 - 5 Fls	0,3 x 0,3	90	250	1.200 pés
07	COUVE-FLOR	15 cm	03 grs	5 - 6 Fls	0,5 x 0,4	70 - 100	250	33.000 pés
08	ESPINAFRE	10 cm	03 grs	4 - 5 Fls	0,3 x 0,3	60	500	6.000 pés
09	PIMENTA	10 cm	06 grs	4 - 5 Fls	0,3 x 0,3	100	250	14.250 kg
10	REPÔLHO	15 cm	03 grs	5 - 6 Fls	0,8 x 0,2	80 - 120	250	33.000 kg/cab.
11	PIMENTÃO	10 cm	03 grs	5 - 6 Fls	1,0 x 0,5	100	250	18.000 kg
12	TOMATE	10 cm	04 grs	6 - 8 Fls	1,0 x 0,5	100 - 120	500	72.000 kg
13	ACELGA	10 cm	03 grs	4 - 5 Fls	0,3 x 0,5	100 - 120	200	108.000

2. OLERÍCOLAS DE SEMEADURA DIRETA

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	ESPAÇAMENTO POR (METROS)	Nº EM COVA OU m LINEAR	DESBASTE DEIXANDO:	ÉPOCA DO DESBASTE	INÍCIO DA COLHEITA	QUANTIDADE	PRODUÇÃO
01	ABÓBORA	3,0 x 3,0	5/c	2 Pl/cova	5 - 6 Fls	120 dias	400 grs	6.400 Kg
02	ABOBRINHA	1,5 x 1,0	5/c	2 Pl/cova	5 - 6 Fls	70 dias	400 grs	5.120 Kg
03	ALHO	0,3 x 0,1	10/m	-	-	120 dias	350 grs	112 Kg
04	ALMEIRÃO	0,25 x 0,05	19/m	20 Pl/m	10 cm	40 - 50	250 grs	1.300 molho
05	BETERRABA	0,30 x 0,15	20/m	7 Pl/m	5 cm	70	250 grs	5.600 Kg
06	CENDURA	0,30 x 0,05	01/m	20 Pl/m	04 cm	90	250 grs	6.000 Kg
07	ERVILHA	0,5 x 0,1 x 0,1	15 a 20/m	10 Pl/m	10 cm	70	200 grs	400 Kg
08	FEIJÃO DE VAGEM	1,0 x 0,3 x 0,5	3/c	2 Pl/cova	3 - 4 Fls	70	250 grs	420 Kg
09	PEPINO	1,0 x 0,5	4/c	1 Pl/c	3 - 4 Fls	70	250 grs	2.400 Kg
10	QUIABO	1,0 x 0,2 x 0,4	4/cov. 25/m	10 Pl/m	-	-	250 grs	1.400 Kg
11	RABANETE	0,2 x 0,3	1 g/m	30 Pl/m	5 cm	25 dias	250 grs	9.000 Kg
12	SALSA	0,3 x 0,3	1 g/m	30 Pl/m	5 cm	40 - 50	250 grs	333.000 molho

3. OLERÍCOLAS QUE SÃO TRANSPLANTADAS

Nº APROXIMADO DE SEMENTES POR GRAMA		ADUBAÇÃO PARA AS 25 ESPÉCIES	INSETICIDAS PARA AS 25 ESPÉCIES
01- ALFACE	900	(Fósforo)	
02- BERINGELA	260	Super Fosfato Simples	12 litros de Dimetoato
03- BROCOLO	200	220 kg	Aplicar durante todo o ciclo
04- CEBOLA	300	(Potássio)	
05- CEBOLINHA	400	Cloreto de Potássio	06 litros de Trichlorphon
06- CHICÓRIA	1.200	180 kg	Usar durante todo o ciclo
07- COUVE-FLOR	220		05 litros de Carbaryl
08- ESPINAFRE	20		
09- PIMENTA	190		
10- PIMENTÃO	240		No início do desenvolvimento
11- REPOLHO	220		
12- TOMATE	300		05 litros de Malathion - no ar
13- ACELGA	900		mazenamento como prevenção

4. OLERÍCOLAS DE SEMEADURA DIRETA

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	Nº APROXIMADO DE SE- MENTES POR GRAMA	INSETICIDAS PARA AS 25 ESPÉCIES
01	ABÓBORA	08	04 litros de Binapacril; durante todo o ciclo e no armazenamento
02	ABOBRINHA	08	
03	ALHO	01	
04	ALMEIRÃO	1.300	
05	BETERRABA	70	
06	CENOURA	600	
07	ERVILHA	08	
08	FEIJÃO DE VAGEM	03	
09	PEPINO	30	
10	QUIABO	10	
11	RABANETE	150	
12	SALSA	500	

6.2. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



CODEMAT

COMPANHIA
DO ESTADO

DE
DE

DESENVOLVIMENTO
MATO GROSSO

PROJETO JUINA - 1ª FASE

MUNICIPIO DE ARIPUANÁ - MT.

PROJETO: HORTA COMUNITÁRIA.

LOCAL: QUADRA nº 07 VILA OPERÁRIA (Provisória)

ÁREA: 6.035,00 m²

DATA: 20 / 06 / 1.981

ESCALA: 1:1.500

